

MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS  
SERVICIO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
USAID/BOLIVIA - 511 - T - 062

PRESTAMO AID-N°511-T-062  
DONACION AID-N°511- 0499  
DESARROLLO COMUNAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Y LOGROS

TRIMESTRES : DICIEMBRE DE 1984 A FEBRERO DE 1985  
MARZO A MAYO DE 1985

PROYECTO SNDC / USAID / B. 511 - T - 062

ARQ. GONZALO GARCIA V.  
CONTRATO USAID/B.  
N°511-062-5-00-4002

LIC. JAIME CUSICANQUI V.  
CONTRATO USAID/B.  
N°511-062-5-00-4053


La Paz, Mayo de 1985

*BEST AVAILABLE COPY*

# BOLIVIA

PRESTAMO AID-N°511-T-062  
DONACION AID-N°511- 0499  
DESARROLLO COMUNAL

## LOCALIZACION DE LOS 37 SUB-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

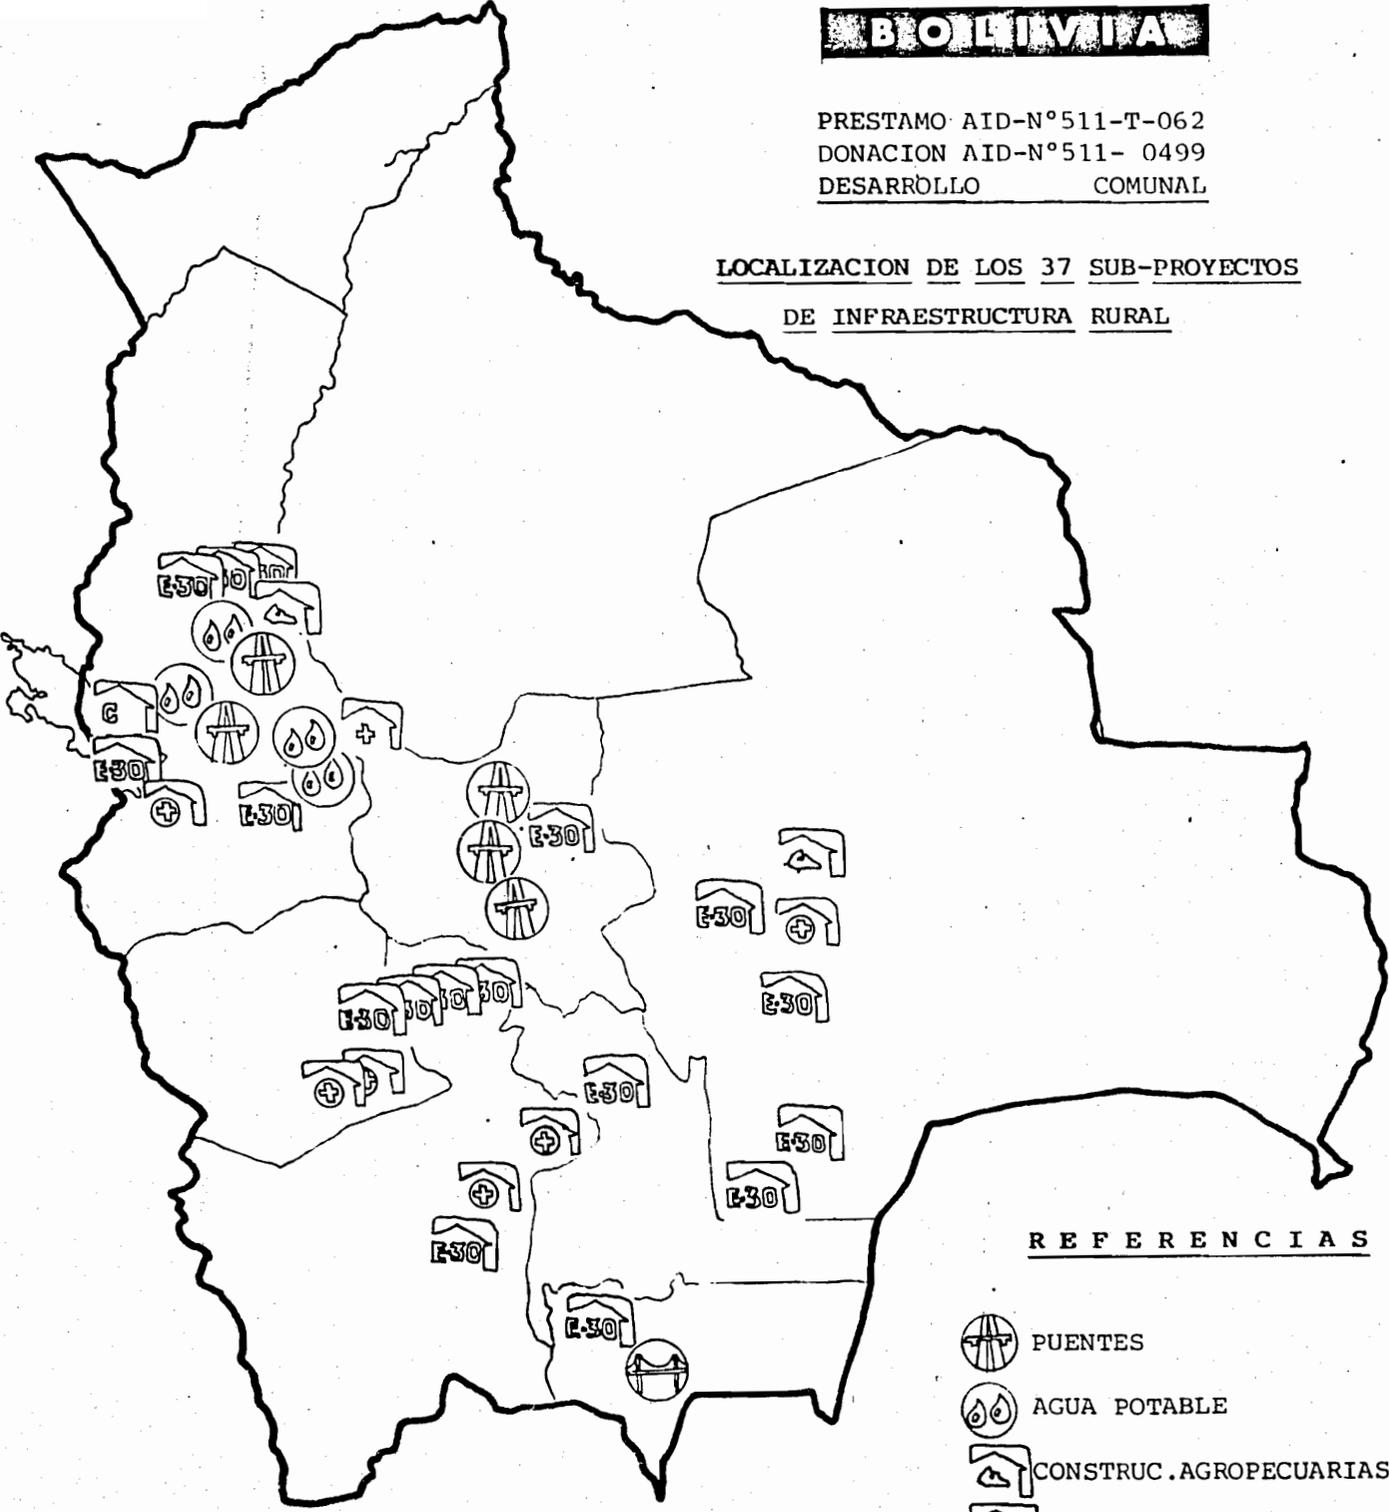

### REFERENCIAS

-  PUENTES
-  AGUA POTABLE
-  CONSTRUC. AGROPECUARIAS
-  COLEGIOS Y ESCUELAS
-  PUENTE COLGANTE
-  MICRO HOSPITALES Y PUESTOS MEDICOS

Ing. Gonzalo Escóbar M.  
DIRECTOR NACIONAL DEL S.N.D.C.

TECNICOS

1. Ing. Freddy Moscoso  
SUPERVISOR PROYECTOS
2. Ing. Frady Torrico  
ENCARGADO PROYECTOS CARANAVI
3. C.C. Rolando Calvimonte  
ENCARGADO PROYECTOS COROICO
4. C.C. Alfredo López  
ENCARGADO PROYECTOS CHULUMANI
5. Arq. Julio Carrasco B.  
ENCARGADO PROYECTOS ALTIPLANO
6. Ing. José Soto  
ADM.DEPTAL.PROYECTOS ORURO
7. Arq. Fernando Salazar  
ENCARGADO PROYECTOS UNCIA
8. C.C. Gabino Silvestre  
ENCARGADO PROYECTOS CHALLAPATA
9. C.C. Freddy Flores  
ENCARGADO PROYECTOS CHALLAPATA
10. Arq. Juan Rojas  
ENCARGADO PROYECTOS CHAPARE
11. Ing. Jorge Jordán  
ENCARGADO PROYECTOS CHAPARE
12. Lic. Fernando Soria Galvarro  
ADM.DEPTAL. PROYECTOS SANTA CRUZ
13. Arq. Rosario Schurpp  
ENCARGADO PROYECTOS SANTA CRUZ
14. Arq. Wilmar Ardaya  
ENCARGADO PROYECTOS SANTA CRUZ
15. C.C. Fermín Molle  
ENCARGADO PROYECTOS CAMIRI
16. C.C. Waldo Wayar  
ENCARGADO PROYECTOS POTOSI
17. C.C. Gilberto Vera  
ENCARGADO PROYECTOS SUCRE
18. C.C. Cecilio Poma  
ENCARGADO PROYECTOS TARIJA

19. C.C. Delfor Perales  
ENCARGADO PROYECTOS TARIJA

ADMINISTRATIVOS

1. Roberto Chuquimia M.  
ADMINISTRADOR
2. Mario Delgado D.  
CONTADOR
3. José Luis Navia S.  
CONTROL PROYECTOS
4. Ryder Pérez  
AUXILIAR CONTADOR (6 meses)  
Gonzalo Pacello Ch.  
AUXILIAR CONTADOR (2 meses)
5. Edwin Vega F.  
COTIZADOR
6. Susana Carranza S.  
SECRETARIA EJECUTIVA
7. Elsa Eyzaguirre  
SECRETARIA EJECUTIVA
8. Juan Flores G.  
MENSAJERO
9. Jaime Alarcón  
CHOFER
10. Andrés Escalier C.  
CHOFER
11. Luis Rojas  
CHOFER
12. Daniel Flores  
CHOFER
13. Luis Ledo  
MECANICO
14. Mario Maceda  
MECANICO Y COTIZADOR



PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA  
DE COORDINACION DEL PROYECTO 062

*BEST AVAILABLE COPY*

## C O N T E N I D O

	Página
I. INTRODUCCION	1
II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5
III. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	41

### ANEXOS :

N° 1	PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 1984-1985	47
N° 2	INFORMACION GRAFICA Y COMENTARIOS DE PRENSA	49

PRESTAMO AID N°511-T-062  
DONACION AID N°511- 0499  
DESARROLLO COMUNAL

I. INTRODUCCION.

En cumplimiento con los Contratos USAID/Bolivia números 511-062-5-00-4053 y 511-062-5-00-4002, del Asesor en Administración y Capacitación y del Coordinador del Proyecto "Desarrollo Comunal", Préstamo AID N°511-T-062 Donación AID N°511-0499, se presenta a consideración de las autoridades de la Misión USAID/Bolivia y del S.N.D.C., el Informe Final de Actividades y Logros correspondiente a los Trimestres : Diciembre de 1984 a Febrero de 1985 y de Marzo a Mayo de 1985.

El presente Informe resume las actividades cumplidas en la fase de conclusión del Proyecto "Desarrollo Comunal" y destaca los logros alcanzados en beneficio de la familia rural. No obstante los reiterados paros y huelgas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, así como la constante variación de precios en los materiales de construcción que fueron requeridos para los Sub-Proyectos y, nuevamente, las medidas económicas dictadas por nuestro Gobierno. Esta situación, sin duda, afectó a la programación de actividades a cumplir por la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, hecho que originó una ampliación de 60 días más para poder alcanzar la total conclusión de obras comprometidas en la Carta de Implementación N°32 de fecha 18 de Septiembre de 1984.

Destaca información sobre el desarrollo de los Sub-Proyectos, transferencias, ampliación, supervisión técnica de obras y fechas de conclusión de las mismas.

En la parte Administrativa, se informa sobre los Fondos de Operación, desembolsos de fondos del T.G.N. y de USAID/Bolivia, así como de gestiones cumplidas ante autoridades del T.G.N. para el pago del saldo del monto total comprometido por el Gobierno; solicitud que se hizo efectiva en fecha 13 de Mayo del año en curso. El cumplimiento del aporte por parte de nuestro Gobierno, podemos señalarlo como un hecho excepcional, si consideramos la difícil situación política y económica que vive el país.

Incluye también, una sección Gráfica y Comentarios de Prensa, referidos a las entregas de las obras. Sobre este particular, es importante destacar que ésta actividad, gracias al decidido apoyo de la Oficina de Relaciones Públicas del S.N.D.C., ha cubierto por medio de sus boletines, importante información sobre los Sub-Proyectos en radio, prensa y televisión, destacando los logros alcanzados y estimulando la ejemplar participación de las organizaciones campesinas en la realización de las obras.

En la parte, de Conclusiones y Recomendaciones, destaca la metodología de trabajo aplicada durante el desarrollo del Proyecto 062, cuyo personal técnico y administrativo, trabajó tiempo completo en las obras y demostró

mística y compromiso con la misión asignada, sin acatar paros ni huelgas. Esta modalidad de trabajo también permitió el fortalecimiento de las propias organizaciones campesinas que de manera ejemplar, cumplierón con sus aportes de materiales y mano de obra, así como de recursos económicos, demostrando la decisión de concretar sus obras con verdadero calor humano y sentido social y económico de las mismas, como una expresión de que cuando las organizaciones campesinas reciben el apoyo oportuno de las Instituciones del Gobierno, éstas pueden hacer frente a sus propios problemas.

Finalmente, considerando de que el presente Informe Final de Actividades y Lógrros del Proyecto 062, ha cumplido con el 100% de las actividades programadas y entrega de 34 obras concluídas, 3 en ejecución y 1 cancelada, corresponde señalar con especial satisfacción que el equipo técnico y administrativo asignado al Proyecto 062 ha cumplido con los objetivos propuestos, hecho que a merecido el reconocimiento público de autoridades de Gobierno, expresados en la persona del Director General del S.N.D.C. y del propio organismo de financiamiento.

Al reiterar nuestro profundo reconocimiento a los Directivos del S.N.D.C., especialmente de su Director por el decidido apoyo que nos brindarán en ésta fase del trabajo, que ha permitido cumplir con las actividades programadas.

Nuestro reconocimiento al personal técnico y administrativo de la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, que han cumplido a cabalidad con la mi--

sión encomendada por sus superiores y cuya decidida participación, ha hecho posible cumplir con la conclusión de las obras.

En forma muy especial, queremos expresar nuestro reconocimiento a los Directivos de USAID/Bolivia, y su idóneo personal de apoyo, por habernos brindado la oportunidad de servir a nuestro país, al confiarnos las responsabilidades de éste importante Proyecto de Desarrollo Comunal en beneficio de la familia rural de nuestro país.

II. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO.

A. SOLICITUD DEL DESEMBOLSO.

A.1. Detalle de Sub-Proyectos y Presupuestos.

Del listado de 38 Sub-Proyectos propuestos en fecha 17 de Agosto de 1984 y aprobados en Carta de Implementación N°32 de 18 de Septiembre de 1984, ha sido cancelado el Sub-Proyecto CHU-104, Arce Banzer (Puente Colgante de 52 mts.), y transferido el Sub-Proyecto COR-618, Moro (Puente Fijo de 6.00 mts.) a la Comunidad de Trinidad Pampa con participación de tres comunidades.

La cancelación del Sub-Proyecto "Arce Banzer", es ocasionada por las propias comunidades participantes, al presentar una desorganización total, falta de interés en la obra, e incumplimiento de sus aportaciones.

El S.N.D.C., mediante la Oficina de Coordinación 062, realizó los máximos esfuerzos para organizar las comunidades participantes en el Puente Colgante de Arce Banzer, sin resultados positivos en vista de las fuertes disputas internas existentes en la sub-zona.

La determinación de transferir los materiales adquiridos para la ejecución del Puente "El Moro" a Trinidad Pampa, se originó porque de las seis comunidades participantes en la obra, ninguna aportó con la mano de obra comprometida, con los materiales del lugar, ni dieron respuestas a las comunicaciones por escrito que se hicieron llegar a los beneficiarios, por parte de los Directivos del S.N.D.C., cumpliendo normas técnico-administrativas vigentes en la Institución.

Los 38 Sub-Proyectos quedarón así reducidos a 37, tomándose determinaciones complementarias referentes a que el S.N.D.C. presente a USAID/Bolivia las alternativas más convenientes para el uso de los materiales comprados para el Puente Arce Banzer y otros adquiridos anteriormente al último acuerdo 062, bajo responsabilidad de ejecución y financiamiento de la propia Institución en todos los aspectos que demande su total conclusión.

Sobre los presupuestos de obra aprobados para la conclusión de los 37 Sub-Proyectos, estos en su mayoría requirieron ampliaciones de cuenta, a medida que fueron ejecutados en vista que los profesionales responsables detectaban omisiones en ítems de sus presupuestos inicialmente presentados y que eran necesarios para la adecuada conclusión de lo proyectado. Así mismo las comunidades beneficiadas, cumplierón con los requerimientos de es -

tas ampliaciones con aportes en la proporción establecida para atender estas solicitudes.

Las previsiones tomadas en la compra de materiales en su debida oportunidad, permitieron economizar saldos que posibilitaron la compra de otros materiales adicionales solicitados en estas ampliaciones de cuenta.

En las ampliaciones de los Sub-Proyectos que se ejecutan en Potosí y particularmente los de Tarija, estas solicitudes fueron presentadas con mucho retraso y con presupuestos muy elevados en mano de obra calificada, que será imposible atender por la Oficina de Coordinación 062, hasta el 31 de Mayo (fecha de conclusión del Proyecto), por cuanto requieren de un análisis de precios con los propios solicitantes y las correspondientes verificaciones en obra, para determinar el monto real a cancelarse por objeto de mano de obra calificada.

De acuerdo a lo estipulado para estos casos corresponde referirnos a la Carta de Implementación N°32, donde el S.N.D.C., compromete concluir las obras que no fuerán terminadas por la Oficina del Proyecto hasta el 31 de Mayo de 1985, con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación.

Con las excepciones mencionadas, en el total de las obras programadas se adquirieron los materiales requeridos y se cancelaron ítems de mano de obra presupuestados en cada Sub-Proyecto.

A.2. Fondos de Operación.

En los meses de Diciembre y Enero del presente año, se efectivizaron la totalidad de los fondos desembolsados por el Tesoro General de la Nación, pero los montos presupuestados resultaban insuficientes para nuestros requerimientos. Por esta razón, la Unidad Administrativa de la Oficina de Coordinación 062, elevó un informe detallado a la Dirección Ejecutiva del S.N.D.C., para que gestione nuevos fondos ante el T.G.N., efectuando un análisis en función al tipo de cambio y al compromiso contraído en Carta de Implementación N°32.

Estas gestiones culminaron con el desembolso por parte del T.G.N. de \$b. 944.200.000.- equivalente a \$us. 18.884.-, que representa el saldo del monto total comprometido por el Gobierno al Crédito 062, para gastos de operación, cuyo desembolso se efectuó en fecha 13 de Mayo de 1985.

A.3.

A.4. y

A.5. Cuadros de Requerimientos de Sub-Proyectos, Preparación Voucher, Presentación, Aprobación y Desembolso.

Del requerimiento presentado a USAID/Bolivia por \$us. 459.078, - para la conclusión de 38 Sub-Proyectos de infraestructura, en fecha 22 de Octubre de 1984, se acordó hacer efectivo solamente un anticipo de \$us. 260.000.-, para la compra de materiales de construcción y gastos de apoyo a Sub-Proyectos de Puentes Fijos, - Puentes Colgantes y para aquellas obras que demandarían en su ejecución un tiempo de 4 meses para su conclusión, precautelando así el poder adquisitivo del saldo restante, ó sea de \$us. ----- 230.726.- en vista de posibles medidas económicas a ser dictadas por el Gobierno.

Esta previsión tomada permitió, una vez dictadas las medidas económicas del 22 de Noviembre de 1984, solicitar nuevamente un desembolso por \$us. 230.726.-, en fecha 17 de Diciembre de 1984, - con el nuevo cambio de 8.995.- pesos bolivianos por dólar americano, transacción que posibilitó la adquisición de materiales de construcción y ejecutar otros gastos en condiciones favorables - para gran parte de las obras programadas y no incluidas en el primer desembolso.

El detalle del desembolso hecho efectivo por USAID/Bolivia en -  
fecha 26 de Diciembre de 1984 es el siguiente :

SEGUNDO DESEMBOLSO USAID/BOLIVIA PRESTAMO

AID-511-T-062

ELE- MENTO	ACTIVIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	
		EN \$us.	EN \$b.
C.	INFRAESTRUCTURA	209.078.-	
E.	EQUIPO	5.311.-	
G.	GASTOS DE APOYO, OTROS Y CONTINGENCIAS	16.337.-	
TOTAL :		230.726.-	

En fecha 24 de Enero de 1985, se efectuó la devolución de \$b.---  
600.000.000.- equivalente a \$us. 66.703.72 de acuerdo al siguien  
te detalle :

ELE- MENTO	ACTIVIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	
		EN \$us.	EN \$b.
C.	INFRAESTRUCTURA	51.392.72	
G.	GASTOS DE APOYO, OTROS Y CONTINGENCIAS	15.311.-	
TOTAL :		66.703.72	

La determinación de efectuar la devolución de fondos a USAID/Bolivia, se decidió en vista de la dictación de nuevas medidas económicas y en procura de precautelar el poder adquisitivo de los fondos desembolsados.

Posteriormente, a la firma de la Carta de Implementación N°36, - donde se amplia el Proyecto hasta el 31 de Mayo de 1985 y se aprueba una reprogramación del saldo existente en USAID/Bolivia, se recibieron dos desembolsos que se resumen en el siguiente Cuadro :

ELEM- ENTO	ACTIVIDAD	MONTO DESEMBOLSADO	
		EN \$us.	EN \$b.
C.	INFRAESTRUCTURA	5.000.-	
G.	GASTOS DE APOYO, OTROS Y CONTINGENCIAS	2.000.-	
	TOTAL :	7.000.-	

A.6. Desembolsos de Fondos del T.G.N.

Como mencionamos en nuestro informe anterior, recién se efectivizaron los fondos en nuestras cuentas corrientes en los meses de Diciembre y Enero de 1985 de acuerdo a la siguiente relación :

FONDOS CONTRAPARTE CREDITO AID-511-T-062  
RELACION DE DESEMBOLSOS T.G.N. AL 31 DE ENERO DE 1985

	1er. D E S E M B O L S O			2do. D E S E M B O L S O			MONTO	TOTAL
	FECHA	MONTO \$b.	EQUIVALENTE \$us.	FECHA	MONTO \$b.	EQUIVALENTE \$us.	\$b.	\$us.
LA PAZ	23-Oct-84	82.795.000.-*	16.559.-	16-Ene-85	68.310.000.-	7.590.-	151.105.000.-	24.149.-
ORURO	7-Nov-84	5.540.000.-	615.-	7-Nov-84	2.944.000.-	327.-	8.484.000.-	942.-
COCHABAMBA	19-Oct-84	9.060.000.-*	1.812.-	7-Nov-84	6.248.000.-	775.-	15.308.000.-	2.587.-
SANTA CRUZ	7-Nov-84	5.602.000.-	622.-	7-Nov-84	3.729.000.-	414.-	9.331.000.-	1.036.-
CAMIRI	7-Nov-84	1.580.000.-	175.-				1.580.000.-	175.-
VALLEGRANDE	7-Nov-84	1.180.000.-	131.-				1.180.000.-	131.-
AIQUILE	7-Nov-84	1.073.000.-	119.-				1.073.000.-	119.-
UNCIA	7-Nov-84	2.531.000.-	281.-				2.531.000.-	281.-
<b>T O T A L E S :</b>		109.361.000.-	20.314.-		81.231.000.-	9.106.-	190.592.000.-	29.420.-

\* Monto total de desembolsos mes de Octubre \$us. 18.371.-  
Monto real recibido por el S.N.D.C. " 10.206.-  
Diferencia por tipo de cambio \$us. 8.165.-

R E S U M E N

Monto comprometido mediante Carta de Implementación N°32 40.139.-  
Menos : Desembolsos efectuados 29.420.-  
Menos : Diferencia tipo de cambio 8.165.- 21.255.-  
Monto por desembolsar T.G.N. \$us. 18.884.-

CUADRO RELACION DE DESEMBOLSOS

El monto total desembolsado por el T.G.N. es de \$b. 190.592.000.- equivalente a \$us. 29.420.-, pero, la recepción de estos fondos - fué en los meses de Diciembre y Enero, siendo su equivalente a - \$us. 21.255.-, quedando un saldo de \$us. 18.884.- con relación al compromiso contraído por el gobierno, como contraparte al Crédito.

Por lo tanto, se hizo las gestiones necesarias al T.G.N. para un nuevo desembolso, el mismo que se efectivizó el 13 de Mayo del - presente año por el total del saldo adeudado de acuerdo al siguien  
te detalle :

ULTIMO REQUERIMIENTO DE FONDOS CONTRAPARTE PRESTAMO  
AID-511-T-062 PRESUPUESTO COMPROMETIDO EN CARTA -  
DE IMPLEMENTACION N°32

(En Miles de Pesos Bolivianos)

<u>CO- DIGO</u>	<u>D E S C R I P C I O N</u>	<u>MONTO</u>
200	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	720.000.-
210	<u>Servicios Básicos</u>	144.000.-
211	Comunicaciones	18.000.-
212	Energía Eléctrica y Agua	48.000.-
213	Publicidad	78.000.-
220	<u>Servicios de Transporte y Seguros</u>	524.000.-
221	Pasajes	102.000.-
222	Viáticos	232.000.-
223	Fletes y Almacenamiento	190.000.-
240	<u>Mantenimiento y Reparaciones</u>	48.000.-
241	Edificios y Equipos	48.000.-
250	<u>Servicios Profesionales y Comerciales</u>	4.000.-
253	Comisiones y Gastos Bancarios	4.000.-
300	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	224.200.-
310	<u>Para Oficina</u>	57.000.-
311	Papelería y Suministros Varios	57.000.-
320	<u>Para Usos Varios</u>	167.200.-
321	Limpieza y Usos Domésticos	11.000.-
323	Alimentos	37.000.-
325	Lubricantes y Combustibles	9.000.-
326	Méd., Farm., Quím. y de Laboratorio	8.000.-
327	Construcción y Edificación	13.702.-
328	Acc., Repuestos y Herramientas Menores	88.498.-
		<u>944.200.-</u>

B. COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS.

B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6. y

B.7. Estas actividades fuerón las que presentarón mayores problemas -- en el momento de su realización, debido a la poca flexibilidad - existente: en nuestras disposiciones legales, referidas a la ad - quisición de materiales y repuestos y a la constante variación - de precios en el mercado local, hecho que perjudicó sustancialmen - te en la provisión oportuna de materiales para Sub-Proyectos.

No obstante estas dificultades, se cumplió regularmente con la ve - rificación de cotizaciones de proveedores, elaboración de cuadros comparativos, aprobación de los mismos, elaboración de comprobantes de pago, giro de cheques, transporte de materiales, etc. que permitió el apoyo sustancial para la ejecución de los Sub-Proyec - tos; así como el envío de comunicaciones a los comités comunales, elaboración de notas de remisión y cierre de registros, a medida que se concretaban nuestras operaciones.

Esta situación fué superada con la firma de la Carta de Implemen - tación N°36, que autoriza efectuar pagos directos por USAID/Boli - via, para la adquisición de materiales y otros, hecho que permi - tió a la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, concluir sus - adquisiciones y viabilizar la conclusión de los sub-proyectos en ejecución.

B.8. y

B.9. Reparación y Mantenimiento de Vehículos.

Las actividades referidas a la reparación y mantenimiento de movi-  
lidades asignadas al Proyecto, se cumplieron parcialmente debido  
a la insuficiencia de fondos, seriamente afectados por la cons-  
tante variación del tipo de cambio en el mercado paralelo, paráme-  
tro que utilizan las casas comerciales para la cotización de sus -  
artículos.

A pesar de estos imponderables se ha efectuado el mantenimiento -  
de nuestras movilidades, en condiciones casi regulares, gracias a  
la cooperación del S.N.D.C., que nos han permitido utilizar algu-  
nos repuestos de movilidades en desuso y otras que se encontraban  
en stock.

C. EJECUCION DE OBRAS.

C.1. Promoción y Motivación a los Comités Comunales de los Sub-Proyec-  
tos.

En el curso del presente semestre se ha continuado apoyando activi-  
dades de promoción y motivación con los comités y comunidades, -  
donde se ejecutan las 37 obras comprometidas en Carta de Imple-  
mentación N°32 de fecha 18 de Septiembre de 1984.

Estas actividades estuvieron destinadas a promover la participación de los campesinos en la conclusión de sus obras; a cumplir gestiones para canalizar otros aportes de apoyo a los Sub-Proyectos y en la realización de actividades socio-culturales destinadas a reunir fondos que fuerón requeridos como aporte comunal para la total conclusión de las obras.

También se han realizado actividades referidas a la formación de los Comités de Mantenimiento de las Obras. Estos comités se formaron previa reflexión de los campesinos sobre los beneficios, costos y cuidados que requieren los proyectos para su adecuado aprovechamiento. Estas reuniones, también permitieron valorar los esfuerzos realizados por los campesinos para el logro de sus objetivos. Así también recordaron sobre gestiones realizadas ante instituciones de apoyo al desarrollo rural; de los repetidos viajes, peticiones y promesas que nunca se cumplierón a lo largo de los años. Finalmente, evaluarón sobre las condiciones que propiciaron la reactivación de los Sub-Proyectos, por medio del Proyecto 062, cuya metodología de trabajo aplicada permitía la total conclusión de 37 obras en beneficio de comunidades campesinas del país.

En muchas comunidades, los campesinos hicieron conocer sus dudas en el planteamiento de trabajo y conclusión de obras que les propo

nían los técnicos del Proyecto 062, ya que ellos habían sido en -  
gañados por tanto tiempo, y pensar en que las obras se conclui -  
rían en el curso de los próximos seis meses, representaba otra -  
promesa más.

Felizmente, gracias al decisivo apoyo de las autoridades del -  
S.N.D.C. y al estricto cumplimiento de la metodología de trabajo  
propuesta por el Proyecto 062, cuyo personal técnico y administra -  
tivo trabajó a tiempo completo en los proyectos, sin acatar paros  
ni huelgas, así como el oportuno desembolsos de los fondos del -  
Préstamo AID-511-T-062 y del T.G.N., han hecho posible cumplir con  
las comunidades y recuperar la confianza de los campesinos hacia  
el S.N.D.C.

Las actividades referidas a la promoción y motivación de los Comi -  
tés Comunales de los Sub-Proyectos, sin duda, han contribuido a -  
una afectiva y decidida participación de los campesinos en la con -  
clusión de sus obras. Corresponde destacar el esfuerzo y sacrifi -  
cio de algunas comunidades por cumplir con aportaciones que no ha -  
bían sido previstas, pero que debido a la constante variación de  
precios, tanto en el pago de la mano de obra calificada, la adqui -  
sición de materiales y el pago por el traslado de los mismos a -  
las comunidades, había la necesidad imperiosa de cumplir con es -

tas aportaciones. De no mediar el cariño y compromiso moral que caracterizó a los campesinos en la conclusión de sus obras, estas aportaciones extraordinarias, en otras circunstancias, no hubieran sido posible efectuarlas y tal vez no se hubieran podido concluir las mismas.

Sólo como ejemplo, señalaremos los casos de Achacachi, cuyos comunarios tuvieron que desembolsar importantes aportaciones que superó a los 140 millones. Otro caso a destacar es el de los campesinos de Santo Domingo, cuyos campesinos tuvieron que hacer fuertes aportaciones extras para la compra y traslado de arena fina y gruesa desde la zona de Chuquiaguillo, La Paz, hasta Santo Domingo para el vaciado del Puente, por no existir en la región este tipo de material. Otro ejemplo digno a destacar es el caso del Sub-Proyecto de Ayacucho Porongo, en oportunidad de inaugurar su Micro Hospital y gracias a gestiones cumplidas por el Comité de la Obra, consiguieron donaciones de catres, colchones, un lote de medicamentos, y la Unidad Sanitaria de Santa Cruz, asignó los items de médico y enfermera. Es esta oportunidad los jóvenes de la comunidad consiguieron en donación una ambulancia que se encontraba fuera de servicio, con sus propios ahorros la habilitaron, la pintaron y pusieron a disposición del Micro Hospital de Ayacucho Porongo.

Un medio audiovisual que facilitó la promoción y motivación tanto de los comités como de las propias comunidades ha sido la presentación de grabaciones en video de las diferentes actividades que se cumplían en las obras. Este medio a confirmado su efectividad de motivación, ya que la respuesta de las comunidades después de ésta actividad, se vió ampliamente fortalecida y los pronunciamientos y decisiones generalmente se asumían después de estas presentaciones.

Finalmente, la conclusión de las obras, el reconocimiento del que fueron objeto los propios comités de obras, la designación de los comités de mantenimiento y aprovechamiento de las obras, han fortalecido las propias organizaciones comunales y han confirmado la confianza de los campesinos en futuras actividades a cumplir y lo que es más importante es que el cumplimiento de éstas obras en beneficio de las comunidades campesinas ha permitido un cambio total de la imágen que el S.N.D.C. tenía en el medio rural.

C.2. Residencia y Programación de la Asistencia Técnica en cada Sub-Proyecto.

La determinación tomada de asignar responsabilidad profesional en cada obra, desde la verificación o complementación de planos, ha

ta la conclusión de la construcción del Sub-Proyecto, permitió la dedicación exclusiva del técnico asignado, quién elaboró sus propias solicitudes de materiales; verificó cotizaciones en cuanto a calidad y cantidad en casas proveedoras, dando el visto bueno ó conformidad a las adquisiciones para finalmente controlar la correcta entrega a almacenes ó al comité pro-construcción que, previa programación, se hacía presente para recoger sus materiales corriendo con los gastos de transporte.

Si bien en contados casos se detectaron faltas de responsabilidad profesional en momentos críticos de ejecución de obras, en los más hubieron iniciativas y aportes personales en cuanto a técnicas de construcción, en puentes, captación de agua potable y mejor calidad de obra y acabados en construcciones agropecuarias, puestos médicos, colegios y escuelas.

La permanencia del profesional responsable en la misma obra de acuerdo a una programación preestablecida permitió la continuidad de los trabajos, y al técnico conocer y compartir las limitantes de ejecución de obras en el área rural, siendo un desafío para sus conocimientos y que conjuntamente los grupos de trabajo de las propias comunidades resolvieron exitosamente problemas que se plantearon en las construcciones programadas.

La labor silenciosa y determinante de las promotoras y promotores que fueron asignados a cada Sub-Proyecto fué el factor definitivo para el éxito en la conclusión de obras en el tiempo programado.

La reactivación de la motivación de las comunidades beneficiadas, la organización de grupos de trabajo, con horarios y turnos de ingreso al trabajo, control de ingreso y salida de materiales, la recolección de materiales del lugar, que de acuerdo al tipo de obra deben ser especiales y en ubicaciones apropiadas, llegaron a cumplirse ampliamente debido al esfuerzo desinteresado y sacrificado del conjunto de promotores con el apoyo de sus respectivas oficinas.

Trabajarón en equipo, comunidad, promotores y profesionales, todos residenciados en la obra sin acatar huelgas ni paros, debiéndose resaltar que hubieron técnicos del S.N.D.C., como el caso de Santa Cruz, que pusieron sus propias movilidades al servicio de la atención de las obras que se les encomendarón.

Pero promotores y profesionales tuvieron también que enfrentarse a la hostilidad inicial en algunas comunidades por que el S.N.D.C. anteriormente había incumplido con sus compromisos y se reclamaban aportaciones en dinero desde hace 15 años, cuyos responsables ya no se encontraban en la Institución.

El sistema de residencia y programación de la asistencia técnica en cada obra, quedó así demostrado que es el más adecuado para este tipo de trabajo en el área rural.

C.3. Asignación de Viáticos y Movilidades.

Presentado el "cronograma de conclusión de obra" y "detalle de permanencia en obra" por cada profesional responsable, se asignaron las respectivas movilidades de acuerdo a las zonas a ser atendidas y al número de obras responsabilizadas a cada técnico, en los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, con carácter de "exclusividad".

En Sucre, Potosí y Tarija, por acuerdos con la Dirección Ejecutiva del SNDC, las movilidades debían ser compartidas con otros programas que se ejecutaban con el S.N.D.C., cuyo mantenimiento y combustibles debía correr a cargo de éstas oficinas con fondos del Tesoro General de la Nación y contraparte a esos programas.

C.4.,

C.5.,

C.6. y

C.7. Ejecución de Obras-Apoyo Logístico, Seguimiento de Programación, Cuadro de Control de Obras e Informe y Evaluación Mensual.

Desde Octubre de 1984 a Abril de 1985, se realizaron 40 viajes de

supervisión técnica de obra por la Oficina de Coordinación del Proyecto y la División de Ingeniería de USAID/Bolivia, abarcando las obras que se ejecutaban en los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

La programación de supervisión técnica de obra prevista del 11 al 20 de Marzo de 1985 a los Departamentos de Sucre, Potosí y Tarija, inicialmente no se pudo concretar por haberse declarado una huelga general indefinida de la Central Obrera Boliviana, dejando ésta - responsabilidad al Ing. Freddy Moscoso, quién realizó ésta supervisión del 11 al 26 de Abril del presente año.

Estas supervisiones técnicas fueron decisivas para evitar errores técnicos de obra, cumplir con el cronograma de ejecución en el tiempo previsto y particularmente tomar decisiones conjuntamente con los profesionales responsables de cada Oficina Departamental y Zonal referente a ampliaciones de cuenta, por las fluctuaciones de precios en los materiales de construcción.

A continuación mostramos la relación de viajes de supervisión técnica.

RELACION DE SUPERVISIONES TECNICAS DE OBRA

AÑO 1984

<u>Fecha</u>	<u>Comunidad</u>	<u>Tipo de Obra</u>
9-October-84	Arce Banzer	Puente Colgante 52 Ml.
11-October-84	Chacón	Agua Potable
11-October-84	Moro	Puente Fijo 6.00 mts.

SANTA CRUZ

23-October-84	V. San Antonio	E-180-S.D.B.
23-October-84	Forestal	Escuela Técnica
24-October-84	Ayacucho Porongo	Micro Hospital
25-October-84	Curuguacua	E-150-S.D.L.
25-October-84	Estación Basilio	E-120-S.D.B.

LA PAZ

17-Noviembre-84	Santo Domingo	Puente Fijo 18.30 Ml.
28-Diciembre-84	Achacachi	Colegio Secundario

AÑO 1985

LA PAZ

3-Enero-85	Santo Domingo	Puente Fijo 18.30 Ml.
3-Enero-85	La Reserva	E-180-S.D.
4-Enero-85	El Progreso	Centro Acopio Café
11-Enero-85	Antaquira Belén	E-120-S.D.

SANTA CRUZ

14-Enero-85	Ayacucho Porongo	Micro Hospital
15-Enero-85	Estación Basilio	E-120-S.D.B.
15-Enero-85	Villa San Antonio	E-180-S.D.B.

LA PAZ

21-Enero-85	Achacachi	Col. Secundario
-------------	-----------	-----------------

COCHABAMBA

31-Enero-85	Senda Suipacha	Puente Fijo
1-Febrero-85	Nueva Canaan	E-90
2-Febrero-85	Linde	2 Ptes. de 6.50 y 4.00 Mts.

<u>Fecha</u>	<u>Comunidad</u>	<u>Tipo de Obra</u>
<u>LA PAZ</u>		
12-Febrero-85	Ocobaya	Puesto Médico
13-Febrero-85	Trinidad Pampa	Puente Fijo 6.50 Ml.
14-Febrero-85	La Calzada	E-150-S.D.
<u>COCHABAMBA</u>		
26-Febrero-85	Nueva Canaan	E-90
26-Febrero-85	Senda Suipacha	Puente Fijo
<u>SUCRE, POTOSI Y TARIJA</u> (Suspendido por huelga C.O.B.)		
<u>ORURO</u>		
27-Marzo-85	Ancacato	Puesto Médico 4/c.
28-Marzo-85	Puqui	Puesto Médico 2/c.
<u>LA PAZ</u>		
9-Abril-85	El Progreso	Centro Acopio Café
9-Abril-85	La Reserva	E-180-S.D.
9-Abril-85	Aguas Turbias	E-30-V
12-Abril-85	Trinidad Pampa	Puente H°A° 6.50 Ml.
12-Abril-85	Chacón	Captación Agua Potable
17-Abril-85	Taraco	Puesto Médico
17-Abril-85	Achacachi	Colegio Secundario
18-Abril-85	Antaquira Belén	E-120-S.D.
<u>SANTA CRUZ</u>		
22-Abril-85	Villa San Antonio	E-180-S.D.B.
23-Abril-85	Forestal	Escuela Técnica
24-Abril-85	Curuguacua	E-150-S.D.L.
24-Abril-85	Estación Basilio	E-120-S.D.B.

Asímismo, estos viajes permitieron conocer la situación de algunos profesionales responsables de obra que esperan necesariamente la presencia de la supervisión técnica para hacer mención de los problemas que resaltan en una construcción, ó estos quedan postergados por tiempo indefinido por falta de decisión profesional o apoyo logístico, por las limitantes económicas que atraviezan las Oficinas del S.N.D.C. y que no son comunicadas oportunamente.

Las supervisiones técnicas detectaron también que unas oficinas - cumplen con su responsabilidad en forma sacrificada, hasta en días Sábados y Domingos, y otras se encuentran cerradas ó con sólo el personal de promoción, por falta de un seguimiento oportuno y dedicación de los mandos inmediatos.

Fué una experiencia positiva para la supervisión, hacer el seguimiento de la adquisición de materiales, así como el recojo y entrega de los mismos a las comunidades con el sistema propuesto de enviar funcionarios de la Coordinación 062, a cada Oficina Departamental, para apoyar, orientar y garantizar estas adquisiciones en tiempos que no excedieran los tres días, considerándolo satisfactorio en vista de que algún personal del S.N.D.C., requirió de orientación en la elaboración de documentos y compras de materiales adecuados para las obras, para cumplir con este objetivo.

Un factor negativo en la ejecución de obras fué el hecho que el S.N.D.C., dispone de movilidades en muy mal estado, las cuales frecuentemente requirieron de reparaciones con las consiguientes interrupciones de continuidad en la dirección de obra, complementado con el hecho de que se debe respetar en su totalidad la exclusividad de uso de la movilidad asignada a cada técnico.

Podemos resumir que la compra ágil y oportuna de materiales, su envío a las comunidades, la dedicación de los profesionales responsables con el apoyo logístico, fueron los factores que sumados al seguimiento y a la supervisión permiten a la fecha mostrar a la Oficina de Coordinación 062, la siguiente relación de 34 obras concluidas, tres en ejecución y una cancelada, de 38 obras encomendadas a su responsabilidad.

SUB-PROYECTOS CONCLUIDOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 1985 S.N.D.C.

		<u>Tipo de Obra</u>	<u>Avance de Obra</u>	<u>Observaciones</u>
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ</u>				
c.1.1.	Forestal	Escuela Técnica	100%	Concluído e Inaugurado
c.1.2.	V.San Antonio	E-180-S.D.B.	100%	Concluído e Inaugurado
c.1.3.	Est.Basilio	E-120-S.D.B.	100%	Concluído e Inaugurado
c.1.4.	Ay.Porongó	Micro Hospital	100%	Concluído e Inaugurado
<u>ZONAL CAMIRI</u>				
c.1.5.	Est.Charagua	E-180-S.D.	100%	Concluído por Inaugurar
c.5.6.	Curuguacua	E-150-S.D.L.	100%	IDEM
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSI</u>				
c.1.7.	Turuchipa	Hospital	100%	Concluído e Inaugurado
c.5.8.	Pancochi	Puesto Médico	100%	IDEM
c.5.9.	Tambalilla	E-60-V	100%	IDEM
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL URURO</u>				
<u>ZONAL UNCIA</u>				
c.1.10	Belén	E-90-S.D.	100%	Concluído e Inaugurado
c.1.11	Limaya	E-30-V	100%	Concluído por Inaugurar
c.1.12	Toracarí	E-90-S.D.-C.M.	100%	Concluído e Inaugurado
c.1.13	Acacio	E-60-S.D.	100%	Concluído e Inaugurado
<u>ZONAL CHALLAPATA</u>				
c.3.14	Ancacato	Puesto Médico 2/c.	100%	Concluído por Inaugurar
c.5.15	Puqui	Puesto Médico 2/c.	100%	IDEM
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA</u>				
<u>ZONAL PUNATA</u>				
c.2.16	Linde	Puente Fijo	100%	Concluído por Inaugurar
<u>ZONAL VILLA TUNARI</u>				
c.4.17	Senda Suipacha	Pte.Alcantarilla	100%	Concluído e Inaugurado
c.4.19	Nuava Canaan	E-90	100%	Concluído e Inaugurado

		<u>Tipo de Obra</u>	<u>Avance de Obra</u>	<u>Observaciones</u>
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ</u>				
<u>ZONAL CARANAVI</u>				
c.2.20	La Reserva	E-180-S.D.	100%	Concluído por Inaugurar
c.2.21	El Progreso	Centro Acopio Café	100%	Concluído e Inaugurado
c.2.22	Unión Camacho	E-30-V	100%	IDEM
c.2.23	Aguas Turbias	E-30-V	100%	IDEM
c.2.24	Incapampa	Agua Potable	100%	IDEM
c.2.25	Sto.Domingo	Puente Fijo	100%	IDEM
<u>ZONAL CHULUMANI</u>				
c.2.26	La Calzada	E-150-S.D.	100%	Concluído e Inaugurado
c.2.27	Ocobaya	Puesto Médico	100%	IDEM
c.2.28	Sikiljara	Agua Potable	100%	IDEM
c.2.29	Naranjani	Agua Potable	100%	IDEM
<u>ZONAL COROICO</u>				
c.2.31	Chacón	Agua Potable	100%	Concluído e Inaugurado
c.2.32	Ttrin.Pampa	Puente Fijo	100%	Concluído e Inaugurado
<u>ZONAL TIAWANACU</u>				
c.2.33	Taraco	Puesto Médico	100%	Concluído por Inaugurar
c.2.34	Ant.Belén	E-120-S.D.	100%	Concluído e Inaugurado
<u>ZONAL HUARINA</u>				
c.5.35	Achacachi	Col.Secundario	100%	Concluído por Inaugurar
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL SUCRE</u>				
c.5.36	Thaco Pampa	E-180-S.D.	100%	Concluído e Inaugurado
<u>SUB-PROYECTOS EN EJECUCION HASTA EL 31 DE MAYO DE 1985</u>				
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA</u>				
c.5.37	Canasmoro	E-180-S.D.	50%	En ejecución
c.5.38	Ancón Grande	Puente Pasarela	80%	En ejecución

		<u>Tipo de Obra</u>	<u>Avance de Obra</u>	<u>Observaciones</u>
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA</u>				
<u>ZONAL VILLA TUNARI</u>				
c.4.18	Ibuelo	Puente Fijo	25%	En ejecución

SUB-PROYECTOS CANCELADOS

OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ

ZONAL CHULUMANI

c.2.30	Arce Banzer	Puente Colgante		Cancelado
--------	-------------	-----------------	--	-----------



CONSTRUCCIONES SOCIALES Y AGROPECUARIAS

COMUNIDAD	TIPO DE OBRA	AVANCE DE OBRA AL..... 31-5-85	A V A N C E D E O B R A																	PROFESIONAL RESPONSABLE							
			Ubic.Rep. Excavac.	Cimient.	Sobrec.	Muros, Tabiques	Dinteles	Enviado techo	Cubierta	Inst.Elc.	Cieloras.	Marcos y Ventanas	Revoque	Muros Ext.	Revoque	Muros Int.	Inst.Sani.	Pisos	Zócalos		Pizarron.	Pintura interior	Pintura exterior	Quincalle	Ria	Vidrios macillado	Lim.gral.
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ</u>																											
<u>ZONAL CARANAVI</u>																											
La Reserva	E-180-SD	100 %							NA							NA											
El Progreso	Ctro.Acop: Café	100 %							NA							NA			NA								
U. Camacho	E-30-V	100 %							NA							NA											
A. Turbias	E-30-V	100 %							NA							NA											
<u>ZONAL CHULUMANI</u>																											
La Calzada	E-150-SD	100 %							NA							NA											
Ocobaya	Pto.Médico	100 %																NA									
<u>ZONAL TIAWANACU</u>																											
Taraco	Pto. Médico	100 %																	NA								
Ant. Belén	E-120-SD	100 %							NA							NA											
<u>ZONAL HUARINA</u>																											
Achacachi	Col. Secund.	100 %																									
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL SUCRE</u>																											
Thaco Pampa	E-180-SD	100 %							NA							NA											
<u>OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA</u>																											
Canasmoro	E-180-SD Coc. y Baño	50 %																									

BEST AVAILABLE COPY

INFORME RESUMEN N°.....2.....

DEL.....1°.....DE.....diciembre.....DE 198.4..

AL ...31.....DE...Mayo.....DE 198.5..

SUB-PROYECTOS A SER CONCLUIDOS

S.N.D.C. - 062

-----PLANIFICADO

-----EJECUTADO

CONSTRUCCION DE PUENTES

COMUNIDAD	TIPO DE OBRA	AVANCE DE OBRA AL..... 31-5-85	A V A N C E D E O B R A														PROFESIONAL RESPONSABLE						
			INFRAESTRUC.				SUPER ESTRUCTURA						PUENTES COLGANTES										
			Replanteo	Exc.Fundac.	Vaciado Fund.	Const.de Est.	Doblado Fier.	Arm. Encofrad.	Arm. Fierros	Vaciado Vigas	Vac.Diafrag.	Vaciado Losa	Vaciado Baran.	Desenc.y Curd.	Vaciado Torre.	Vac.Anclajes		Tesado Cables	Colg.Tensores	Vigas Transv.	Vigas Longit.	Plataf. Piso	Barandados
OFICINA DEPARTAMENTAL COCHABAMBA ZONAL PUNATA																							
16. Linde	Puente Fijo	100 %																					Ing. J. Jordán
ZONAL VILLA TUNARI																							
17. Suipacha	Pte.Alcant.	100 %				NA				NA	NA												Idem cc. R. Calvimonte
18. Ibuelo	Pte.Fij.4,80m	25 %										NA											
OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ ZONAL CARANAVI																							
25. Sto. Domingo.	Pte. Fijo	100 %																					Ing. F. Torrico
ZONAL CHULUMANI																							
30. Arce Banz	Pte.Colgante		Proyecto cancelado por falta de interés de la comunidad																			cc. A.López	
ZONAL COROICO																							
32. Trinidad Pampa		100 %																					cc. R. Calvimontes cc. C. Poma
OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA																							
38. Ancón G.	Pte.Pasarela 50 m	80 %				NA																	

BEST AVAILABLE COPY

MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS  
SERVICIO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

PRESTAMO AID-511-T-062  
DONACION AID-511- 0499  
DESARROLLO COMUNAL

COORDINACION 062

INFORME RESUMEN N°.....2:.....

DEL.....1°.....DE.....Diciembre.....DE 198.4.

AL.....31.....DE.....Mayo.....DE 198.3.

SUB - PROYECTOS A SER CONCLUIDOS

HOJA N°.....4.....

S.N.D.C. - 062

----- PLANIFICADO

----- EJECUTADO

CAPTACION AGUA POTABLE

COMUNIDAD	TIPO DE OBRA	AVANCE DE OBRA AL.....31.....85.....	A V A N C E D E O B R A															PROFESIONAL RESPONSABLE		
			OBRA DE TOMA					TANQUE REG. H°A°					TANQUE REG. H°C° TUBERIAS							
			Replanteo y Excav.	Cimientos	Mur. y Ale	Vaciado Tapa losa	Reyes. poz p/hombeo	Cub. Cast. p/hombeo	Vaciado base/bomb.	Replanteo y Excav.	Vac. Zap.	Vac. Column y riostr.	Vaciado del tanq.	Curado y Coloc. Ac.	Cimientos	Const. de Muros	Vaciado Tapa los.		Tend. de Tub. Aduc.	Tend. Tub. distribu.
OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ																				
ZONAL CARANAVI																				
24. Incapampa	Agua Potable	100 %				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						Concluido	cc. R. Calvimonte	
ZONAL CHULUMANI																				
28 Sikiljara	Agua Potable	100 %				NA	NA	NA	No aplicable										Concluido	cc. A. López
29. Naranjani	Agua Potable	100 %				NA	NA	NA											Concluido	cc. A. López
ZONAL COROICO																				
31. Chacón	Agua Potable	100 %				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						Concluido	cc. R. Calvimonte	

BEST AVAILABLE COPY

D. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

D.1. Registro Contable

El registro de las transacciones contables representó una actividad regular y permanente, en el período comprendido de Diciembre a Mayo de 1985.

D.2. Remesa de Fondos a Oficinas del Interior, Notas de Operación y Detalle de Sub-Proyectos.

Esta actividad se cumplió con prioridad tan pronto se recibieron los desembolsos, la verificación de costos de materiales y remesas de fondos a las Oficinas del Interior. La relación de fondos asignados a las Oficinas del Interior es la siguiente :

REMESAS DE FONDOS OFICINAS DEL INTERIOR

(En Pesos Bolivianos)

<u>OFICINA DEPARTAMENTAL</u>	<u>TOTAL DESEMBOLSO</u>
ORURO	206.420.706.-
COCHABAMBA	123.203.993.-
SANTA CRUZ	673.978.548.-
SUCRE	120.032.055.-
TARIJA	173.366.818.-
POTOSI	224.852.474.-
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>1.521.854.594.-</b> =====

D.3. Control y Seguimiento de Fondos en Oficinas Departamentales.

Por las labores recargadas y diversificadas que cumplió el personal administrativo de la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, recién en los últimos meses se cumplieron las actividades de supervisión en las Oficinas Departamentales de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y Tarija.

D.4. Preparación y Presentación de Informes "Pari Passus".

La actividad referida a la preparación de informes en base al sistema "Pari Passus". En principio la presentación de los primeros informes se vió demorada debido a la complejidad en su elaboración, dado que es un sistema nuevo de control de fondos. No obstante estos problemas los informes se normalizaron al final del Proyecto.

D.5. Contabilización Según Traspasos Bancarios.

La contabilización de descargos según traspasos bancarios, ha sido una actividad permanente, que se cumplió con regularidad en el momento de las transacciones y complementada con la información proporcionada por las supervisiones administrativas.

D.6. Informe de Manejo de Fondos Sobre Adelantos USAID/Bolivia y Aportes Del Tesoro General de la Nación.

Con desembolsos efectuados por USAID/Bolivia, mencionados en el punto A del presente Informe, el manejo de fondos se caracterizó nuevamente por irregularidades ocasionadas por huelgas y la inflación - constante, perjudicando de ésta manera, las adquisiciones de materiales, de repuestos y el apoyo logístico en la ejecución de los - Sub-Proyectos.


No obstante estos inconvenientes el personal técnico y administrativo de la Coordinación 062, con ayuda de los ejecutivos del S.N.D.C. y USAID/Bolivia, pudo prestar una labor efectiva para el apoyo y - conclusión de los Sub-Proyectos, mediante medidas tendientes a solucionar los problemas que se presentarón.


ESTADO DE DESEMBOLSOS PRESTAMO AID-511-T-062

POSTERIORES A LA CARTA DE IMPLEMENTACION

N°32

(En dólares americanos)

USAID / BOLIVIA	ELEMENTO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO DESEMBOLSADO
	INFRAESTRUCTURA	435.828.-	435.828.-
	EQUIPO Y UTILES	15.311.-	15.311.-
	ASISTENCIA TECNICA	10.250.-	10.250.-
	GASTOS DE APOYO, OTROS Y CONTINGENCIAS	48.626.-	48.626.-
	TOTALES :	510.015.-	510.015.-

TESORO GENERAL DE LA NACION	ELEMENTO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO DESEMBOLSADO
	EQUIPO Y UTILES	7.366.-	7.366.-
	GASTOS DE APOYO, OTROS Y CONTINGENCIAS	35.173.-	35.173.-
	TOTALES :	42.539.-	42.539.-

E. AUDITORIA EXTERNA.

De acuerdo a instrucciones de personeros de USAID/Bolivia, se cumplió con la redacción de las bases y alcance de la Auditoría Externa, en fecha 17 de Abril, se enviaron las invitaciones a las firmas autorizadas por USAID/Bolivia. En fecha 26 de Abril del año en curso, se cerró la presentación de propuestas. En fecha 7 de Mayo se realizó la reunión de apertura de propuestas y se designó a la Comisión Calificadora, cuyo informe fué de conocimiento del Director del S.N.D.C., en fecha 9 de Mayo, quién designó la Comisión Negociadora con la firma adjudicada que en este caso fué la Consultora Delta Consult Ltda.

En fecha 29 de Mayo, la Oficina de Asesoría Legal del S.N.D.C., firmó el contrato correspondiente con la firma adjudicada para realizar la Auditoría Externa del Proyecto "Desarrollo Comunal" Préstamo AID-511-T-062 y Donación 511-0499, quién se compromete a ejecutar éste trabajo en plazo de 30 días a partir de la fecha.

La Dirección del S.N.D.C., ha dispuesto que el personal asignado a la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, continúe en sus funciones durante el mes de Junio, a objeto de apoyar a los funcionarios de la firma Consultora Delta Consult Ltda., para cumplir el presente compromiso de trabajo.

### III. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

#### CONCLUSIONES.

Considerando los resultados positivos y efectivos alcanzados por la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, en la reactivación y conclusión de 37 obras que tenían un 25% de avance, se ha podido confirmar una nueva metodología de trabajo aplicada durante 8 meses, representando una experiencia que merece ser considerada por los Directivos del S.N.D.C. y USAID/Bolivia, para impulsar nuevos proyectos de Desarrollo Comunal, que pueden ser ejecutados en forma directa y en tiempo no mayor a los 6 meses.

De ésta experiencia se pueden destacar los siguientes puntos :

1. Dedicación Exclusiva del Personal Asignado al Proyecto sin Acatar Paros ni Huelgas.

La decisión de Directivos del S.N.D.C., de declarar en "EMERGENCIA" al personal técnico y administrativo asignado al Proyecto, sin acatar paros ni huelgas, mediante Resolución Administrativa N°139/84, firmada por sus Directivos y respaldada por los propios dirigentes sindicales de la Institución, ha permitido la total dedicación del personal en la reactivación y ejecución de los 37 Sub-Proyectos.

Esta decisión a garantizado la plena ejecución de las actividades programadas por la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, no obstante haberse presentado una serie de paros y huelgas con carácter interno y externo durante el desarrollo del proyecto y que el personal asignado al mismo no acató ninguna de éstas determinaciones, y su dedicación total al trabajo incluyó días Sábados y Domingos.

A esta actitud ejemplar del personal asignado al proyecto se sumó el entusiasmo y decidido apoyo que prestarón los campesinos de las comunidades beneficiadas con los Sub-Proyectos, puesto que ellos tampoco acatarón paros ni huelgas, ni bloqueos de caminos, y donde se presentarón bloqueos fuerón los propios campesinos los que arreglarón éstos problemas y permitieron a los equipos técnicos del S.N.D.C. cumplir su misión.

2. Fortalecimientos y Participación Organizada de las Comunidades Campesinas y Aporte de Materiales de Contrucción.

La participación organizada de las comunidades campesinas con el aporte de mano de obra no calificada en la ejecución de las obras, así como el aporte de materiales de construcción del lugar, consistente en piedras, arena, ladrillos, madera y otros, representa una valiosa contribución de las comunidades campesinas en la ejecución del Sub-Proyecto. También se debe destacar, la total identificación de los campesinos sobre la utili-

dad y conservación de las obras realizadas, las mismas no representan -  
construcciones frías de piedras, fierros y cemento. Esta reflexión sobre  
la importancia y utilidad de las obras, motivó la organización de comi -  
tés de mantenimiento de las obras que representa el fruto de cientos de  
horas de trabajo de hombres, mujeres y niños. Este importante aporte co -  
munal, que en algunos casos se incrementó con aportes en dinero para el  
pago de mano de obra calificada, representó el aporte comunal en un 20,  
30 y 40 por ciento del costo total de la obra.

Esta participación de las comunidades campesinas en la ejecución de sus  
obras, a contribuído sustancialmente al fortalecimiento de la organiza -  
ción campesina, yá que su aporte en la ejecución de las obras les ha per -  
mitido mostrar la capacidad y decisión campesina para enfrentar sus pro -  
blemas y determinar sus soluciones.

### 3. Capacidad Efectiva de Gasto.

Una de las actividades que ha merecido atención prioritaria en la Ofici -  
na de Coordinación del Proyecto 062, ha sido dedicada a la adquisición -  
de materiales de construcción destinada a las obras; actividad que se ha  
cumplido en el tiempo y plazos determinados en la programación del Pro -  
yecto.

4. Infraestructura Instalada.

Otro punto a destacar, es que la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, contó con una infraestructura instalada fuera de la Sede del S.N.D.C., lo que garantizó la continuidad de actividades sin interferencias. También es necesario mencionar la responsable y eficiente cooperación por parte del personal técnico y administrativo de las Oficinas Departamentales y Zonales del S.N.D.C., en la ejecución de las obras en todo el territorio del país.

5. Personal Técnico y Administrativo que Trabaja con Mística y Responsabilidad a Tiempo Completo.

Finalmente, se debe destacar que la Oficina de Coordinación del Proyecto 062, tuvo asignado un personal técnico y administrativo que se caracterizó por su mística y completa dedicación al trabajo. Su conocimiento y experiencia de campo, así como su real compromiso con las aspiraciones de cambio en la vida rural, les ha permitido cumplir sus actividades programadas y el hecho de reconocerles un 30% de bono mensual sobre planilla de sueldos, representó un verdadero estímulo a su trabajo. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ellos.

RECOMENDACIONES.

1. Problemas en Sub-Proyectos Ejecutados en Poblaciones Rurales.

La ejecución de Sub-Proyectos en poblaciones rurales, casos : Achacachi, Ocobaya, Taraco (La Paz) y Villa San Antonio (Santa Cruz), han presentado serios problemas en el cumplimiento de los aportes comunales y aportes de mano de obra, debido a la mentalidad que prima en los vecinos de éstas poblaciones que dicen que la construcción de éstas obras, compete únicamente al Gobierno, por tanto, ellos exigen las obras pero no comprometen ni cumplen con sus aportes. Esta situación ha requerido realizar una intensa actividad de promoción para poder concluir éstas obras.

Esta experiencia nos demuestra la inadecuada planificación de éste tipo de obras y de los criterios que determinarón su ejecución en poblaciones rurales. Por tanto, recomendamos que en el futuro el S.N.D.C. debe considerar cuidadosamente los criterios socio-económicos y actitudes de las poblaciones para determinar la planificación y ejecución de Sub-Proyectos en poblaciones rurales.

Corresponde destacar que el cumplimiento de los aportes comunales, consistentes en materiales del lugar, aporte de mano de obra e incluso aportes económicos, en Sub-Proyectos ejecutados en comunidades campesinas han sido efectivos en un 100%, confirmando de ésta manera el enfoque y filosofía de trabajo del S.N.D.C. en beneficio de las comunidades campesinas.

A N E X O S



INFORMACION GRAFICA Y COMENTARIOS DE PRENSA

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062-USAID/BOLIVIA



BEST AVAILABLE COPY


INAUGURACION PUENTE DE SANTO DOMINGO - CARANAVI

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA




**INAUGURACION PUENTE DE SANTO DOMINGO -CARANAVI**

*BEST AVAILABLE COPY*

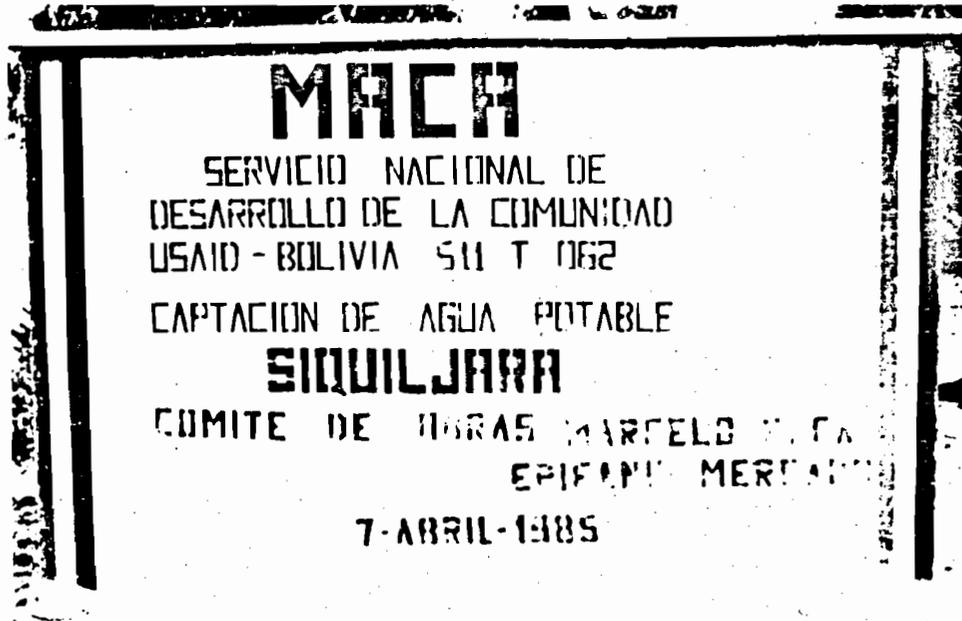

BEST AVAILABLE COPY

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

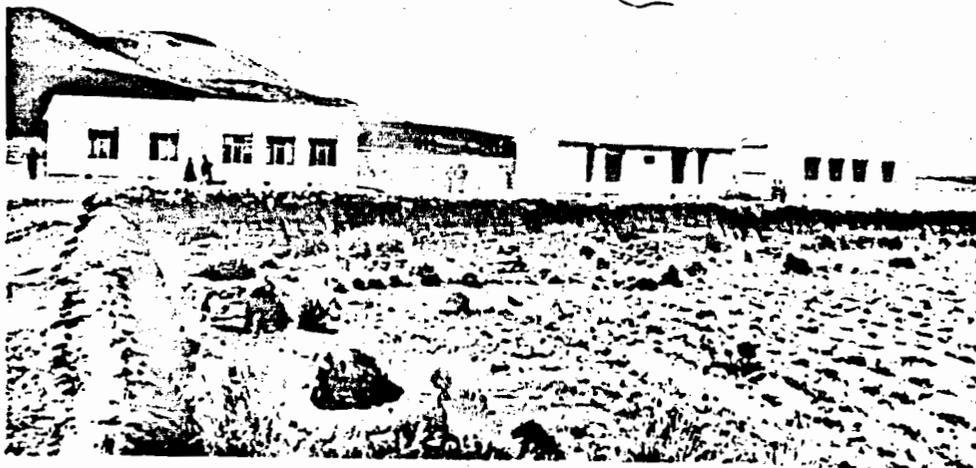

INAUGURACION NUCLO ESCOLAR DE ANTAQUIRA BELEN - PACAJES


OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA



INAUGURACION NUCLEO ESCOLAR DE ANTAQUIRA BELFN -PACAJES



INAUGURACION DEL PUENTE DE TRINIDAD PAMPA - COROICO

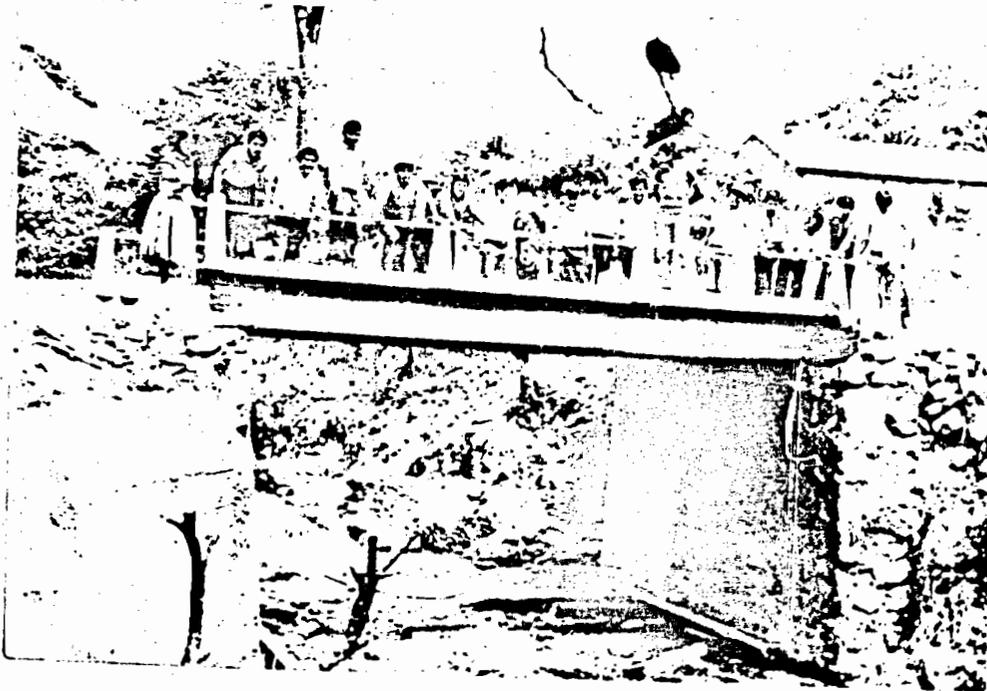


**INAUGURACION DEL PUENTE DE TRINIDAD PAMPA -COROICO**




**INAUGURACION AGUA POTABLE DE CHACON - COROICO**

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

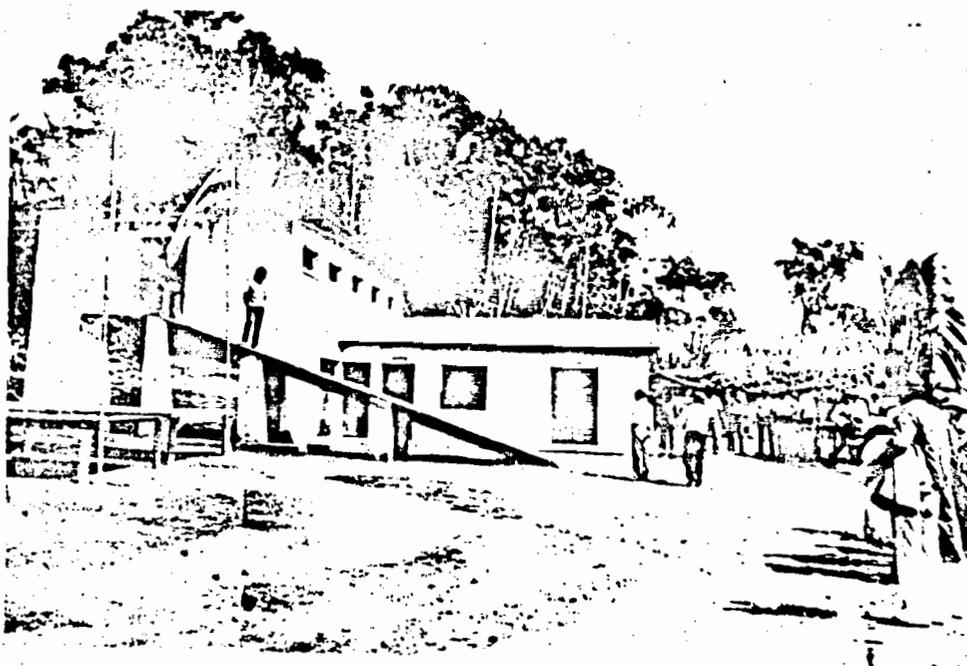



CENTRO DE ACOPIO DE CAFE - EL PROGRESO - CARANAVI

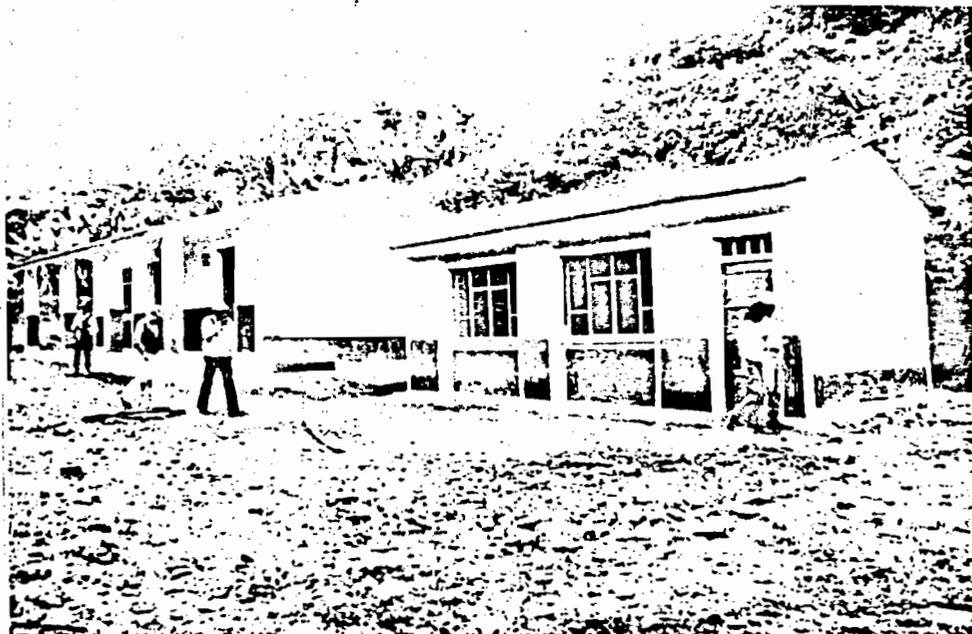

NUCLEO ESCOLAR DE UNION CAMACHO - CARANAVI

*BEST AVAILABLE COPY*


OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

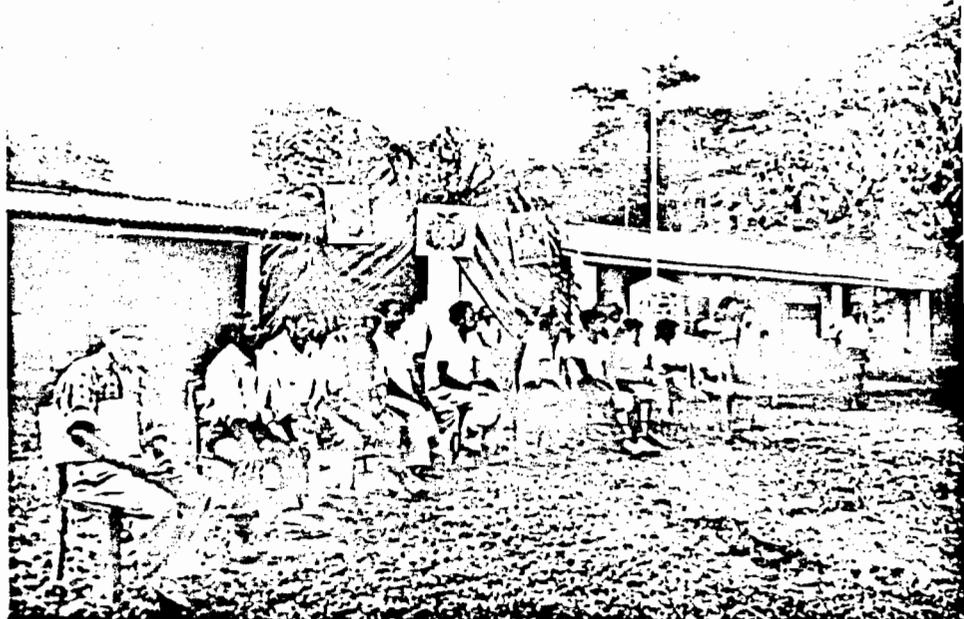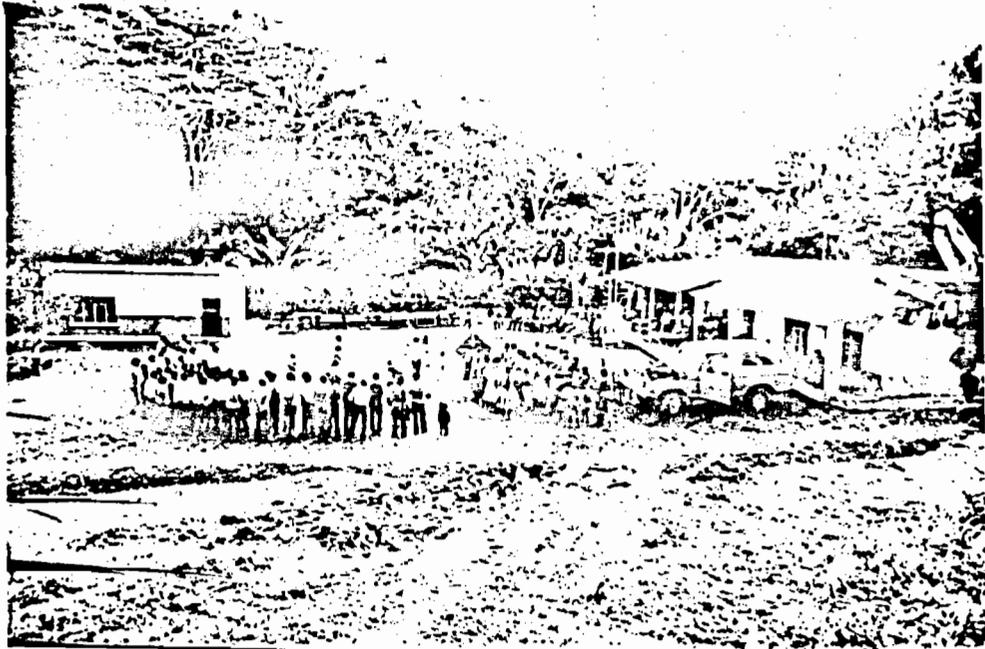

*BEST AVAILABLE COPY*

INAUGURACION DE UNA ESCUELA RURAL EN AGUAS TURBIAS - CARANAVI

PRESENCIA : Domingo, 3 de Febrero de 1985

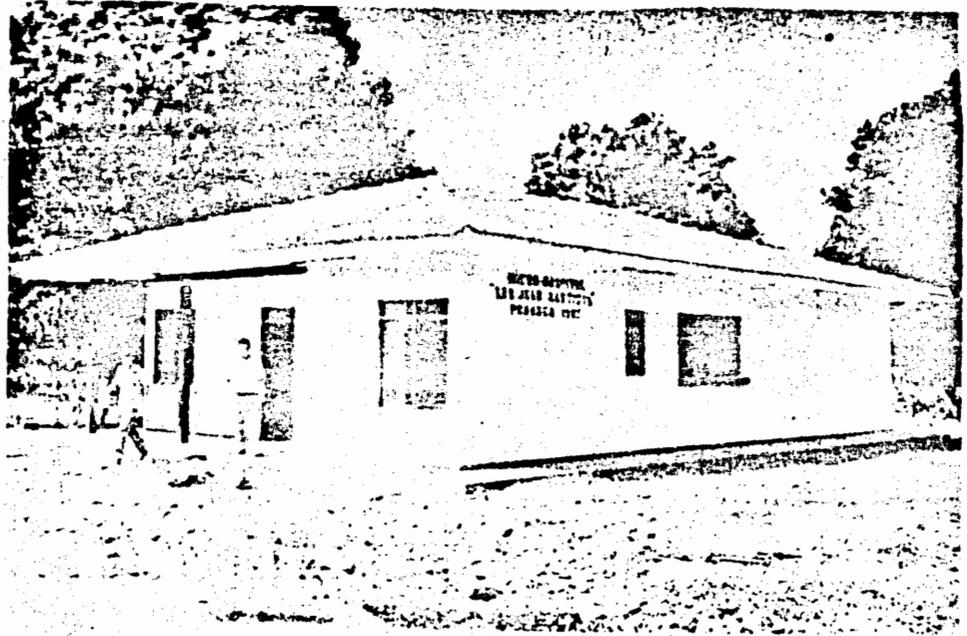

*MICRO HOSPITAL. Ayer fue inaugurado el micro hospital "San Juan Bautista" de Porongo, obra ejecutada mediante el sistema de auto ayuda*

## Micro-hospital en zona agraria de Santa Cruz

Los pobladores de Ayacucho - Porongo, provincia Andrés Ibañez, de Santa Cruz, cuentan con un nuevo micro-hospital y cuyo costo ascendió a \$b. 132.000.000, informó el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad.

Señalo que los aportes de los habitantes de esa localidad oriental consistió en materiales de construcción como ser, piedra, arena, ladrillos y mano de obra calificada y no calificada, que en la proporción representó el treinta por ciento del costo total de la obra concluida.

Por su parte, el gobierno mediante el organismo mencionado y parte del crédito USAID/Bolivia, Proyecto 062, participó en la viabilización de la obra con aportes de cemento, fierro, carpintería de madera, tejas planas, instalación eléctrica, sanitarios, plomería, pintura y el equipamiento básico de la obra, así como

la promoción, capacitación y asistencia técnica durante el desarrollo de la misma.

El proyecto data del 23 de abril de 1979, habiéndose recibido un primer desembolso en diciembre de 1983 para la iniciación material de trabajos. En noviembre de 1984, USAID/Bolivia, dentro del mismo proyecto, realizó un segundo desembolso y a la fecha la obra ha sido concluida por el sistema de auto ayuda que impulsó Desarrollo de la Comunidad con un total de 1.123 jornales en grupos de trabajo permitiendo de ese modo beneficiar a 864 familias que habitan en la región.

A tiempo de inaugurar ese micro-hospital, se destacó las gestiones que realizó el señor Remberto Jordán Roca, Alcalde de Porongo, para lograr el aporte de CORDECRUZ y de la Unidad Sanitaria Cruceña, organismo que asignó los ítems de un médico y enfermera.

BEST AVAILABLE COPY

## Fue entregado un hospital en una provincia cruceña

A un costo de 132 millones de pesos bolivianos, se construyó un hospital en la localidad de Ayacucho-Porongo, Provincia Andrés Báñez del departamento de Santa Cruz. La obra ha sido realizada con el aporte de la comunidad, consistente en materiales de construcción como ser: piedra, arena, ladrillos y mano de obra calificada y no calificada, que en su totalidad significa el 30 por ciento del costo de la obra concluida.

Además el Gobierno participó mediante el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad con el crédito USAID/Bolivia, Proyecto 062. Se entregó materiales como cemento, fierro, carpintería de madera, tejas planas, instalación eléctrica, sanitarios, plomería, pintura y el equipamiento básico de la obra, así como la promoción, capacitación y asistencia técnica durante el desarrollo de la misma.

El proyecto data de fecha 23 de abril de 1979, habiéndose recibido un primer desembolso en diciembre de 1983 para la iniciación de la obra. En noviembre de 1984, USAID/Bolivia, dentro del mismo proyecto, realizó un segundo desembolso y a la fecha la obra ha sido concluida bajo el sistema de au-

to-ayuda que impulsó el Desarrollo de la Comunidad con un total de 1.123 jornales, permitiendo beneficiar a un total de 864 familias que habitan la región.

A tiempo de inaugurar el micro hospital, se destacó las gestiones realizadas por Remberto Jordán Roca, alcalde de la localidad de Porongo, para lograr el aporte de CORDECRUZ y de la Unidad Sanitaria Cruceña, organismo éste que asignó los ítems de un médico y una enfermera.

El moderno hospital inaugurado el 27 de enero, ha sido equipado con donaciones de catres, colchones y medicamentos. También los jóvenes de la región lograron de la Unidad Sanitaria un vehículo en desuso que, después de haber sido reconstruido servirá como ambulancia.

Las autoridades locales destacaron que la obra ha sido concluida con el esfuerzo de las comunidades de Ayacucho Porongo y con el apoyo solidario del personal técnico y administrativo de la oficina departamental de Santa Cruz del Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades, la misma que fue declarada en emergencia de trabajo por el Director Nacional del Servicio, Ing. Gonzalo Escóbar Mendoza, hasta la conclusión del proyecto.

## Construcción de puente beneficia a los colonizadores del Alto Beni

Tres mil seiscientas familias que desarrollan sus actividades de colonización en la zona de Alto Beni, fueron

beneficiadas con el aprovechamiento de mayores tierras que se incorporaron a la economía productiva nacional, mediante la construcción del puente que une las provincias de La Paz y Nor Yungas, obra financiada por USAID - Bolivia y coordinada por el Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades.

La apertura de ese puente ubicado a cuarenta kilómetros de Caranavi hacia el Alto Beni, dio motivo a una concentración de pobladores de catorce centros de colonización. Subsecretario de Asuntos Agropecuarios, Lic. Raúl Vega Rodríguez, Director Asociado de USAID - Bolivia, Sr. Robert V. Thurston, Director General de Desarrollo de la Comunidad, Ing. Gonzalo Escobar y Alcalde de Caranavi, realizándose breve ceremonia en la localidad de Santo Domingo, próxima a la obra entregada.


El puente es de hormigón armado con longitud de 18.30 metros de luz libre, por cuatro metros de ancho y una capacidad para resistir 32 toneladas métricas. El ingeniero Juan Méndez, jefe zonal del SNDC en Caranavi, subrayó en el acto que esa obra determinará la incorporación de tierras nuevas y potencialmente productivas.

Indico que la obra se complementara con la construcción de nuevos caminos de penetración hacia diferentes zonas donde habitan los colonizadores y que están impedidos de trasladar sus productos hacia los centros de consumo.

Dijo que en la edificación del puente participaron los constructores civiles, Raúl Quiroz Alcócer, como proyectista; Guido Miranda, Roberto Osina, Ing. Freddy Torrico, el promotor Francisco García, quienes junto a los pobladores del campo dieron feliz muestra de tesón y perseverancia.

El ingeniero Escobar Mendoza, Director del SNDC, dijo que ese organismo trabaja en todos los confines del territorio nacional para agrandar la fortaleza y soberanía del país. Por su parte, el Director de USAID - Bolivia, Sr. Thurston, reflexionó a los presentes haciéndoles constar que la buena voluntad y la mutua cooperación entre la nación del norte y los bolivianos que de veras trabajan y producen, permiten alcanzar materialización de obras como el citado puente.

Finalmente, el Subsecretario Vega Rodríguez puntualizó que la política gubernamental de apoyo a los programas de desarrollo dan lugar a la consolidación de la vigencia democrática en el país.

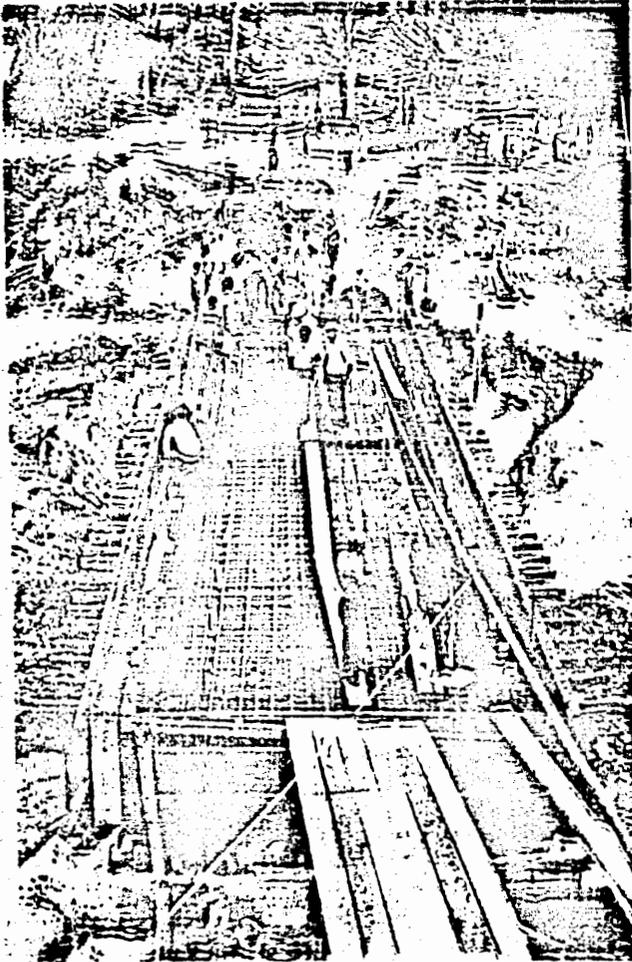

BEST AVAILABLE COPY

## 3.600 agricultores llevarán sus productos a mercados de consumo

Un contingente de 3.600 familias de agricultores, pertenecientes a 14 centros de colonización y nuevas tierras agrícolas se incorporan a la economía nacional, con la inauguración del puente "Pastor Tarqui" que une las provincias Nor Yungas y Larecaja de La Paz. Informó el Servicio de Desarrollo de la Comunidad.

El puente, ubicado a 40 Kms. de Caranavi, hacia Alto Beni, motivó la concentración de miles de campesinos para recibir a una delegación oficial presidida por el Lic. Raúl Vega Rodríguez, subsecretario de Asuntos Agropecuarios, el Director Asociado de USAID/B Robert V. Thurston, el Director de Desarrollo de la Comunidad, Ing. Gonzalo Escobar y otras autoridades.

Juan Méndez, jefe zonal del SNDC en Caranavi, informó durante el acto de entrega del puente que en la construcción de esta obra participaron 312 campesinos, colonizadores y voluntarios de los ingenios arroceros, pertenecientes a las colonias Flor Huaycho, Santiago, Villa Concepción, Santa Elena, Santiago 2da. Zona, Santa Bárbara y Alto San José.

El puente fijo de hormigón armado tiene una longitud de 18,30 metros y un ancho de 4 metros, con capacidad para 32 toneladas. Los campesinos aportaron mano de obra, herramientas y materiales.


Durante el acto realizado en la localidad de Santo Domingo, el Presidente del Comité Pro-Construcción dijo que era encomiable el sacrificio de los

campesinos, que aportaron recursos propios, para el traslado de materiales, esfuerzo que permitió concluir la obra en cinco meses.

Escobar rindió homenaje con un minuto de silencio, al trabajador fallecido en esta construcción, Pastor Tarqui. Indicó que las huelgas y bloqueos no solucionan los problemas que agobian a la patria y que, por el contrario, el personal de Desarrollo de la Comunidad "está dando mues-

tras de fortalecer nuestra economía con el trabajo creador".

El Director Asociado de USAID/B Robert Thurston, afirmó que esta emocionante inauguración "invitaba a reflexionar, como un esfuerzo mancomunado, permitía concretar una obra, que tendrá gran influencia económica en la zona". Dijo que sentía felicidad porque el pueblo norteamericano contribuyera a financiar el puente.

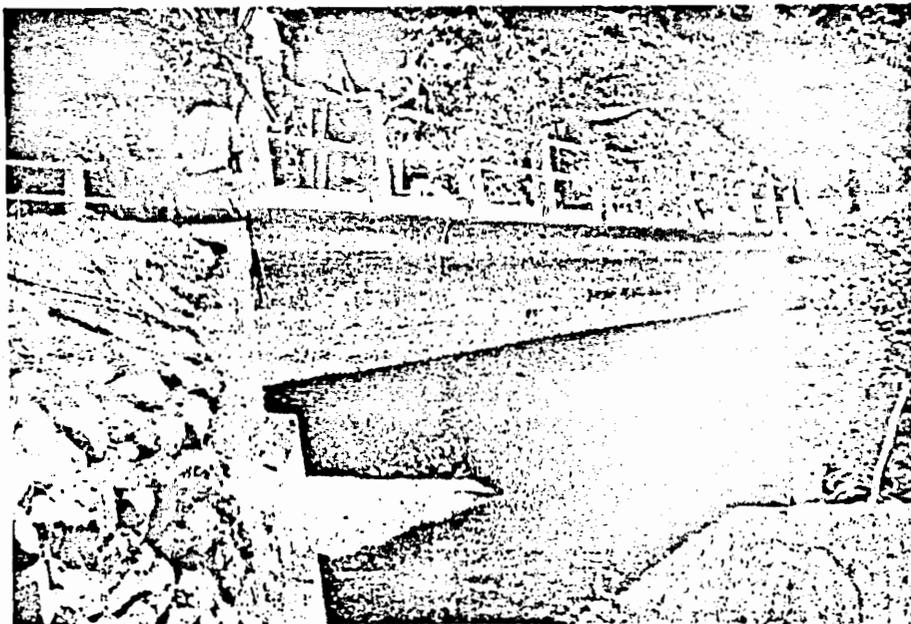

**PUENTE INAUGURADO.**- En el cantón Santo Domingo, de la Provincia Larecaja, se inauguró el puente "Pastor Tarqui" que une a dos provincias. Esta obra, permite la incorporación de nuevas tierras agrícolas y el incremento de productos de la zona a los mercados de consumo.

BEST AVAILABLE COPY

PRESENCIA : Viérnes, 29 de Marzo de 1985

## Desarrollo de la Comunidad entregará 34 obras sociales

En el curso de los próximos días, el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad entregará 34 obras sociales construidas en varios distritos.

El Ing. Gonzalo Escobar Mendoza, director ejecutivo del SNDC, informó que estos trabajos fueron financiados por USAID/B con un aporte aproximado de 500 mil dólares, mientras que los campesinos de las comunidades beneficiadas aportaron mano de obra, materiales existentes en la jurisdicción y herramientas.

Indicó que estas obras serán inauguradas por el

ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Lic. Guillermo Moscoso Riveros, en cuya gestión se dinamizaron los desembolsos para concluir los trabajos planificados al comienzo de la presente gestión.

En La Paz, en la zona de Coroico se entregará un sistema de agua potable; en Chulumani, en las comunidades de Sikiljara y Naranjani sistemas de agua potable; en Tiahuanacu, comunidad de Antaquira-Belén, una escuela con cuatro aulas. En Achacachi, un colegio secundario. En Taraco, un puesto médico.

En la zona de Caranavi en las comunidades de Unión Camacho y Aguas Turbias, un edificio escolar para cada comunidad; en las comunidades de Trinidad Pampa y Chacón un puente fijo y un sistema de agua potable; en la comunidad La Reserva, una escuela con seis aulas y en la de El Progreso un centro de acopio de café. En la comunidad de Ocobaya, un puesto médico y en La Calzada, una escuela de cinco aulas.

Para el Departamento de Santa Cruz, Desarrollo de Comunidades inaugurará en la comunidad de Estación Basillo una escuela con cuatro aulas, en Villa San Antonio una escuela con 6 aulas y en la zona Forestal una escuela técnica. En la región de Camiri, en la comunidad de Estación Charagua, una escuela de 6 aulas y en Curaguaca una escuela de cinco aulas.

En Oruro, se han construido exclusivamente escuelas en las comunidades de Acacio, con dos aulas; Taracari con tres aulas; Limaya con una aula, Belén con tres

aulas. En la zona de Challapata, un puesto médico al igual que en la comunidad de Ancacato.

En el Departamento de Cochabamba el SNDC inaugurará en la comunidad de Suipacha un puente alcantarilla; en Nueva Canaan, una escuela de tres aulas y en Linde, un puente fijo, al igual que en la comunidad de Ibuelo.

En Sucre, en la comunidad de Thaco Pampa, una escuela de seis aulas; en Potosí en la comunidad Turuchipa, un hospital, en Pancochi un puesto médico y en Tambaililla, una escuela con dos aulas.

PRESENCIA : Domingo, 7 de Abril de 1985

## Desarrollo de Comunidades entregará sistema de agua potable en Yungas

El Servicio de Desarrollo de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, inaugurará un sistema de captación de agua potable en la población de Sikitjara, provincia Sud Yungas de La Paz.

La obra fue ejecutada en forma conjunta, entre esa entidad y la población de Sikitjara, con aportes proporcionados por USAID, dentro del préstamo otorgado a Bolivia en el programa "511-T-062".

La obra será inaugurada por el titular de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Guillermo Moscoso Riveros, y el director nacional del Servicio de Desarrollo de la Comunidad, Gonzalo Escobar.

Se informó que esa entidad tiene programadas varias inauguraciones de obras similares en varias poblaciones del departamento de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija.

Las obras fueron construidas por el sistema de autoayuda, con la participación de campesinos de las comunidades que se beneficiaron con los proyectos comunitarios.

### OTRAS OBRAS

La información oficial del Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad señala que en la zona de Corolco se entregará un sistema de captación de agua potable, en las localidades de Incapampa y Trinidad Pampa. En esta localidad también se entregará un pequeño puente fijo.

Otro sistema de agua potable se inaugurará en la población de Naranjani, proximidades de Chulumani.

Dos puestos médicos serán entregados en las poblaciones de Ocobaya y en la Calzada.

En Tihuanaco, será

inaugurada una escuela rural y en la población de Tarjico, próxima a dicha población, un puesto médico.

En la zona de Caranavi, en las poblaciones de Unión Camacho y Aguas Turbulentas, se entregarán dos escuelas y viviendas para maestros. Asimismo, en la localidad de Reserva, también se entregará una escuela para 180 alumnos.

En la localidad de El

Progreso, también próxima a la zona de Caranavi, se entregará un centro de acopio de café en grano.

Finalmente, en la provincia Omasuyos, en la localidad de Achacachi, se entregarán las instalaciones de un colegio secundario construido por los comunarios del lugar y el Servicio de Desarrollo Rural, en su integridad, sin ningún otro aporte externo.

BEST AVAILABLE COPY

PRESENCIA : Lunes, 8 de Abril de 1985

*En varios departamentos*

## Desarrollo de comunidades entregará 35 obras rurales

El Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, entregará 35 obras rurales en varias comunidades campesinas de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Tarija.

Entre las obras, se encuentran sistemas de captación de agua potable, puestos médicos, de salud, obras comunales, pequeños puentes y escuelas. Como parte de este programa de entregas, recientemente se inauguraron sistemas de agua potable en los Yungas.

Según la Información del Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, la semana pasada se entregaron varias obras en los Yungas. Se explicó que en las poblaciones de Incapampa, Sikiljara y Naranjani, se inauguraron tres sistemas de agua potable.

La información indica que la ejecución de tales obras fue posible con el sistema de autoayuda, en las que se contó con la participación de las comunidades campesinas.

Los trabajos fueron planificados y proyectados en el Servicio de Desarrollo de la Comunidad. El costo de los materiales fue financiado con un préstamo otorgado al país por USAID y donaciones de alimentos.

### DEPARTAMENTOS

El informe afirma que en el departamento de Santa Cruz se entregará, en los próximos días, una escuela con capacidad para 120 alumnos, en la población denominada Estación Basilio.

En la localidad de Villa San Antonio, se entregará una escuela para 180 alumnos. Otra escuela será inaugurada en la localidad Forestal; en Estación Charagua, en las proximidades de Camiri y en Curuguaca, se inaugurarán dos escuelas.

La información agrega que también se entregarán obras en el departamento de Oruro. En la localidad de Acacio, próxima a Uncía, se inaugurarán una escuela para sesenta alumnos.

En Toracari, se ha previsto inaugurar otra escuela con capacidad para noventa alumnos. En las poblaciones rurales orureñas de Limaya, Belén, Piqui, Challapata y Ancacato, se entregarán puestos médicos de emergencia.

En el departamento de Cochabamba, en la población de Linde, se inaugurará un pequeño puente fijo; en Sui-pacha, un puente de alcantarilla y otro puente fijo en la población de Ibuelo. En la denominada población de Nueva Canaan, se entregará una escuela para noventa alumnos.

En las poblaciones potosinas de Turuchipa, Panchochi y Tambalilla se entregarán un hospital, un puesto médico y una escuela, respectivamente. En la población de Canasmoro, departamento de Tarija, se entregará una escuela y un puente pasarela, en la población de Ancón Grande.

En el departamento de Chuquisaca, en la localidad de Thaco Pampa se entregará una escuela con capacidad para 180 alumnos, dice el informe de Desarrollo de Comunidades.

PRESENCIA : Lunes, 15 de Abril de 1985

## Inauguraron sistemas de agua potable en Nor y Sud Yungas

En las poblaciones de Incapampa, provincia Nor Yungas y Sikiljara de Sud Yungas, se inauguraron los sistemas de agua potable, construidos por Desarrollo de la Comunidad.

En el cantón de Incapampa, a 15 kms. de Coroico, el sistema se financió con recursos de USAID/B, asistencia técnica de Desarrollo de la Comunidad; mano de obra de los campesinos del lugar y los materiales existentes en la zona. El proyecto fue concretado luego de ocho años de gestiones de los campesinos de esa comunidad. El sistema cuenta con un tanque colector otro de almacenamiento y un tendido de 283 metros de tubería a base de hormigón ciclópeo, con capacidad de 15.500 litros. Los excedentes de agua

serán utilizados por los campesinos para reactivar la producción agrícola mediante sistemas de microirrigación durante la época seca.

El acto realizado en Incapampa contó con la presencia del ministro de A.A.C.C. y Agropecuarios Guillermo Moscoso quien, a tiempo de inaugurar el sistema, expresó la satisfacción del gobierno por haber cumplido con una promesa formulada a los comunarios de esa zona, en la presente gestión. Dijo que este sistema también permitirá mejorar las condiciones de salud de los pobladores del área rural, por cuanto antes hacían uso de aguas insalubres y contaminadas. Destacó la cooperación que prestaron tanto Desarrollo de la Comunidad como USAID/B.


El Director del SNDC., Ing. Gonzalo Escóbar, afirmó que el sistema beneficiará a 100 personas. Añadió que los técnicos de Desarrollo trabajaron "con hondo sentimiento bolivianista en el afán de favorecer a poblaciones marginadas del área rural".

También se escucharon los informes de Joaquín Lozano Vargas, supervisor zonal de Coroico, y de Francisco Cocarico, Presidente del Comité Pro-Construcción, quienes en palabras sentidas agradecieron la concreción de "un anhelo largamente acariciado por los campesinos de Incapampa".

### EN SIKILJARA

En el cantón Sikiljara de la provincia Sud Yungas de La Paz a 30 Kms. de Irupana, el titular del MACA inauguró otro sistema de agua potable. Pronunciaron discursos el jefe zonal de Chulumani René Alvizuri, el Presidente del Comité de Construcción Marcelo Paca, el Ing. Escóbar Méndez, el representante de USAID y el ministro.

El sistema beneficiará a 212 personas con una capacidad de 17.500 litros. Cada una de las familias tendrá una dotación de 100 litros de agua. La obra cuenta con un tanque de almacenamiento de hormigón ciclópeo.




**AGUA POTABLE PARA LOS YUNGAS.**- Dos poblaciones, de Nor y Sud Yungas, se beneficiaron con la instalación de servicios de agua potable, gracias a los programas del Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad que incentiva la participación comunitaria y apoya este tipo de proyectos con asistencia técnica y materiales. Las poblaciones beneficiadas son Incapampa y Sikiljara.

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

BEST AVAILABLE COPY

PRESENCIA : Martes, 23 de Abril de 1985

## Fue inaugurado un colegio en la localidad de Antaquira

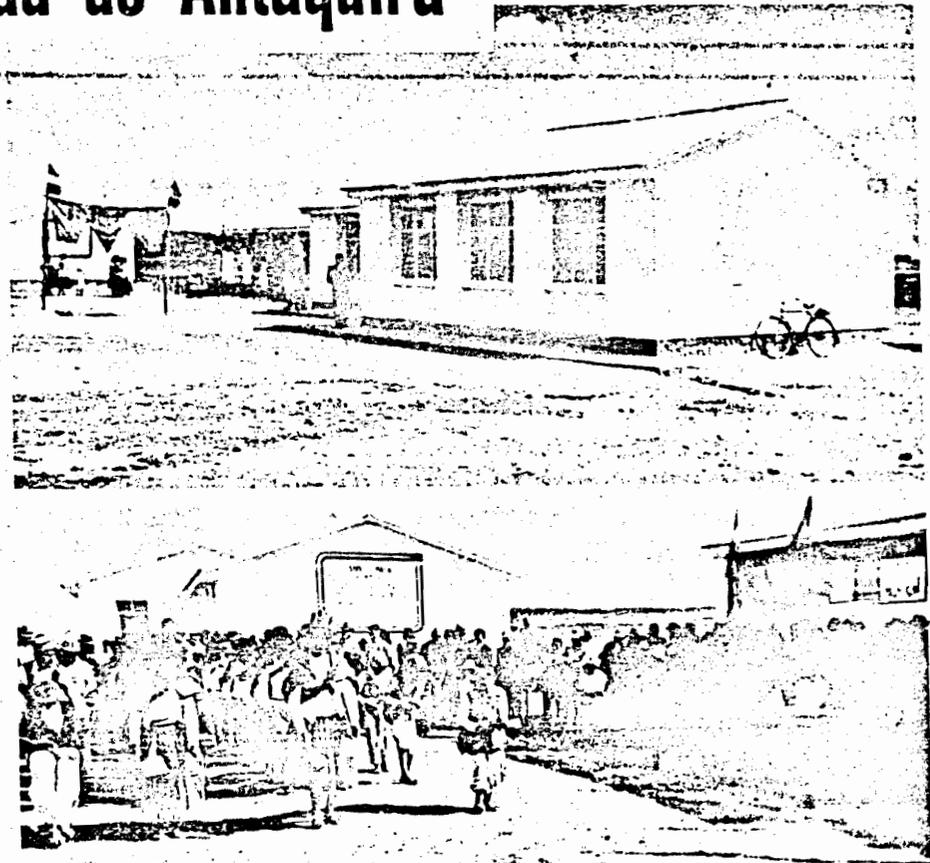

BEST AVAILABLE COPY

En la localidad de Antaquira, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, se inauguró un "complejo estudiantil" para el funcionamiento del colegio secundario de esa localidad.

Esta unidad educativa fue construida por el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con la asistencia económica de USAID/B, en base al préstamo 511-T-062).

La construcción estuvo dirigida por el Arq. Julio Carrasco y contó con la cooperación de los padres de familia de las comunidades de Kallirpa, Wancko y Milluni, quienes aportaron mano de obra, entregaron arena y piedra y facilitaron el trans-

porte, lo que significó un aporte comunal de un 40 por ciento en el costo total. El 60 por ciento restante correspondió a la participación del gobierno a través del SNDC, lo que significó una inversión total de alrededor de 3 mil 400 millones de pesos bolivianos.

Al acto Inaugural asistieron el Subsecretario de Asuntos Campesinos, Martín Quispe Mamaní; el Ing. Walter Fiorillo, representante de USAID/Bolivia; el Arq. Gonzalo García, coordinador general entre USAID y el SNDC; Simeón Vilca, Director Nacional de Educación Rural Media, autoridades locales, padres de familia y 120 alumnos del establecimiento.



El Director del Núcleo

Escolar Antaquira-Belén, Prof. Pedro Condori, afirmó que en la presente gestión 35 estudiantes campesinos compondrán la primera promoción de bachilleres en humanidades.

El Coordinador entre USAID/BOLIVIA y el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, dijo que esta obra constituía una de las más importantes dentro el programa del SNDC.

El Subsecretario de Asuntos Campesinos, Martín Quispe Mamaní, agradeció a los técnicos del SNDC, a la asistencia económica de USAID/BOLIVIA y dijo que la entrega de esta obra constituye un ejemplo para otras comunidades rurales.

EL DIARIO : JUEVES, 24 de Abril de 1985

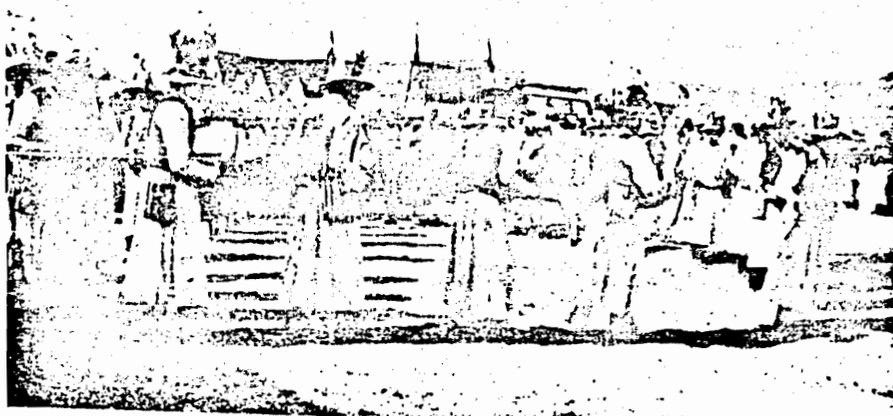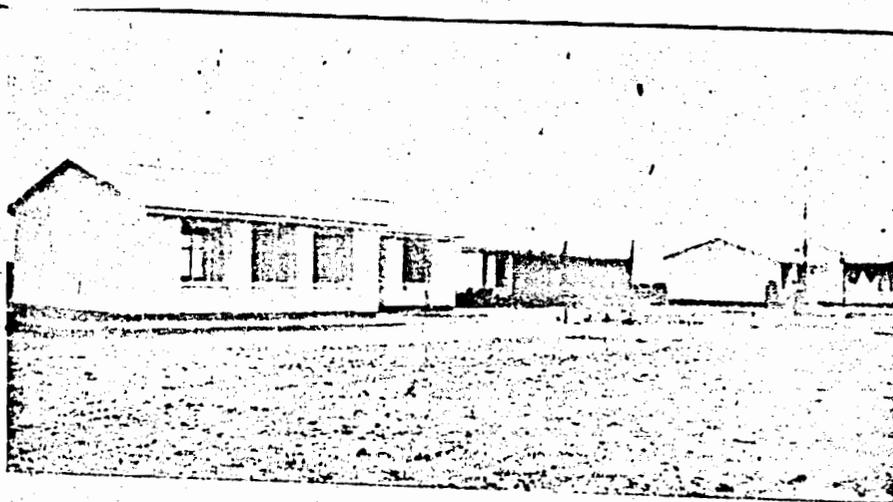


Moderno establecimiento educativo. La población de Antaquira en la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, estuvo de fiesta este último fin de semana, cuando Desarrollo de Comunidades inauguró un moderno Complejo educativo (foto superior). Abajo se aprecia a un grupo de estudiantes de ambos sexos, ofreciendo una danza autóctona a los visitantes como una muestra de alegría por su nuevo establecimiento.

BEST AVAILABLE COPY

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

EL DIARIO : Jueves, 9 de Mayo de 1985

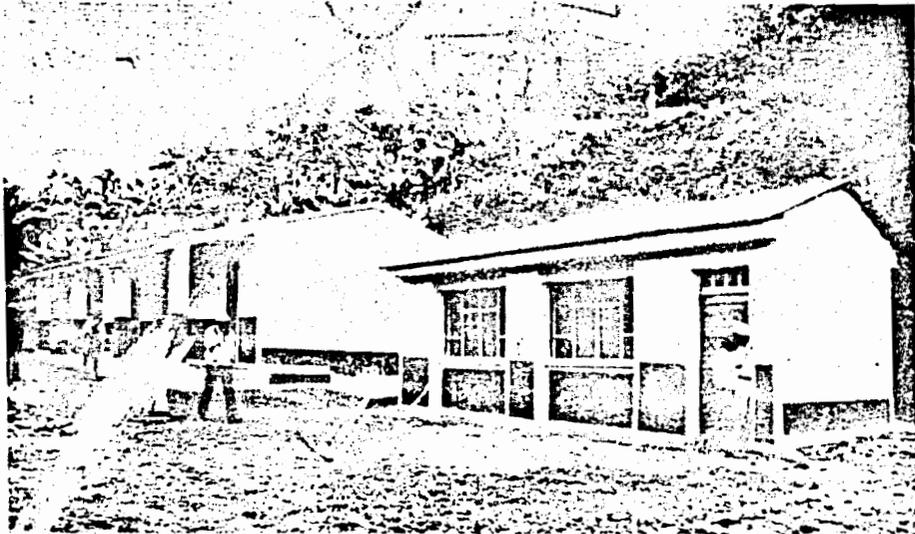

**CENTRO DE ACOPIO.** - En el Cantón Uyunense, Provincia Nor Yungas de La Paz, el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, inauguró el primer Centro de Acopio de Café. En la composición gráfica, arriba, parte de las instalaciones; abajo, la escuela, inaugurada en la localidad de Aguas Turbias.



El Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, cumpliendo con sus diferentes proyectos de desarrollo, en el curso de los últimos días ha hecho entrega de un moderno puente y un sistema de captación de agua potable en la localidad de Trinidad Pampa, Provincia Nor — Yungas del Departamento de La Paz.

OFICINA DE COORDINACION PROYECTO 062 -USAID/BOLIVIA

BEST AVAILABLE COPY

PRESENCIA : Jueves, 23 de Mayo de 1985

# En Nor Yungas, se inauguró Centro de Acopio de Café

*Desarrollo de Comunidades entregó un centro médico y tres núcleos escolares*

El pasado lunes, comenzó a funcionar el primer Centro de Acopio de Café de la Cooperativa "Dos Pinos", en el cantón Uyunense, provincia Nor Yungas de La Paz, obra que se ejerció bajo la dirección del Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, con un crédito concedido por USAID/Bolivia.

Fermin Villalobos, presidente del comité de la obra, manifestó: "Hemos logrado la conclusión de esta importante obra, ante la necesidad de eliminar del medio a todos aquellos inescrupulosos, los intermediarios, que doblan los precios de nuestros productos en los mercados de consumo".

Agregó: "Los productores y los que verdaderamente trabajan en el tratamiento del grano estaban a punto de convertirse en esclavos de los comerciantes que, en la mayoría de las veces, imponían sus propios precios". Afirmó que con el funcionamiento de este centro, los productores llevarán sus mercancías hasta los consumidores.

El Ing. Juan Méndez, en representación del director del Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, felicitó a los colonizadores participantes en la obra, por el esfuerzo desplegado. Expresó: "Personalmente, he visto las dificultades que se han tenido que sortear para el traslado de materiales, hasta la conclusión de la obra".

Por su parte, en representación de USAID/Bolivia, el Lic. Jaime Cusicanqui manifestó que la institución de crédito que representa sentía satisfacción por los préstamos entregados para este tipo de obras y que se hayan aprovechados al máximo. Añadió

que USAID/Bolivia tiene otros proyectos de crédito destinados a obras de desarrollo en el sector de la agricultura y que observando los hechos, se dará mayor ayuda a estos planes.

## **CENTRO MEDICO**

En la localidad de Ocobaya, provincia Sud Yungas, el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, inauguró un Centro Médico, compuesto de un consultorio de curaciones, sala de espera, consultorio dental, baño y cocina; obra que beneficiará a 80 familias.


## **CENTROS EDUCATIVOS**

El Servicio Nacional de

Desarrollo de la Comunidad, inauguró en las localidades de Unión Camacho y Aguas Turbias, en la provincia Nor Yungas, establecimientos educativos con capacidad para treinta alumnos y vivienda para maestros.

En la localidad de La Calzada se inauguró un colegio con capacidad para 150 alumnos y una oficina para la dirección. Este establecimiento dispone de cinco aulas.

Estas obras contaron con la participación de los campesinos, en estrecha cooperación y dirección técnica del SNDC, así como la asistencia económica de USAID/Bolivia, dentro del marco del préstamo 511-T-062.

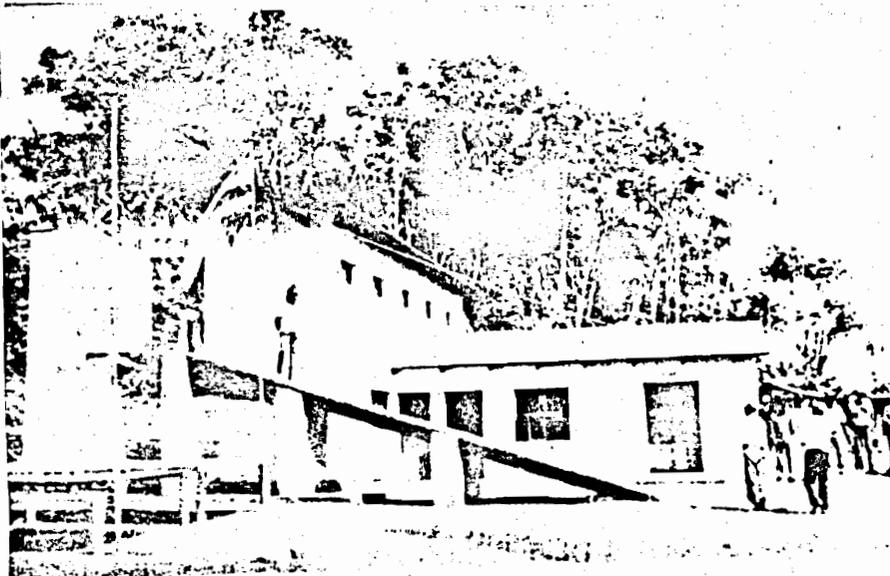

BEST AVAILABLE COPY
