


## VERIFICACION DE METAS Y ACTIVIDADES PDA 2003

Valle Tocache  
Valle Tingo Maria  
valle Aguaytia  
Valle Rio Apurimac

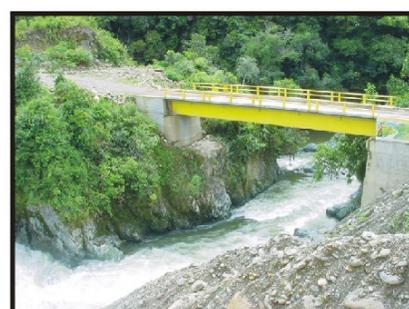

# Resumen Ejecutivo

# **RESUMEN EJECUTIVO**

## **RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE METAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO PARTICIPATIVO (PDAP) – 2003**

**CONVENIO: DEVIDA – USAID**

**Junio - 2004**

## **EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO, PROCESAMIENTO Y ANALISIS**

### **Oficina de Monitoreo y Evaluación**

José Chuquipul Ruiz

### **Equipo de Monitoreo – Lima**

- Jorge Del Pozo Ego-Aguirre
- Mónica Bellido Pebes
- Roger Acosta Valdivia

### **Área de Monitoreo, Huallaga Central – Tarapoto:**

- Fidel Tuesta López
- Renato Rojas López
- Víctor Anteparra Reategui

### **Área de Monitoreo, Alto Huallaga, Aguaytia – Tingo María**

- Víctor Gutierrez Tinoco
- Vilma Flores Ramírez
- Magaly Hidalgo Rengifo
- Félix Quispe Bendezú
- Omar Peña Ramírez

### **Área de Monitoreo, Valle Río Apurímac – Ayacucho**

- Evelyn Quintanilla Arce
- Hugo Cosco Ashtu

## **PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO PARTICIPATIVO**

### **Verificación de Metas y Actividades PDAP 2003**

#### **Resumen Ejecutivo**

**Los resultados que se muestran a continuación, han sido obtenidos en base a una muestra representativa de beneficiarios de proyectos productivos.**

#### **Socialización y Comunicaciones**

Los indicadores referidos a la participación en las actividades de socialización, muestran la existencia de un alto nivel (94%) de respuestas favorables de parte de los beneficiarios de proyectos productivos.

#### **Proyectos Productivos**

Los proyectos productivos desarrollados consideran la asistencia en actividades agropecuarias según la vocación de cada zona. Asimismo, involucran el apoyo en la comercialización y la identificación de mercados.

Al identificar las actividades y cultivos más importantes en cada zona, estos proyectos se orientan a generar ingresos a mediano plazo con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del Programa de Autoerradicación.

#### **Conclusiones:**

##### **Cultivos Permanentes**

- El 90% de los beneficiarios indica haber participado en la selección y priorización de los proyectos productivos en su comunidad.
- Los principales cultivos permanentes priorizados fueron cacao y café, los cuales corresponden a la vocación productiva de los beneficiarios.
- Menos del 50% de los beneficiarios de cacao y café, declaró haber participado en la selección del donatario y de la Empresa de Asistencia Técnica; sin embargo, más del 70% afirmaron estar conformes con esta asistencia y haber aplicado los conocimientos recibidos.

- En cuanto a instalaciones de café y cacao, el PDAP ha iniciado con retraso la instalación de los viveros de estos cultivos, razón por la cual, la instalación de plántones en campo definitivo se realizará en época de estiaje (meses de mayo a julio), lo que probablemente afectará el logro de las metas programadas.
- Más del 50% de los beneficiarios declaró haber recibido capacitación específica en prácticas culturales de mantenimiento, sin embargo, sus efectos aún no se aprecian, ya que, de acuerdo a la verificación, la productividad del cacao es menor a 800 Kg/Ha y en el caso del café, no supera los 12 qq/Ha.
- Menos del 25% de los beneficiarios declara haber recibido apoyo del PRA en la comercialización de sus productos.
- La intervención del PDAP en la asistencia técnica y económica de estos cultivos es temporal, dura los 6 meses de vigencia del Convenio Marco.
- La mayor inversión del PDAP se ha programado en cultivos permanentes y estuvo orientada a la instalación de viveros, producción de plántones, número de jornales, suministro de insumos, capacitación, etc.

### **Cultivos Anuales**


- Mas del 60% de los beneficiarios declara haber recibido apoyo del PDAP en la instalación de cultivos anuales, principalmente en maíz, maní, piña y plátano.
- Los rendimientos obtenidos con asistencia del PDAP son similares a los promedios registrados en los valles donde se ejecuta el Programa de Autoerradicación.
- El 50% de los beneficiarios de piña, reconoció a la empresa comercializadora propuesta en el Plan de Negocios.
- La contribución al ingreso proveniente de actividades lícitas de la producción de una campaña de maíz ha sido, en promedio, de S/. 50.00 mensuales en los últimos 6 meses; el maní, por su parte, ha significado una contribución de S/. 400.00.
- El PDAP ha programado menores montos de inversión para la asistencia de cultivos anuales; sin embargo, ha logrado mayor eficiencia en comparación con los cultivos permanentes.

## Obras de Infraestructura Social Básica y Económica

Estas actividades se orientaron a la construcción de aulas, postas, sistemas de agua potable y desagüe; asimismo, a la rehabilitación y mantenimiento de carreteras y caminos vecinales, construcción de puentes, obras de irrigación y electrificación. Las obras mencionadas se llevaron a cabo con la finalidad de apoyar la expansión de la producción lícita, mejorar la articulación al mercado, mejorar el acceso de la población a los servicios básicos y generar ingresos temporales para la población a través de jornales.

### Conclusiones:

1. Con relación a la verificación del cumplimiento de los requisitos técnico administrativos exigidos en la ejecución de obras de infraestructura, los resultados de la verificación muestran que el PDAP viene cumpliendo con ellos, en el marco de la Ley de Inversión Pública y las normas y especificaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Construcciones. Los resultados de cada indicador se muestran en el siguiente gráfico:

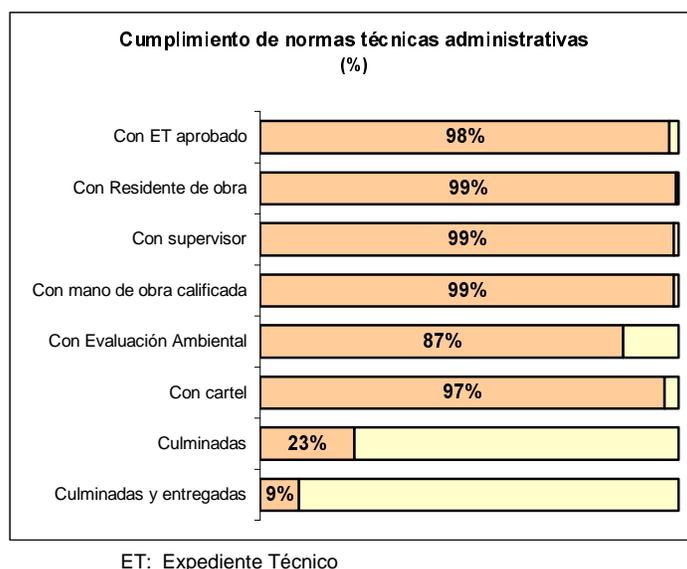

Estos resultados demuestran que:


- a. El Programa ha logrado que los sectores públicos involucrados participen en el proceso de ejecución, desde la aprobación del expediente técnico hasta la recepción de las obras culminadas y liquidadas, de acuerdo a normas y a compromisos asumidos, para la operación y equipamiento de los servicios generados.
- b. Los resultados relacionados con la Dirección Técnica y Supervisión de las obras, indican que las obras se han ejecutado conforme a planos y especificaciones aprobadas en los expedientes técnicos.

- c. El 87% de las obras cuentan con estudios de impacto ambiental.
- d. El 97% de las obras cuentan con cartel de obra.
- e. De las 182 obras de infraestructura verificadas, 41 de ellas se encuentran culminadas (22.5%) y de éstas, 17 han sido liquidadas y entregadas a los sectores correspondientes.


2. Respecto al avance físico por tipo de obra:

Se han verificado 171 obras.


Al momento de la verificación, el avance físico de las obras de infraestructura económica fue de 63.5%, en promedio; y de 76.2%, en promedio, en el caso de las obras de infraestructura social básica. (Gráfico).

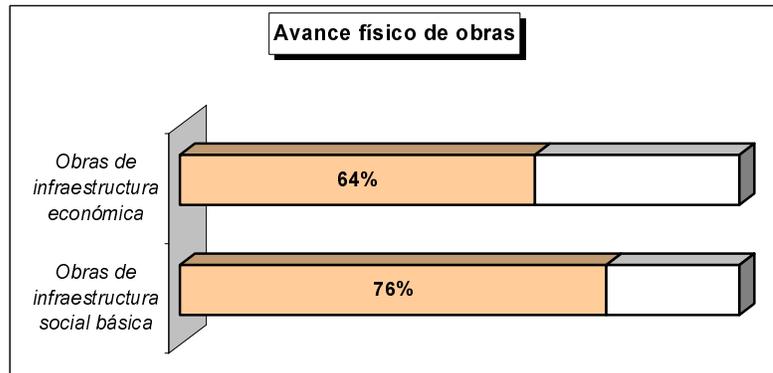

De acuerdo a los resultados obtenidos en la verificación, de las 41 obras culminadas, 17 han sido entregadas al sector correspondiente y se encuentran en operación.

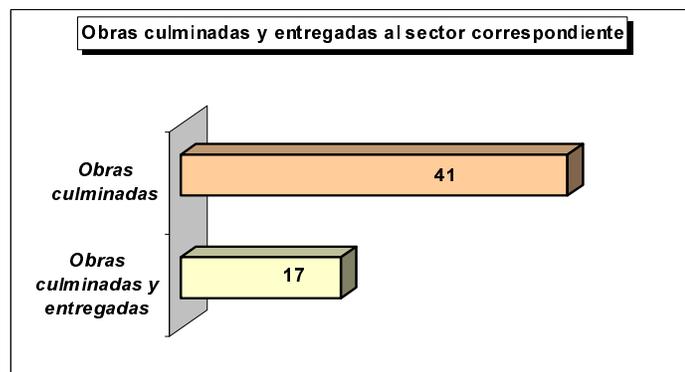

3. Con respecto a la participación de la población beneficiaria en los procesos y ejecución de las obras:

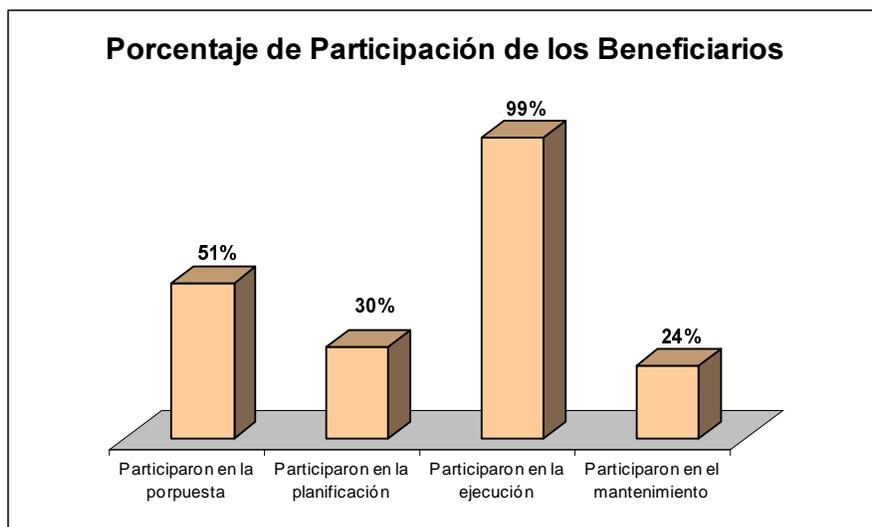

Los resultados de la verificación demuestran la existencia de un alto porcentaje de participación de la comunidad en la ejecución de las obras (99%). Es menor la participación en la propuesta (51%) y planificación (30%).

La remuneración de la mano de obra no especializada, puede haber influido en la participación de la comunidad en la ejecución de las obras.

En cuanto a la participación de la comunidad en el mantenimiento de las obras, se observa que de las 41 obras concluidas, el 100% de las comunidades beneficiarias, participa en su mantenimiento, aún cuando sólo 17 de ellas fueron entregadas a los sectores correspondientes.

Las obras agrupadas y distribuidas, según categorías, se muestran en el siguiente cuadro:

Categoría	Tipo de Obra	N° de obras	
Edificaciones	Aulas	53	
	Postas	3	
	Local de uso múltiple	59	
	Total	115	57%
Saneamiento	Pozo artesiano	1	
	Sistema de agua potable	24	
	Sistema de alcantarillado	1	
	Total	26	13%
Caminos y puentes	Mantenimiento de caminos	1	
	Rehabilitación de caminos	19	

	Puentes y pontones	14	
	Total	34	17%
Otros	Losa multiuso	19	
	Badenes	1	
	Mini central hidroeléctrica	6	
	Mejoramiento Plaza de Armas	1	
	Total	27	13%
Total General		202	100%

Considerando las categorías anteriormente señaladas, la distribución de aportes de mano de obra y materiales se muestra en el cuadro siguiente:

	% de obras	Distribución Porcentual del Presupuesto		
		MO. Calificada	MO no calificada	Materiales
Edificaciones	57%	20%	20%	60%
Saneamiento	13%	35%	35%	40%
Caminos y puentes	17%	20%	50%	30%
Otros	13%	-	-	-
