

DECEMBER 31, 2011

## **INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT FUND**

Quarterly Report to USAID/Bolivia  
Sustainable Development and Environment Office  
October - December 2011

**Award Nº: 511-A-00-05-00153-00**

Contact information:

Trenea Bishop  
Team Leader, ICDF

Calle 11 # 480  
Esq. Sánchez Bustamante  
Calacoto  
La Paz, Bolivia  
Tel/Fax: (+591) 2 – 2793206  
E-mail: [tbishop@acdivoca.org.bo](mailto:tbishop@acdivoca.org.bo)

### ***Disclaimer***

*This Quarterly Progress Report is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of ACDI/VOCA and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.*

## TABLE OF CONTENTS

I.	EXECUTIVE SUMMARY .....	- 5 -
II.	GENERAL INFORMATION .....	- 7 -
III.	HIGHLIGHTED ACTIVITIES.....	- 9 -
IV.	SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA .....	- 14 -
A.	ALTO BENI / PALOS BLANCOS.....	- 14 -
B.	LA ASUNTA .....	- 19 -
C.	TRADITIONAL ZONE.....	- 24 -
D.	CROSS-CUTTING ACTIVITIES.....	- 27 -
V.	PERFORMANCE INDICATOR RESULTS .....	- 28 -
A.	THE ICDF IN NUMBERS .....	- 28 -
B.	PERFORMANCE INDICATORS.....	- 32 -
VI.	LOOKING FORWARD .....	- 42 -
VII.	FINANCIAL INFORMATION.....	- 43 -
	<i>ANNEX I BUDGET PIPELINE REPORT .....</i>	- 45 -
	<i>ANNEX II SUCCESS STORY .....</i>	- 47 -
	<i>ANNEX III PROJECT MATRIX .....</i>	- 50 -

## ACROYNMS AND ABBREVIATIONS

CA	Cooperative Agreement
CAPYS	Potable Water and Sanitation Committee
CC	Cross Cutting Indicator
CCVV	<i>Caminos Vecinales</i>
CENCAP-CP	Controller General's Center for National Training Center
CT	Technical committee ( <i>Comité Técnico</i> in Spanish)
DRNMA	Department of Natural Resources and Environment
ICDF	Integrated Community Development Fund
IL	Implementation Letter
IR	Intermediate Result
JSI	John Snow International
LOP	Life of Project
M&E	Performance Monitoring and Evaluation
NBI	Unsatisfied Basic Needs Index (NBI in Spanish)
PMP	Performance Monitoring Plan
PSB	Plurinational State of Bolivia
RAI	Industrial Environmental Registry ( <i>Registro Ambiental Industrial</i> in Spanish)
RFRA	Request for Revised Application
SO	Strategic Objective
TC	Tropics of Cochabamba
UAC-CP	University of Carmen Pampa
UCB	Catholic University of Bolivia
USAID	United States Agency for International Development
USG	United States Government
VCDI	Vice Ministry for Coca and Integrated Development
YCADF	Yungas Community Alternative Development Fund

## I. EXECUTIVE SUMMARY

This report details key activities carried out by the ICDF during the first quarter of fiscal year 2012. By December 31<sup>st</sup>, the ICDF had a total of 688 subaward projects in its portfolio, 664 of which were concluded. Of the total number of projects, 387 fall under the community development component while the remaining 277 fall under the economic development component. Seventeen projects were completed during the reporting period, leaving 24 projects in implementation. All activities carried out during the quarter contributed to the ICDF's global objectives by stimulating progress in the areas of economic development, education, potable water and sanitation.

As discussed in the previous quarterly report, a reduction in available funds for USAID resulted in a decrease in the ICDF's 2012 fiscal year budget. This led to a curtailment in the scope of various ICDF subaward activities, as well as to an overall adjustment of the ICDF's operational structure. Accordingly, the ICDF proceeded with the closure of two field offices and the termination of approximately 50 percent of its remaining personnel in the October to December period. Despite these changes, implementation continued relatively unhindered throughout the quarter and the ICDF remains committed to implementing all of its ongoing activities at the same high standard of quality as always.

During the reporting period, important progress was made in projects that fall within the ICDF's potable water subcomponent. In addition to refurbishing the water intake of Coroico's potable water system, construction continued on several large potable water systems throughout the Yungas. Once concluded, these projects will provide the communities of San Jose, Los Olivos and 21 de Agosto in the Municipality of La Asunta and the communities of San Miguel de Huachi and Alto Remolinos in the municipality of Palos Blancos with constant access to potable water. Progress included the installation of water-storage tanks as well as pipes for distributing water to homes in the aforementioned communities.

Simultaneous to carrying out construction on high-impact potable water systems, the ICDF provided participant communities with training aimed at ensuring the long-term sustainability of these projects. Related activity included the formation and strengthening of Potable Water and Sanitation Committees (CAPYS in Spanish) for each system. The individuals elected to form part of the CAPYS were trained in potable water system administration, operation and maintenance. As part of its responsibilities, each CAPYS established user fees for administering potable water services.

The ICDF also provided training to target population groups in areas of community organization, appropriate use of natural resources and in the conservation of water sources through initiatives overseen by environmental committees. For example the ICDF's trainers carried out activities in the schools of participant communities. Such training had the purpose of raising awareness among school-age children with regard to the importance of water and its appropriate use, personal hygiene and solid-waste management.

Within its basic sanitation subcomponent, the ICDF continued work on the Siguani Grande sewer system located in the Municipality of La Asunta. The majority of the excavation for the installation of the system's pipelines and inspection chambers was completed. Also, the cement for the wastewater treatment tank was poured. This tank will form part of the state-of-the-art anaerobic wastewater treatment plant called for in

the system's design. The Siguani Grande sewer system will benefit 180 families that will access the service through household connections. Additionally, with the conclusion of the final design for the Cotapata sewer system, the "Design Fund for La Asunta" project was concluded. This design is useful for the municipal government as it can now be included in the municipality's annual operating plan, which is a governmental requirement to solicit funding.

The ICDF also made important progress on projects that fall within its education subcomponent. In the Municipality of La Asunta, construction continued on the twelve classrooms for the René Barrientos Ortuño School, resulting in a nearly finished product by the end of the quarter. Minor construction and installation of furniture will be completed in the next reporting period.

In the Municipality of Irupana, the construction of two multi-grade classrooms in the communities of Huirí Lanza and San José de Llojeta was concluded. The construction of the multi-grade classroom for the community of Churubamba, located in the same municipality, is scheduled to be completed during the following quarter. During the reporting period, work continued on the construction of 10 classrooms and school bathrooms for the San Antonio School in the Municipality of Alto Beni. Training for the appropriate use and maintenance of these infrastructures was also provided to teachers, students and to the general public.

Also within the ICDF's education subcomponent, on December 21<sup>st</sup>, two events were held to recognize the handover of furniture to schools in the five municipalities of the *Traditional Zone*. A total of over 4,000 items including chairs, tables and bookcases, among others, were distributed to schools in more than 100 communities in the municipalities of Coroico, Coripata, Chulumani, Yanacachi and Irupana. These projects were carried out in coordination with the corresponding municipal governments. Each municipal government provided a cash counterpart contribution of 20 percent of the total investment made in the schools within their jurisdiction.

During December, the "Improving Quality of Life Through the Kitchen" project was concluded in La Asunta, bringing the total number of fuel conserving stoves constructed and families trained in stove construction, nutrition and maintenance, within the municipality to 880. The ICDF is implementing a similar project in the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni, that constructed 180 stoves within the quarter, bringing the total number of stoves constructed in the Alto Beni region to 300 to date. These stoves not only consume far less firewood, but also have a chimney that removes all the smoke from the kitchen, thus improving the health conditions of the beneficiary families.

Of the 17 projects concluded during the reporting period, four fall under the economic development component. One project, which provides young people with microenterprise and extension training, stands out in particular for its potentially transformative impact on participants. This project involved providing 49 young adults from the Municipality of La Asunta with vocational training during six-week long courses at Infocal, a nationally accredited institution for technical and vocational training. The youth received training in automotive mechanics, electrical engineering, gastronomy or carpentry respectively. All students completed intensive coursework and received certificates in recognition of their newly acquired knowledge and skills.

## II. GENERAL INFORMATION

ACDI/VOCA is a private, non-profit international development organization with nearly 40 consecutive years of experience working in Bolivia, and almost 50 years implementing multifaceted development activities worldwide. Throughout this period, ACDI/VOCA has demonstrated its strong commitment to providing opportunities and improving the quality of life for the residents of the communities in which it works. Since the start of 2001, ACDI/VOCA has been a key partner of the Plurinational State of Bolivia (PSB) and USAID/Bolivia in their work to strengthen the capacities of communities, civil society organizations and municipal governments.

ACDI/VOCA has implemented the ICDF since August 2005, under which it currently manages 688 community and economic development subaward activities. The main goal of the ICDF is to support the joint efforts of the United States Government (USG) and PSB to establish a sustainable economy in Bolivia's coca-producing regions. The strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and economic conditions.

The objectives of the ICDF are to:


1. strengthen social capital and community development through increased access to public goods and services for communities and small-holder farmer organizations
2. increase participation of local leaders, local governments and citizen organizations in community development processes to strengthen ownership, sustainability and support for economic activities
3. improve the welfare of poor rural families in isolated areas while taking gender equality and the environment into consideration
4. support emergency and immediate-impact activities to mediate conflict, preserve social peace and respond to crises

ACDI/VOCA was awarded the ICDF program by USAID through cooperative agreement (CA) 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005. The original agreement stipulated that the project was to be implemented over a period of five years.

Modification No. 7 of the CA called for significant adjustments to be made to the ICDF methodology to more directly support the PSB's coca rationalization policies within the terms outlined by Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also called for a restructuring of the project to include only two components: economic and community development.

Also noteworthy, Modification No. 14 of the CA allocated new resources for immediate impact projects in the Yungas region as a means of addressing urgent needs within the economic and community development components. Subsequently, through Modification No. 15, additional funds were provided to further expand ICDF activity in the Yungas region. Modification No. 15 also called for the CA's extension through September 30, 2010. Through Modification No. 16, the CA was amended to include funds to support new and existing activities and to further extend the life of project (LOP) through December 31, 2010. Via Modification No. 17, the CA was extended once again, this time through September 30, 2012 and additional funds were designated to support new activities designed to help the ICDF achieve its overall objectives. In accordance with Modification No. 18, ACDIVOCA transferred its productive activities

to the USAID-funded Rural Competitiveness Activity (ARCo) in order to make more resources available for community development activities. At the end of the current reporting period, the 19<sup>th</sup> modification of the ICDF's CA, which moderately increased the ICDF's availability of obligated funds, was approved.

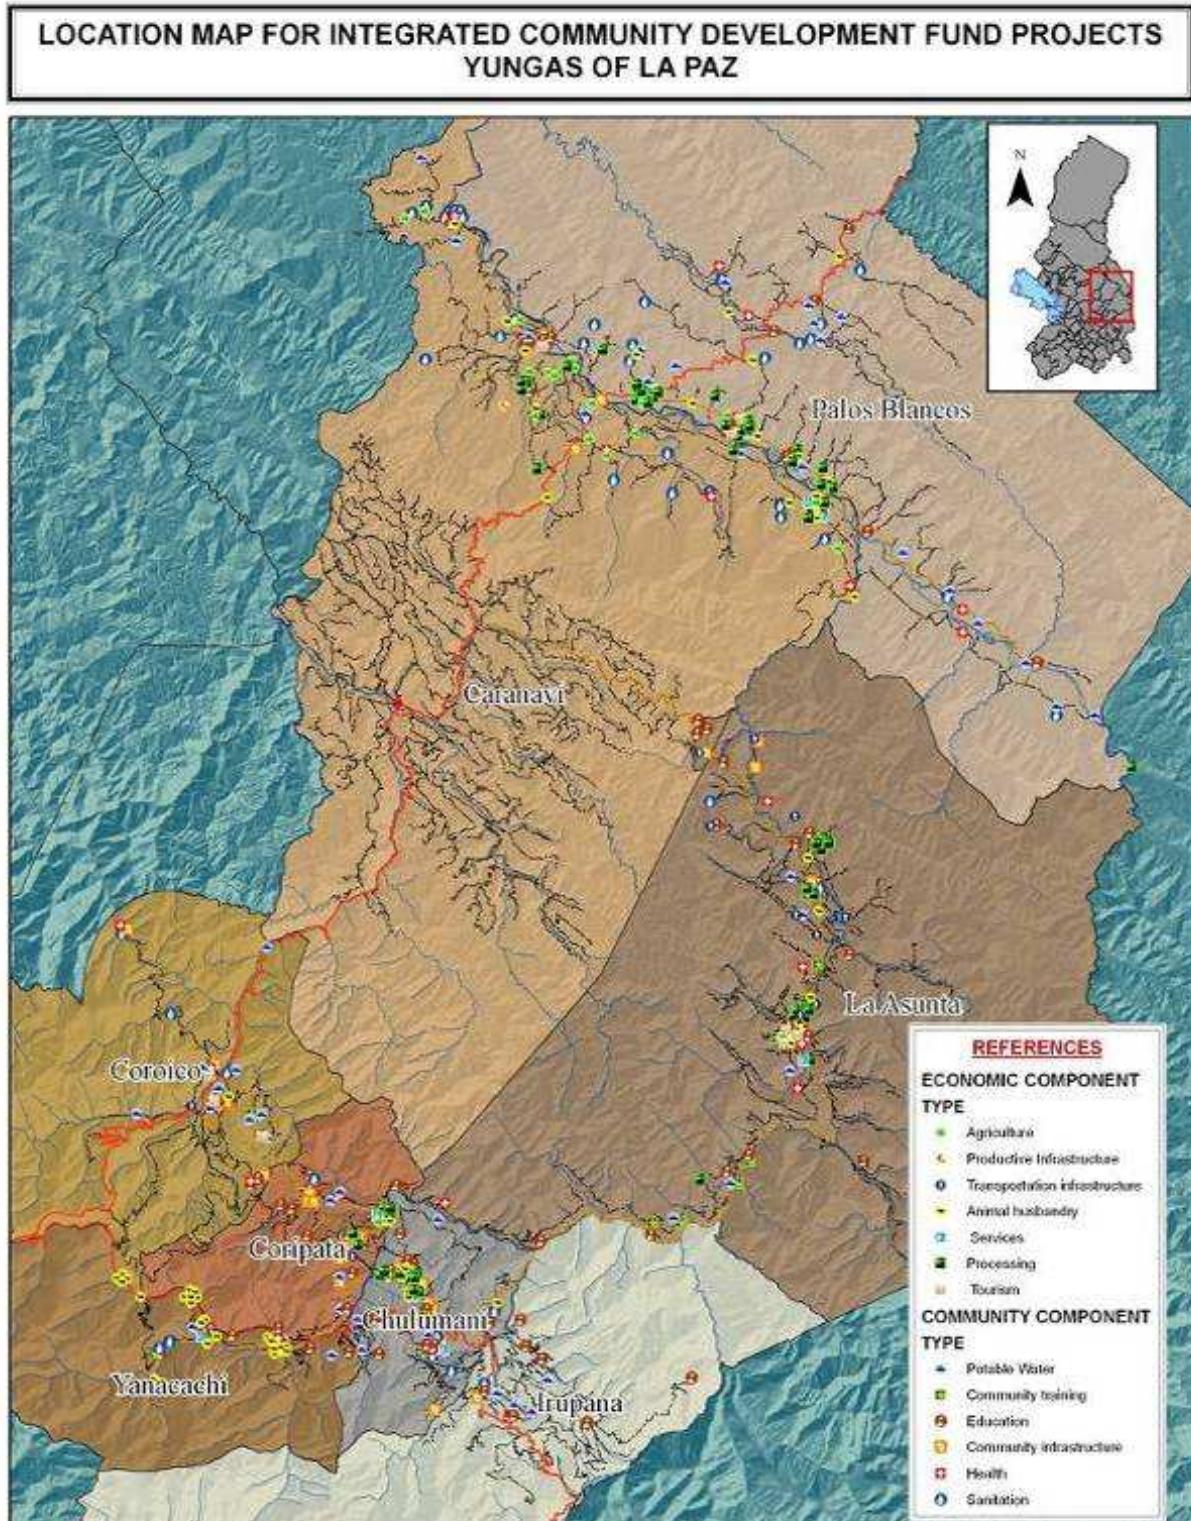

### III. HIGHLIGHTED ACTIVITIES

In November, the ICDF concluded a vocational training project. The objective of the activity was to give residents from the Municipality of La Asunta the opportunity to enter into technical careers in automotive mechanics, electrical engineering, carpentry and gastronomy.

The number of families in the Municipality of La Asunta is on the rise. With an eye toward stimulating the local economy, the four sectors in which training was provided were selected in accordance with the increasing demand for labor in these areas. Through an agreement with Infocal, a leading institution for technical training that operates nationwide, the ICDF arranged for 49 students from 25 different communities across the municipality of La Asunta to take intensive, customized, classes at its El Alto location. By giving project participants a chance to acquire knowledge and skills in these four sectors, such training is expected to generate income while at the same time, contribute to the diversification of the local economy.

Project participants were recruited through advertisements broadcast on local radio stations. These announcements invited interested parties to take part in an initial selection process. The *centrales*, organizations which represent four to six communities each, then pre-selected candidates based on their exam results. Pre-selected candidates were then presented to their corresponding federations, one of two over-arching entities in La Asunta that encompass several *centrales*. The federations selected the final group of 49 participants from a total of 13 *centrales* in coordination with the ICDF. The average age of the participants was 26, with their ages ranging from 17 to 35. Of the 49 participants, 17 were women; this figure, which represents 34 percent of the group, is significant for the reasons discussing in the following paragraphs.

The 49 training participants were brought to El Alto for a six-week stay. During this period, they attended classes at Infocal for eight hours a day, six days a week. At first, a few of the participants came down with altitude sickness and later others came down with colds and respiratory illnesses.

Fortunately, after receiving medical treatment, these students were able to attend classes regularly. By the end of the program, all 49 students had concluded their coursework and passed the exams required for obtaining their certificates. Mr.

Armurio, the director of Infocal in El Alto, expressed that this technical capacity building project was a unique and positive experience for all, and that this was in part because for the first time in this kind of training, no participants dropped out of the courses.



Students from La Asunta arriving at the hotel.



Griselda Gómez Machaca and some of her classmates displaying a door they made during the carpentry course.

Several women took part in the automotive-mechanic, electrical-engineering and carpentry courses in spite of the fact that jobs in these fields are generally occupied by men. Twenty-three year old Griselda Gómez Machaca, who completed the carpentry course, explained that although these are generally considered stereotypical male occupations, other women from her community had expressed interest in taking these courses. However, she explained that they chose not to because staying far from home for more than a month is difficult for them since many are mothers and/or have other responsibilities in the home. Despite such complications, it is precisely for this reason that

Griselda and her classmates feel that technical training can be even

more important for women than for men. *“I’m also a mother; I am single with a two-year old daughter. With what I learned in these courses I have better chances for earning the income I need to support myself and my daughter.”*

Griselda also speaks of the obstacles faced by the women of her community: “As women, we hope to make something of our lives, but in La Asunta there are no vocational institutions or universities; there is nothing. We are unable to access courses or schools, mostly because we don’t have the financial resources. We can only work in agriculture and mostly in coca farming. I don’t like this life; our children suffer on the coca fields. Many times we talk amongst ourselves about obtaining skills in certain areas that could help us give our children lives that are different from the ones we have lived.” Continuing to talk about how important these training courses are for women from the communities of La Asunta, Griselda adds: “Life is hard for us, women who don’t know how to sustain themselves depend on men and many times they even have to tolerate different kinds of abuse. In this sense these courses help us a lot; they make it so that we won’t have to depend on men anymore”.

Griselda and the other women who participated in the carpentry course aspire to form a women’s carpentry association in La Asunta. “We will be able to teach women who were not able to take the course with us; we will be able to transfer our knowledge. In La Asunta we have all the raw material we need. Besides wood we also have bamboo, and to make crafts you need fewer tools than for other carpentry jobs. Now we would like to learn more about forest management because it’s best not to cut down trees at random.” The women who enrolled in the carpentry courses are not the only project participants who want to form associations and small businesses. In fact, most expressed their desire to apply what they learned at Infocal in their municipality through the formation of organizations and/or microenterprises.

Some participants of the automotive-mechanic course feel that their six-week program did not impart sufficient knowledge for them to be able to repair cars with significant technical problems. In spite of this, all course participants feel that they now have a solid foundation which will help them find jobs with other mechanics or the know how to fix cars that belong to their family members and neighbors. Some participants would eventually like to open their own auto repair shops in their communities. Nelson Chino comments: “*Each central has four, five or six communities. When roads are built, people in the communities begin to buy cars and then have to go to La Asunta when they need to have them repaired. Going all the way to La Asunta to get a car fixed is too far. The case of Central Progreso is even worse; it consists of six communities located across the river from the town of La Asunta. When cars break down in Progreso, they just sit in the community and a mechanic has to be brought in from the town of La Asunta. For this reason local auto repair shops are needed*”.



Showcase of different cakes and pastry made by the La Asunta gastronomy students.

With the exception of three male participants, all of the students enrolled in the gastronomy course were women. Marcelo Michua Mamani lives in Laguna Verde, a tiny village, six hours walking distance from La Asunta. He lives with his aunt and uncle and says that they weren't happy that he signed up for a gastronomy course. “*They asked why I wasn't taking the automotive-mechanics or electrical-engineering course. I don't like working in agriculture and working the coca fields is tough. I like the kitchen and I have already worked as an assistant in one before. The gastronomy course has helped me a lot, we even learned about international cuisine. I hope to be able to find work in a restaurant in La Asunta. Since food isn't that good in La Asunta, now I might actually be able to contribute to the area in some way. Eventually I would like to take out a loan in order to open my own restaurant.*”

Marcelo's classmate, Maria Eugenia Chambi, says that she plans to bake cookies and bread for the children from her community: "*I am going to place my stand near the school so that I can sell snacks to the children during their recess. I am going to bake healthy snacks like oatmeal cookies. At Infocal they also taught us about nutrition. In La Asunta we don't know much about healthy eating so I want to pass what I learned on to other mothers*".



Maria Eugenia Chambi with a classmate preparing international cuisine.

Einar Saavedra attends high school in La Asunta and was one of the youngest participants to enroll in the electrical-engineering course. He says he is happy to have participated. "*I thought it was going to be hard but it wasn't too bad; where there's a will, there's a way. When we finish school in La Asunta, we don't have any place to go to keep studying and it's difficult to find work. Now I hope to be able to continue my studies in electrical engineering, it's a good career. I think electrical engineering is a beautiful thing and I feel passionate about it. You learn one thing and you want to know more, there's always something new to learn. I'm sure I will be able to find work in this field since no one in La Asunta knows how to repair television sets or radios*".

Most of the project participants rarely ever leave their communities let alone their municipality. All 49 project participants felt that their stay in El Alto was well organized and many described their experience at Infocal as unforgettable. Despite the very modest accommodations with which they were provided, Griselda Gomez comments: "*The hotel was perfect. I didn't expect*



Einar performing an electrical engineering exercise. - 12 -

*it to be that nice; we thought we were just going to stay at a basic hostel. We aren't accustomed to so much luxury; the food was also good, we were able to eat whatever we wanted. The ICDF engineer always followed up with us; every day he would come see what we were doing and if we needed anything, he would bring it to us".*

In general the program participants were happy with the courses and were grateful to have been able to participate. Despite the fact that some felt that six weeks was not enough to learn all the skills necessary, they do feel that the knowledge and skills they acquired provided them with a solid foundation and will be of great use. Nelson Chino, who was enrolled in the automotive-mechanics course states: "*We are very grateful for the program. We are changing our mentality little by little. Now we know that we don't have to work in agriculture, that we are capable of learning to work in other sectors and of becoming professionals in other vocations. We have to keep learning and move forward in order to improve conditions in our communities*".

On the 26<sup>th</sup> of November a celebratory event marking the close of the project was held at Infocal in El Alto. The project participants organized an exhibit of what they had learned during the six-week program. Each student was given his/her certificate during the ceremony. Outstanding students from each course were recognized and were awarded books and tools as incentives to keep learning and working in their chosen sectors.




One of the four groups of students proudly displaying their certificates.

## IV. SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA

### A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS

The Alto Beni region includes the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. The latter municipality was formally established in January 2010. The region is well suited for agriculture and can be described as a large valley divided by the Alto Beni River. Although a significant portion of the region's population is of Moseten ethnic origin, the majority of its inhabitants are migrants or the children of migrants from the Altiplano region (specifically from the departments of La Paz, Oruro and Potosí) who arrived in the region between 1952 and 1964.

The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) index for Palos Blancos has declined from 90.5 percent in 2001 to 57.1 percent in 2008. In spite of this, significant increases in the area's population over a short period of time have resulted in the continued high demand for basic services including housing, access to potable water, education and health facilities. It is estimated that more than half of the families in the area still live below the poverty line.

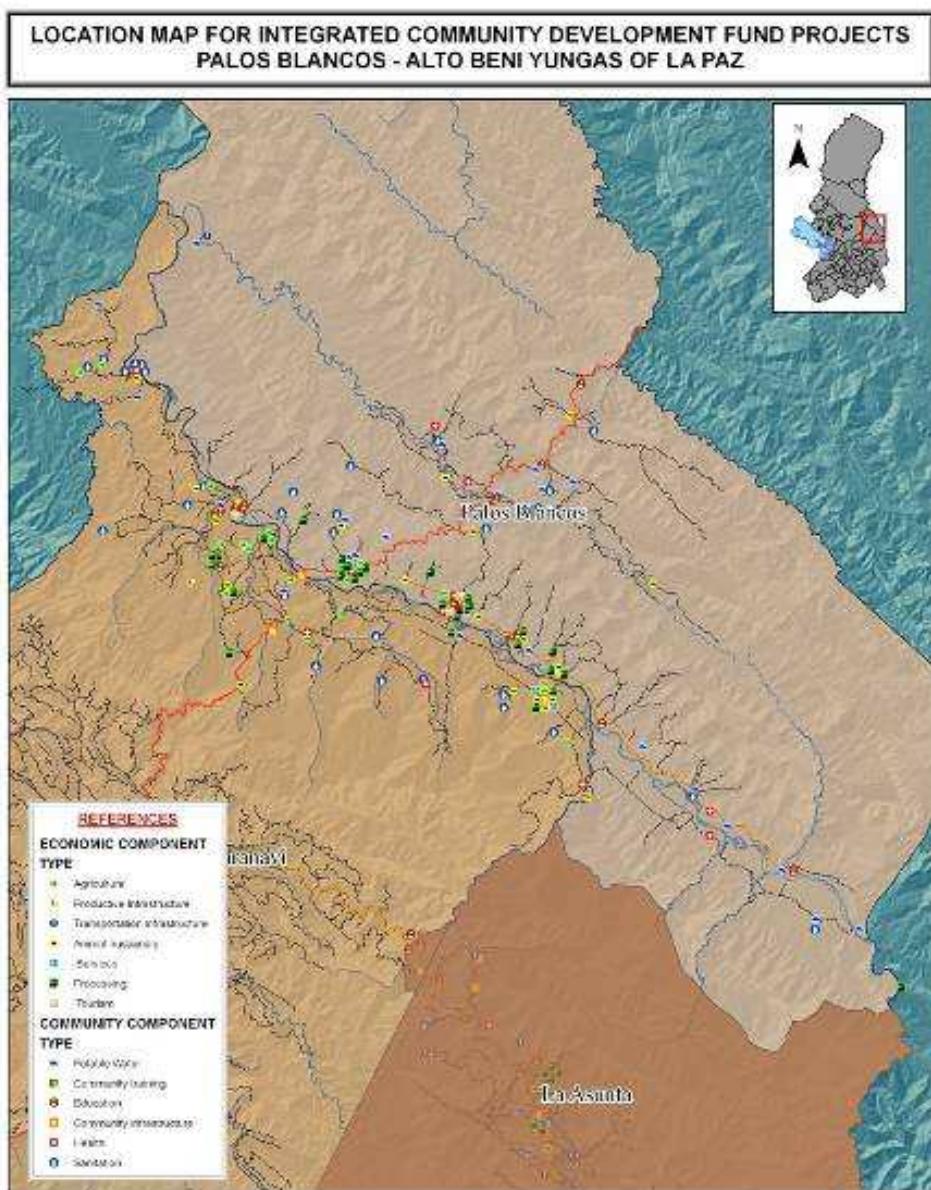

## 1. Completed projects

During the reporting period one project was completed in the Municipality of Palos Blancos:

- Final design and construction of a rooftop for the Santa Ana de Mosetenés multi-functional sports complex



The multi functional sports complex with roof in Santa Ana de Mostenes.

The Santa Ana de Mosetenés School provides primary and secondary school education for 349 students from Santa Ana de Mosetenés and its neighboring communities. With the conclusion of the rooftop of the school's multi-functional sports complex, these students can now carry out civic and sports activities throughout the year while protected from the rain and sun. The community will also be able to use the complex as a meeting space and for other communal activities.

## 2. Summary of Activities by Subcomponent

### a. Potable Water

#### San Miguel de Huachi Potable Water System

The design for the San Miguel de Huachi potable water system consists of two subsystems that will supply the community's more than 1,500 inhabitants with water. During the reporting period, construction of the system's two water intakes was concluded along with six pressure chambers and the accompanying pipeline. In accordance with the project's original design, a storage tank with a capacity for 120 m<sup>3</sup> was also installed.



General training in plumbing for the community of San Miguel de Huachi.

ICDF also carried out a series of trainings for the water committee, and broader community, in the system's operation and maintenance with the objective of increasing the sustainability of the project over the long-term. Such activities include the formation and strengthening of a potable-water and sanitation committee (CAPYS for its acronym in Spanish) as well as the organization of workshops and training sessions for the general public. In October, emphasis was placed on training the CAPYS in themes related to management. The Potable Water Cooperative Statute was also developed at this time with the participation of community authorities.

In November 2011, the CAPYS began operating out of an office where its members are now able to manage documentation and correspondence as well as the potable water system blueprints. The training for the CAPYS in the areas of potable water system operation, maintenance and administration was concluded in December. During the reporting period the CAPYS also developed its annual work plan for 2012 as well as rates to be charged for the new potable water service.

In addition to the CAPYS, the ICDF offered training to approximately 300 members of the student body and staff of the San Miguel de Huachi School in the areas of sanitation, hygiene and environment. Workshops designed to improve habits of water use and the application of environmental protection measures were also carried out with the participation of approximately 130 community members. In November, demonstrative teaching methodologies were applied during theoretical and practical plumbing workshops.

### **Alto Remolinos Potable Water System**



One of the pipeline bridges for the Alto Remolinos potable water system.

During the reporting period, important advances were made in the construction of the Alto Remolinos potable water system. This included the construction of the system's water intake and the installation of the regulator tank for the community of Alto Remolinos. The water flow distribution chamber and the regulator tank for the communities of Palmeras, Magdalena, Alto Remolinos and Remolinos were also installed as were their respective accessory chambers and perimetral fences.

Work on several stretches of the piping in addition to constructing pipeline bridges was also completed. Approximately ninety percent of the 210 household connections called for

in the original project design were installed during the reporting period.

Once concluded, the Alto Remolinos potable water system will distribute water to the communities of Alto Remolinos, Remolinos, Palmeras, Magdalena and Olivos. In addition to construction work on the Alto Remolinos potable water system, important measures to improve the project's long-term sustainability were carried out during the reporting period. For example, as a means of protecting the Alto Remolinos water source, the ICDF worked with the community to place posts and greenhouse covering material over a new forestry nursery. Currently the nursery has 2,000 seedlings all of which will be used to reforest stretches of the pipeline and parts of the Alto Remolinos watershed.

ICDF trainers also conducted eight workshops for teachers and students from the Alto Remolinos School. Themes covered included the correct use of water, personal hygiene, hand washing and solid-waste management. Throughout the workshops special focus was placed on gender equality and leadership. At this time, the school also organized a cleaning campaign through its newly formed environmental committee. A fair, covering water and the environment, was also carried out at the school. Students participated by exhibiting their own projects touching on themes related to water use and the protection of water sources.

In addition to conducting workshops for the benefit of school-age children, facilitators carried out six workshops for the adult population from the different communities. Themes covered during these workshops included the appropriate use of water, personal hygiene and solid-waste management where emphasis was also placed on gender equality and leadership. A health and dengue-prevention campaign was also carried out during the reporting period. In coordination with local authorities and the Alto Remolinos CAPYS, participant families eliminated breeding areas for mosquitoes by undertaking district-wide domestic cleaning activities.

## b. Education

### **Classrooms for the San Antonio School, Alto Beni**

Currently San Antonio's school does not have the space it needs to provide its 220 elementary and middle school students with a quality education. The problem is exacerbated by the increasing population of children needing to enroll in the school. With this in mind, the community prioritized the construction of new classrooms. The approved subaward consists of the construction of 10 classrooms and new school bathrooms. The benefits of the infrastructure will extend beyond San Antonio as families from five neighboring communities continue to send their children to the San Antonio School to study.



New Classrooms for the San Antonio School.  
ceilings for the new classrooms proceeded.

During the reporting period, activities to render the San Antonio worksite suitable for construction were conducted. In addition to digging drainage ditches to channel water away from the construction site, Geotextile membranes were used to keep humidity away from the building. Once the ground was

ready, the construction of walls and

In addition to advances in construction, San Antonio School teachers and students participated in four workshops. These trainings highlighted the importance of water and solid-waste management among other topics. Also during the reporting period, an environmental committee was formed at the school and an environmental clean-up campaign was carried out.

### c. Crosscutting Activities

#### **Improving quality of life through the kitchen**

One of the most significant ICDF projects currently being implemented in the region of Alto Beni and Palos Blancos is entitled “Improving Quality of Life Through the Kitchen.” During the reporting period, 180 ecological *Malena* stoves were constructed bringing the total built in the region to 300. In addition to stove construction, training was offered to project participants in the areas of use and maintenance as well as in nutrition and family hygiene.

Work on the project has been complicated by heavy rainfall typical of the season. The effects


of the rainy season have been felt even more intensely since the project is being implemented in the most distant communities of Alto Beni and Palos Blancos. In spite of weather-related difficulties, project activities are being carried out according to plan and the project is scheduled to conclude in May 2012.



**A community member constructing a stove.**

## B. LA ASUNTA

The Municipality of La Asunta has the highest rate of population growth in the Yungas region with the current population estimated at more than 24,000. The majority of communities in La Asunta are new settlements whose inhabitants migrated from the Altiplano's departments of La Paz, Oruro and Potosí. La Asunta's NBI index is the highest of all municipalities in the Yungas region, with 70.7 percent of the population living without access to basic services such as water and sanitation, education and/or health.

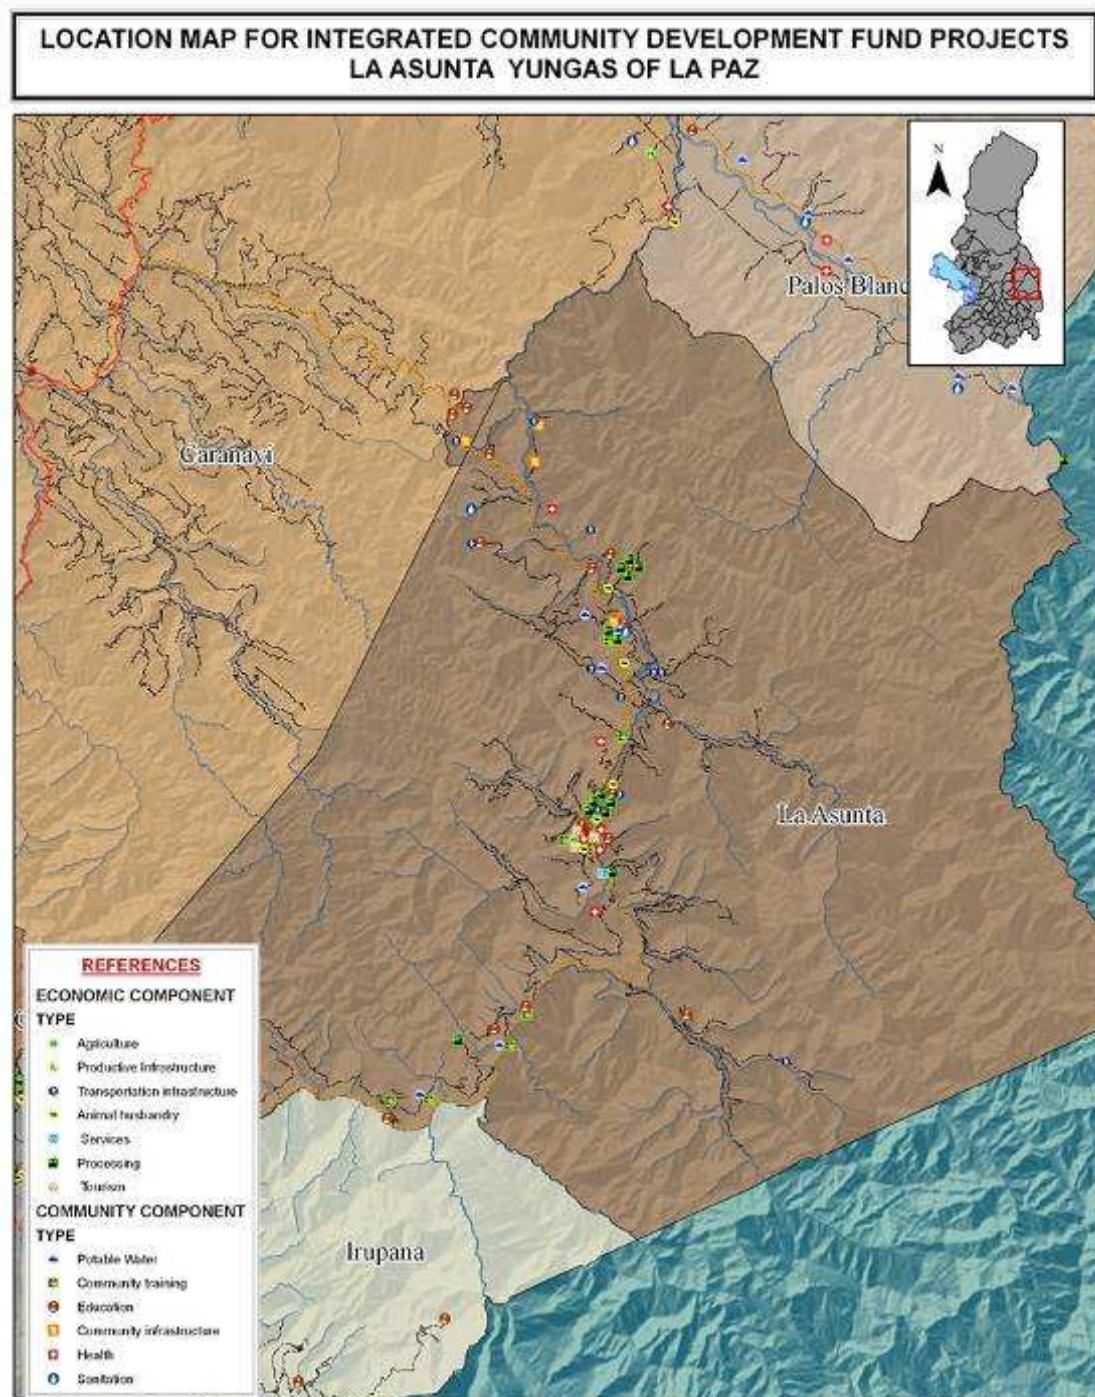

## 1. Completed Projects

Four projects were concluded in the Municipality of La Asunta:

- Donation of Materials for Concluding the Siguani Chico Hanging Footbridge
- Design of the Santa Lucia Development Bridge
- La Asunta Potable Water Project Design Fund
- Improving Quality of Life Through the Kitchen- Phase II

During the reporting period construction was concluded on the Siguani Chico hanging footbridge. The ICDF provided construction material for the bridge while the community members, under the supervision of the *Mancomunidad de Municipios de Los Yungas de La Paz* (MMYLP), carried out the construction work. The design of the Santa Lucia Development Bridge was also concluded during the reporting period.

The design for a sanitary sewer system for Cotapata was completed under the “La Asunta Potable Water Project Design Fund”, bringing this activity to a close. Since the municipal governments annual operating plan can only include projects that have a final design and documented budget, with the final designs for the Santa Lucia Development Bridge and the sewer system now in hand, La Asunta’s municipal government has an important tool for obtaining the financing necessary for implementing both projects.

During the reporting period the second phase of the project entitled, “Improving Quality of Life Through the Kitchen,” was concluded in La Asunta. The project involved the construction of ecological *Malena* stoves which all but eliminate household smoke-related incidents of ocular infections and respiratory illness by reducing the amount of smoke produced. In addition, these stoves consume less firewood than the more traditional stoves reducing time spent collection firewood.

As part of the implementation, the ICDF provides technical assistance, as well as some materials that are more difficult to find locally. Additionally, families are provided with training in nutrition and hygiene. Project participants recognize the health and environmental benefits of cooking with *Malena* stoves and are happy with their performance. As a result of both phase I and phase II of this activity, a total of 880 families have been trained in stove use and maintenance, and now boast the ownership of a new ecological stove.



A mother and son from La Asunta enjoying their new stove.

## 2. Summary of Activities by Subcomponent: La Asunta

### a. Potable Water and Basic Sanitation

#### San Jose Potable Water System



Counterpart labor: digging ditches for pipelines in Villa Camacho for the San Jose potable water system.

During the reporting period, the potable water system design was adjusted to include the community of Villa Camacho. This was appropriate both technically and financially based on the location of the water source and the fact that the system will now encompass more than 300 household connections. Once complete, the system will provide a constant supply of clean water to families from the communities of San Jose, Los Olivos, 21 de Agosto and Villa Camacho.

As part of its coordination activities, ICDF technical personnel participated in meetings with the CAPYS of each one of the participant communities as well as with the San Jose Central. The objective of these meetings was to organize the distribution of counterpart labor and to inform all community members about modifications made to the project in

accordance with technical requirements and requests made by community authorities.

Important advances were also made on the San Jose potable water system's construction. Besides carrying out a topographical study in the community of Villa Camacho, 50 percent of the ditches for the system's water pipelines were excavated. Digging ditches for the pipeline was a difficult undertaking as a large part of the system is being constructed on rocky terrain. Also, some delays in excavation were inevitable due to heavy rainfall. Nevertheless, in mid-December, after extracting rocks and roots from the ground, pipe laying for the system's network began. As part of their counterpart contribution, community members then worked on filling in the ditches and compacting the soil over the water lines.

During the reporting period, ICDF staff also completed the designs for the system's water intake and water distribution chambers. The design calls for water to flow from two distribution chambers; one will provide water to the San Jose Central while the other will distribute water to the community of Villa Camacho. These designs have been handed over to La Asunta's municipal government technician who, alongside FONADAL, is in charge of supervising their implementation.

To promote project sustainability, workshops were held in schools in the communities of San Jose and Los Olivos. In the community of San Jose, all primary and secondary school students and teachers participated in workshops on the importance of appropriate water use and hygiene. The students and teachers showed strong interest and enthusiasm at the presentations especially during those where a projector was used to display important visual aids.



Members of the San Jose community help to place the pipelines, as part of their counterpart labor.

### Siguani Grande Sanitary Sewer System

Important progress was made on the construction of the Siguani Grande sewer system. In spite of heavy rainfall that is typical of the season, the community began their counterpart work by helping to excavate pipeline ditches. The construction on the system's anaerobic wastewater treatment plant also began. Anaerobic treatment plants are highly effective in that they clean wastewater by up to 95 percent. In addition to preventing the contamination of nearby water sources (in this case the Boopi River) the use of anaerobic treatment plants prevents the secondary effects that normally occur with wastewater treatment including foul odors, among others.



Training the children of the Siguani Grande School in solar water purification methods.

In addition to beginning construction on the sewer system, ICDF organized workshops on several topics including conflict management and prevention, public health, hygiene, and operation and maintenance of the sewer system, as a means of building capacity within the project management committee. Once

completed, the Siguani Grande sewer system will benefit 220 families, each with its own household connection.

## b. Education

### Classrooms for the René Barrientos Ortúñ School

During the reporting period the ICDF came close to concluding the construction of 12 classrooms for the Rene Barrientos Ortúñ School located in La Asunta's town center. In November final touches on the school including stuccoing, painting, tiling and electrical wiring were completed. Simultaneous to construction activities, the ICDF provided organizational strengthening workshops for the school board and directory. As a means of promoting the project's long-term sustainability, training was offered to school teachers and to students in areas related to the appropriate use and maintenance of the new infrastructure. While the provisional handover of the infrastructure took place in December, the definitive handover is pending a few minor construction details in addition to the installation of school furniture.



building almost finished, in




Rotating sanitation and cleaning teams are set up in La Asunta. The two girls in the yellow shirts are in charge of supervising a cleaning campaign in and around the school.

## C.

## C. TRADITIONAL ZONE

The Traditional Zone of the Yungas comprises the municipalities of Coroico, Chulumani, Coripata, Irupana and Yanacachi. Together, these municipalities have an estimated population of more than 56,000. Over the last few years, significant progress has been made in reducing NBI index in the Traditional Zone. The municipality with the lowest rate is Chulumani, with an NBI of 44 percent, while the regional average in the Traditional Zone is 48 percent. The communities' main needs include access to potable water and sanitation, education and health.

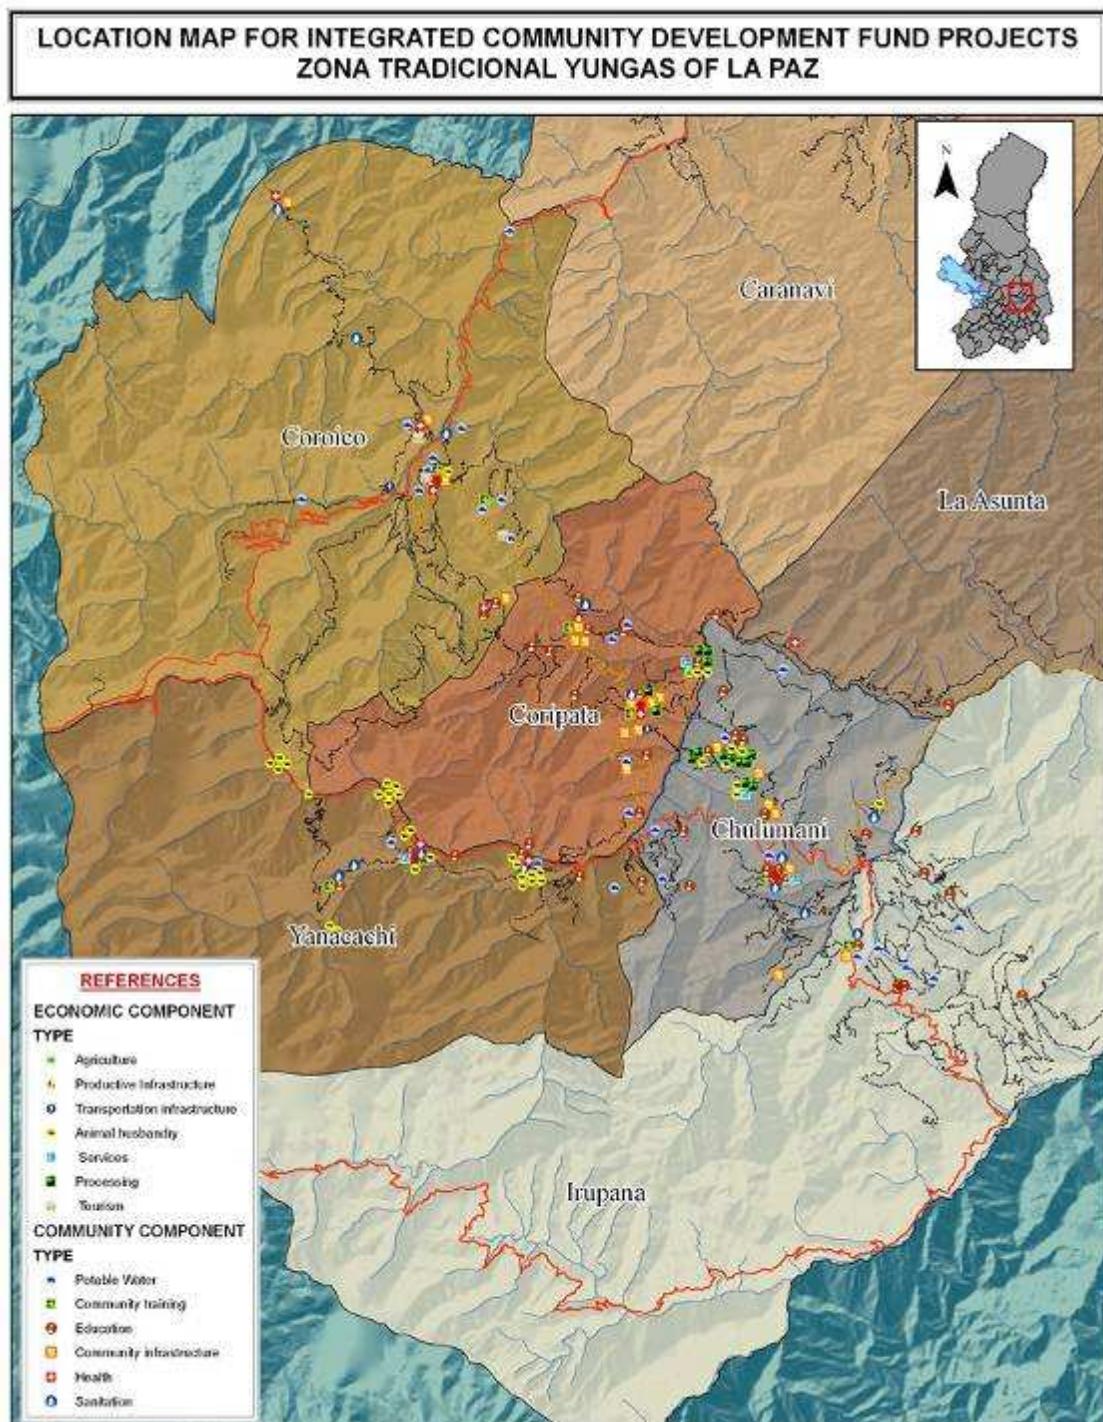

## 1. Completed projects

The following eight projects were concluded for the Traditional Zone during the current reporting period:

- Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Chulumani
- Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coripata
- Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coroico
- Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Yanacachi
- Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Irupana
- Construction of a public bathroom for the town of Irupana in the Churiaca neighborhood
- Construction of a multi-grade classroom for the Huiri Lanza School
- Construction of a multi-grade classroom for the Llojeta School

A lack of school furniture is a widespread problem in the Yungas region that undermines the ability of children to make the most of their education. Currently, children across the region try to maintain their focus at school while sitting on old fashioned school benches and sharing desks in ill-equipped classrooms. In light of this issue, in 2011, the ICDF assessed the need for furniture, equipment and other didactic materials for schools in the municipalities of Alto Beni, Chulumani, Coripata, Coroico, La Asunta, Irupana, Palos Blancos and Yanacachi.

In coordination with the municipal authorities and the district directors of education, an ICDF consultant made visits to 373 schools within these municipalities. Based on the results, the ICDF worked closely with the region's municipal governments to determine which schools should be prioritized for assistance. By the end of December, furniture and equipment for over 100 schools across the five municipalities in the Traditional Zone had been delivered. Each municipal government contributed a cash counterpart equivalent to 20 percent of the total investment in schools within their jurisdiction.

A large portion of school furniture and other equipment was handed over to participating schools during visibility events held in Coroico and Chulumani. The events were attended by local authorities, parents, children, teachers, the Vice Minister of Coca and Integrated Development, Germán Loza, and Acting Director of USAID/Bolivia's Sustainable Development and Environment office, Stephen Smith. Approximately 2,270 students will benefit from the donated material.



Public event held in Coroico where school furniture for communities of the municipalities of Coroico and Coripata were handed over. - 25 -

During the reporting period, three other projects were concluded in the Municipality of Irupana; two multi-grade classrooms in the communities of Huirri Lanza and San Jose de Llojeta, and a public bathroom in the Churiaca neighborhood of the town of Irupana. The two classrooms will benefit approximately 70 elementary school students by offering them an appropriate and comfortable space for learning. The public Churiaca bathroom offers both men's and women's bathrooms as well as showers that can be used by the general public. The Churiaca neighborhood hosts a regional market on certain days of the week and also serves as a drop off and collection point for inter-provincial buses. In this sense, the new public bathroom is expected to help the town make important strides in improving sanitary conditions for its residents.



## 2. Summary of Activities

Four ICDF projects are being implemented in the Traditional Zone. In the municipality of Coroico, progress was made in the construction of a new health center for the Community of Carmen Pampa. Work on the infrastructure is 80 percent complete with only final details remaining. Training for the use and maintenance of the health center will also be carried out before bringing the project to a close. In the same municipality, work continued on the refurbishment of the water intake for Coroico's potable water system. In the Municipality of Coripata, progress was made on the purchase and installation of the sand and gravel processing equipment project. Also during the reporting period, construction on the Churubamba multi-grade classroom in the Municipality of Irupana continued. This project is scheduled to be concluded next quarter.

## D. CROSS-CUTTING ACTIVITIES

### 1. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP)

The UAC-CP is a non-profit university located 111 km northeast of La Paz, in the North Yungas Province of the department of La Paz. The university is located in the community of Carmen Pampa, 13 km from Coroico, the capital of the province. It primarily offers higher education to students from the Yungas region and northern areas of the Department of La Paz and to the youth from marginalized areas in the city of La Paz. The UAC-CP was created by an inter-institutional agreement between the Catholic University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the Franciscan Missionary Sisters and the local governing body of the Villa Nilo Sub Central, on October 4, 1993. The institution offers bachelor degrees to a student body of approximately 700 students in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal husbandry and primary education. It also offers an associate degree in tourism. Each program includes academic coursework as well as opportunities for hands-on practice in the respective career tracks. The overarching objective of this institution is to give youth from the Yungas the opportunity to learn careers that are relevant to the development of this area, in the hopes of keeping them rooted in the rural area, rather than migrating to the city. The ICDF continued to support UAC-CP students this quarter by funding 50 scholarships.

### 2. Zamorano Scholarship

Based on outstanding scholarly performance, in 2007, three undergraduate students from the UAC-CP were awarded scholarships to the prestigious Pan-American School for Agriculture in Zamorano, Honduras. In December 2011, the last of the three scholarship students returned to Bolivia after completing her studies and receiving a Bachelor's degree in agronomy. The student, Maria Eugenia Bolaños, expressed her gratitude for this support which she stated has changed her life and will open up multiple opportunities for her in the future. With the graduation of this student, the Zamorano Scholarship project is concluded.

### 3. Outdoor Playgrounds for children in the Yungas

The construction of fourteen outdoor playgrounds in six municipalities concluded in December 2012. These recreational areas consist of two swings for children ages four to ten, two swings for children ages one to three, and two slides. Most playgrounds were placed in the town centers, while others were built in nearby communities. All the locations of the playgrounds were defined in coordination with the municipal governments of each municipality. The playgrounds will provide the children of the communities a safe environment to play.



One of the outdoor playgrounds in the municipality of Coroico.

## V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS

### A. THE ICDF IN NUMBERS

The ICDF has a total of 688 projects in its project portfolio; 409 of which fall within the community development component, and the remaining 279 fall within the economic development component. Currently, 24 projects are in implementation, while 17 were concluded during the reporting period, bringing the total number of completed projects to 664. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status and component and Table 2 illustrates the ICDF projects by status and region.

**Table 1. Number of projects by implementation status and component**


Project Status	Community Development	Economic Development	Total
Final Design			
Procurement/Acquisitions			
Implementation	22	2	24
Completed	387	277	664
<b>TOTAL</b>	<b>409</b>	<b>279</b>	<b>688</b>

**Table 2. Number of projects by implementation status and region**

Estado del Proyecto	TC	Yungas	Total
Final Design			
Procurement/Acquisitions			
Implementation	0	24	24
Completed	100	564	664
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>588</b>	<b>688</b>

At the end of the July- September quarter, there were no projects in the design or acquisition phase. This was due to severe budget cuts which resulted in a significant reduction of future activities.

**Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status**



Of the 17 projects completed this quarter, thirteen are within the community development component and four within the economic development component. Table 3 lists all projects concluded during this quarter.

**Table 3. Projects concluded during the –October - December 2011 Quarter**

MUNICIPALITY	PROJECT	COMPONENT	SUB COMPONENT
Chulumani	Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Chulumani	Community Development	Education
Coripata	Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coripata	Community Development	Education
Coroico	Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coroico	Community Development	Education
Irupana	Construction of a public bathroom in the Churiaca neighborhood for the residents of Irupana	Community Development	Sanitation
	Construction of a multi-grade classroom for the Llojeta School	Community Development	Education
	Construction of a multi-grade classroom for the Huiri Lanza School	Community Development	Education
	Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Irupana	Community Development	Education
La Asunta	Improving quality of life through the kitchen- Phase II	Community Development	Others
	Design fund for potable water projects- La Asunta	Community Development	Potable Water
	Technical training for youth from La Asunta	Economic Development	Productive Trainings
	Design of the Santa Lucia Development Bridge	Economic Development	Transportation infrastructure
	Construction of a hanging footbridge - Siguani Chico	Economic Development	Transportation infrastructure
Palos Blancos	Final design and construction of a roof top for the Santa Ana de Mosetenés School multi-functional sports complex	Community Development	Education
Various YUN	Zamorano scholarships for young leaders	Economic Development	Productive Trainings
	Teaching English to youth from the Yungas region	Community Development	Community Trainings
	Outdoor playgrounds for children in the Yungas	Community Development	Community Infrastructure
Yanacachi	Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Yanacachi	Community Development	Education

Chart 2 shows the number of subawards that were added to the ICDF portfolio each quarter since the beginning of the project and the number of subawards completed over the same period. A total of 17 projects were completed during the reporting period. The ICDF portfolio now has 664 concluded projects and 24 active projects in its portfolio; these are scheduled to be completed over the next nine months.

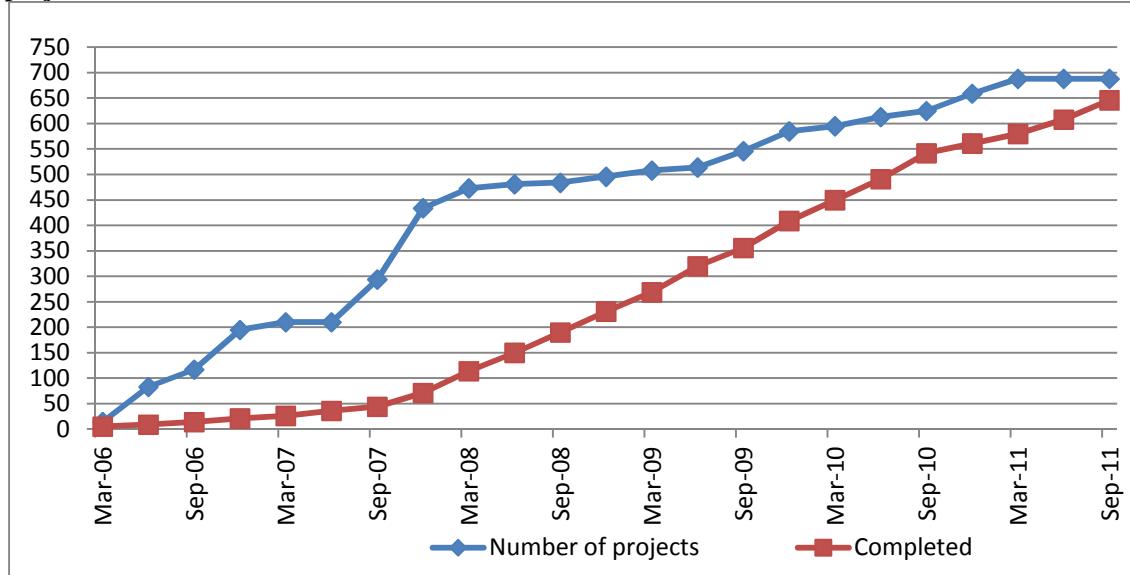
**Chart 2. Cumulative number of ICDF subaward projects in the portfolio and number of completed projects**



Table 4 shows a breakdown of project distribution by region, municipality and component. The Municipality of La Asunta has the most projects, followed by the Municipality of Palos Blancos. Approximately 10 percent of projects within both the community development and economic development components benefit more than one municipality.

**Table 4. Distribution of projects by region, municipality and component**

Region	Municipality	Community Development	Economic Development	Total
Yungas	Alto Beni	27	43	70
	Chulumani	32	16	48
	Cajuata	1	0	1
	Coripata	38	15	53
	Coroico	38	7	45
	Irupana	21	2	23
	La Asunta	80	58	138
	Palos Blancos	61	42	103
	Yanacachi	22	31	53
	Various – Yungas	37	17	54
<b>Subtotal</b>		<b>357</b>	<b>231</b>	<b>588</b>
TC	Chimoré	8	6	14
	Entre Ríos	5	6	11
	Puerto Villaruel	18	13	31
	Shinahota	12	10	22
	Villa Tunari	5	7	12
	Various – TC	3	6	9
	Omereque	0	0	0
	Yapacaní	1	0	1
	<b>Subtotal</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>		<b>409</b>	<b>279</b>	<b>688</b>

Chart 3 shows the breakdown of community development projects by sector. A significant number of these projects fall under the education and potable water subcomponents. The increase in the amount of projects in these areas is due to the

demand for high-impact activities, such as the provision of infrastructure and/or equipment, as a means of improving access to health, potable water and education. Chart 4 shows the breakdown of economic development projects by sector.

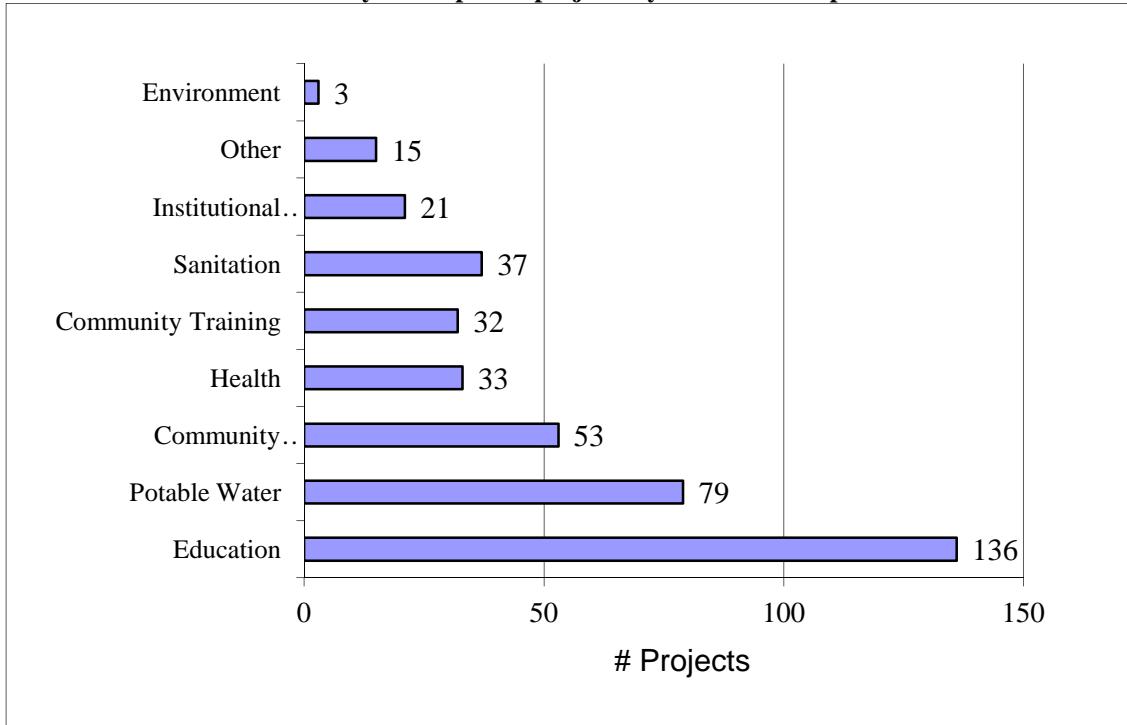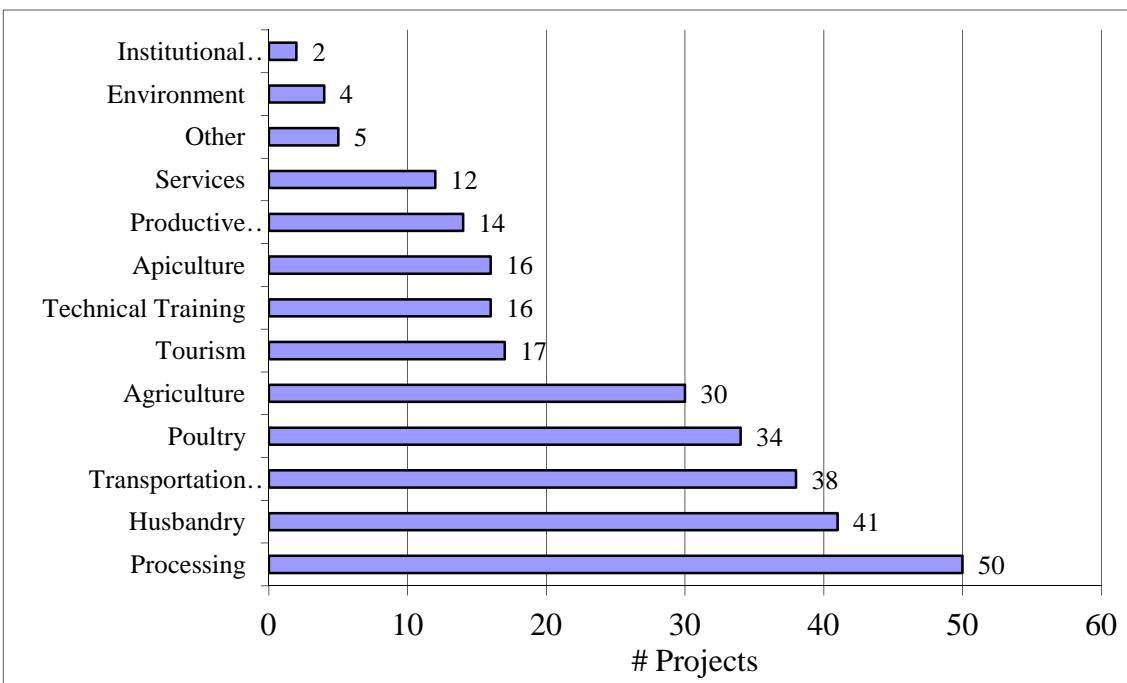**Chart 3 – Number of community development projects by sector subcomponent****Chart 4 – Number of economic development projects by sector subcomponent**

## B. PERFORMANCE INDICATORS

All ICDF activities are divided into two components: economic development and community development. These two programmatic areas support the USG and PSB's policies and provide the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable development in the Yungas and previously in the Tropics of Cochabamba. The table below summarizes the ICDF's performance indicator targets by programmatic component as set out in Modification 18.

**Table 5. ICDF performance indicators and calendar year targets<sup>1</sup>**

Indicator	Unit	Targets									Total LOP
		06	07	08	09	Adjust- ment (*)	10 (**)	11 (***)	12 (***)		
<b>Overall Indicators</b>											
SO 1.1	Unsatisfied Basic Needs Index (NBI) – Yungas	Percentag e	70%		65%						60%
SO 1.2	Total number of families with increased access to goods and services.	Number of families	3,499	5,000	6,000	5,000	10,587	3,448	3,800	3,922	41,256
<b>Community Development</b>											
IR 1,1	Number of social and productive infrastructure and related works completed	Number of works of infrastructure	13	120	150	130	-35	110	90	98	676
IR 1,2	Number of trainees completing any type of training	Number of trainees	2,582	6,000	5,000	3,500	19,751	3,075	5,399	6,238	51,545
<b>Economic Development</b>											
IR 2,1	Value of incremental sales generated by economic initiatives supported by the ICDF	US\$ thousands			650	1,800	1,032	609	250	50	4,391
IR 2,2	Number of equivalent jobs attributable to ICDF-supported activities	Equivalent jobs	219	1,000	1,500	1,500	-1,260	979	603	887	5,428
IR 2,3	Number of hectares of crops supported by the ICDF	Number of hectares	0	250	1,000	1,500	-1,324	160			1,586
<b>Cross-cutting Indicators</b>											
CC1, 1	Percentage of the total cost of	Percentag e	C D %	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%

<sup>1</sup> The reformulated targets were approved via Modification 18

Indicator	Unit	Targets									Total LOP
		06	07	08	09	Adjust- ment (*)	10 (**)	11 (***)	12 (***)		
	implemented projects covered by counterpart contributions	E 20% D	20%	20%	20%		20%	20%	20%	20%	20%
CC1.2	Percentage of projects that are still “functioning well” one year after completion	Percentag e	n/a	95%	95%	95%		95%	95%	95%	95%
Note (*)	This adjustment reconciles the sum of the calendar year targets with the Life of Project targets. In 2009 the Cooperative Agreement was amended and the Life of Project targets were altered, partly in order to reflect the results achieved.										
(**)	The targets for 2010 are consistent with the targets approved in modifications 14, 15 and 16.										
(***)	The targets for 2011 and 2012 are consistent with the targets approved in Modification 17 and 18.										
)											

The main objective of the ICDF is to support the joint PSB-USG efforts to establish a sustainable economy in Bolivia's coca-producing regions by addressing basic human needs, alleviating poverty and by improving social and economic conditions where the demand for doing so is greatest. All ICDF activities are carried out by the implementation of subawards for projects identified through participatory methodologies. This objective primarily responds to USAID/Bolivia's Intermediate Result (IR) 5:

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of Cochabamba and in the Yungas region of La Paz, Bolivia.

Two indicators are used to monitor progress towards this IR: 1) the index of unsatisfied basic needs (NBI in Spanish) and 2) the number of families benefited. Due to the departure of the former integrated alternative development programs from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI indicator in this region, nor does it plan to do so in the future. Also, given that the PSB plans to conduct a national census in 2012 that will again measure the NBI, it was decided that the next NBI indicator measurement will be done by using figures from the upcoming national census. For this reason the NBI indicator was measured on only one occasion during the LOP of the ICDF.

The table below shows the results achieved through December 2011 and the corresponding percentage of progress for each indicator as approved in Modification 18.

**Table 6. Summary of results achieved by calendar year (August 2005- December 2011)**

Indicator	Results						Goal	LOP	
	Sept 05 – Dec 06	Jan – Dec 2007	Jan – Dec 2008	Jan – dec 2009	Jan - Dec 2010	Jan - Dec 2011		Total to Date	Percent of Progress
NBI Value				52%			60%	52%	
# of Families	3,499	15,204	7,229	4,161	3,344	4,880	41,256	38,317	93%
# of Infrastructures	14	23	201	141	129	90	676	598	88%
# of Trainees	2,582	21,514	9,249	4,049	3,081	4,793	51,545	45,268	88%
Sales	-	-	902	2,603	589	623	4,391	4,717	107%
# of Jobs	40	94	1,550	1,277	773	614	5,428	4,348	80%
# Hectares	0	0	175	1,256	192	435	1,586	2,058	130%

To date the ICDF has reached 93 percent of its target number of families. Progress made towards this indicator during the reporting period mainly reflects achievements made through high-impact projects such as the provision of school furniture for the five municipalities of the Traditional Zone. These projects also contributed to the results obtained for the infrastructures indicator.

As previously reported, the majority of activities under the economic development component have been transferred to the ARCo project. However, the ICDF continues to record achievements made by economic initiatives that were not transferred such as those reflected in the value of sales made during the reporting period. Most notably, this quarter \$174,985 USD in sales was primarily generated from ICDF-supported poultry farms and carpentry workshops.

The following table shows the ICDF's targets for each indicator for fiscal year 2012, it also reflects the results achieved through December 2011.

**Table 7. Summary of results achieved to date for fiscal year 2012 and the targets for the quarter covered by this report (October - December 2011)**

Indicator	FY 2011		Percent Progress	1st Quarter FY 2012		Target 2nd <sup>st</sup> Quarter FY 2012
	Target	Result		Target	Result	
NBI Rate						
No. of Families	5,196	2,704	52%	1,080	2,704	1,490
No. infrastructures	133	46	35%	28	46	38
No. of trainees	7,875	1,122	14%	1,637	1,122	2,258
Value of sales	532	175	33%	170	175	183
No. of jobs	1,120	54	5%	233	54	321
No. of hectares						

## SO 1.2 Indicator: Number of Families

**Title of the performance indicator:** Total number of families (and their communities) with increased access to public goods, services or jobs.

**Measurement unit:** Number of families benefited by ICDF supported activities

To date, 38,317 families have benefitted from ICDF projects. The current LOP target, which was approved in Modification 18, is 41,256 families. However, once ACDI/VOCA submits an updated version of the ICDF program description to reflect its partial termination and subsequent budget reduction, the indicator targets for 2012 will once again be revised.

During the reporting period ICDF recorded 2,704 families that now have improved access to goods and services, mainly as a result of projects carried out under the education subcomponent. These projects include the conclusion of two multi-grade classrooms in the Municipality of Irupana and the construction of a rooftop for a multi-functional sports complex for a school in the Municipality of Palos Blancos. The provision of furniture to schools in five municipalities in the Traditional Zone also falls into this category. Thanks to the prioritization of this furniture project, the school-age children of 2,014 families now have access to chairs, benches and tables that will make their academic experience a more comfortable one. These projects also involved the donation of bookcases, chalkboards, computer desks and chairs and desks for teachers.



School children using the new desks and chairs, during the furniture hand-over ceremony in Coroico.

Another important project concluded during the reporting period involved the construction of ecological *Malena* stoves. These stoves improve cooking efficiency by reducing the dependency on firewood for food preparation. Primarily due to the efficient design, these stoves also drastically reduce the production of smoke and toxic gases thereby contributing to improved family health and reduced greenhouse gas emissions. During its second phase, this project reached 520 families in different communities within the Municipality of La Asunta.

**Table 8. Number of families benefiting from projects completed in the October-December 2011 quarter, by component and municipality**

MUNICIPALITY	Community Development	Economic Development	Total
Chulumani	410		410
Coripata	478		478
Coroico	367		367
Irupana	564		564
La Asunta	520	49	569
Palos Blancos	38		38
Varios YUN	83	4	87
Yanacachi	191		191
<b>Total general</b>	<b>2,651</b>	<b>53</b>	<b>2,704</b>

According to Table 8, the number of families benefitted during the reporting period is relatively consistent across municipalities except for the Alto Beni in which no projects were concluded and Palos Blancos, in which no major activities were completed this quarter. For municipalities within the Traditional Zone, the figures mainly reflect the number of families benefitted by the donation of school furniture. In the Municipality of La Asunta the figures recorded are the result of the conclusion of the *Malena* stoves project.

With regard to the ICDF's crosscutting areas of work, a project involving the vocational training of youth from the Municipality of La Asunta was completed. As part of this project a total of 49 families benefitted directly from technical coursework offered at a nationally-accredited institute located in the city of El Alto.

The following table shows the targets and results achieved for each subcomponent, measuring the families' benefited indicator.

**Table 9. Number of families benefiting from projects completed in the October - December 2011 quarter, by component and subcomponent**

SUB COMPONENT	October - December 2011			Goal January – March 2012
	Goal	Result	% Progress	
Potable Water	530	34	6%	980
Education/ Health	300	2,014	671%	360
Other	250	656	262%	150
<b>Total</b>	<b>1,080</b>	<b>2,704</b>	<b>250%</b>	<b>1,490</b>

During the reporting period the ICDF surpassed its goals for the education and health subcomponents. Progress for these indicators is mainly the result of high impact projects such as the donation of furniture to schools in the five municipalities of the Traditional Zone and the construction of ecological *Malena* stoves in the Municipality of La Asunta. The ICDF's goal for potable water and sanitation projects will be reached during the following reporting period with the conclusion of the San Miguel de Huachi and Remolinos District potable water projects, both located in the Municipality of Palos Blancos.

## C. Intermediate Result 1

The ICDF's intermediate result 1 (IR 1):

**Community development in the Yungas and in the TC is strengthened.**

### IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects

**Title of the performance indicator:** infrastructures and related projects completed.

**Measurement Unit:** Number of complementary infrastructures and other projects concluded by the ICDF.

The seventeen completed projects during the reporting period produced 46 infrastructures (and infrastructure equipment) using the methodology approved in the Performance Monitoring Plan (PMP). With this progress, the ICDF has accomplished 88 percent of the goals established for this indicator for the LOP. This percentage includes 598 constructed, improved, expanded or equipped infrastructures that serve different subcomponents of the ICDF. For example, this quarter, in the Municipality of Irupana, the ICDF completed two infrastructures, namely the Huirí Lanza and Llojeta schools.

Between October and December of 2011, projects related to improving infrastructure through the provision of equipment include the donation of furniture and equipment to primary and secondary schools in the Traditional Zone's five municipalities. These projects involved the handover of more than 4,000 pieces of furniture as a means of improving learning conditions in primary and secondary schools across the region.

**Table 10. Number of infrastructures and related projects completed in the October - December 2011 quarter, by component and municipality**

Municipality	Community Development	Economic Development	TOTAL
Chulumani	6		6
Coripata	6		6
Coroico	6		6
Irupana	9		9
La Asunta		1	2
Palos Blancos	1		1
Varios YUN	5		14
Yanacachi	2		2
<b>Total general</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Other infrastructure-related activity carried out during the reporting period involves the construction of 14 playgrounds for young children. The playgrounds were installed in populated areas of each municipal capital and have become recreational meeting places for parents and children.

The ICDF also concluded work on a public bathroom in the Churiaca neighborhood of Irupana that can be used by the general public as well as neighborhood residents. Additionally, the Churiaca neighborhood hosts a

regional market on certain days of the week and also serves as a drop off and collection point for inter-provincial buses. In this sense the new public bathroom is expected to help the town make important strides in improving sanitary conditions for its residents.

### **RI 1.2 Indicator: Trainees**

**Title of the performance indicator:** People who received training within the framework of ICDF activity.

**Unit of Measure:** Number of trainees

The goal previously established by the ICDF for the trainees' indicator was not reached during the reporting period. This is because many of the projects completed during the reporting period do not involve training components that reach the entire population of participating communities. For example, this was the case with projects involving the donation of school furniture. These projects involved training provided solely to parents' organizations and to school personnel in charge of furniture maintenance. Although such projects are high in impact as evidenced by the number of families benefitted, the number of trainees is not as high as would be seen in potable water and sanitation projects where entire communities are trained in system use, personal hygiene and environmental protection, among other topics.

The ICDF continues to have an important presence in the region in spite of a reduction in program activity. This is reflected by the training offered to participants of the second phase of the project involving the construction of ecological *Malena* stoves in the Municipality of La Asunta. It is also evidenced by training provided for the administration and maintenance of the new public bathroom in the Churiaca neighborhood of Irupana as well as by the hygiene and sanitary education campaigns carried out as part of the same project. In the months to come the ICDF will continue to provide training as needed in tandem with project implementation.

**Table 11. Number of trainees during the October – December quarter, by component and municipality**

MUNICIPIO	Componente		TOTAL
	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Económico	
Chulumani	6		6
Coripata	6		6
Coroico	6		6
Irupana	132		132
La Asunta	900	49	949
Palos Blancos	2		2
Varios YUN	15	4	19
Yanacachi	2		2
<b>Total general</b>	<b>1,069</b>	<b>53</b>	<b>1,122</b>

Throughout the LOP the ICDF has registered a total of 45,268 trainees. This figure indicates that, to date, the ICDF has reached 88 percent of the goal for this indicator as outlined in Modification 18.

## b. Intermediate Result 2

The ICDF's intermediate result 2 (IR.2):

**Economic Development is encouraged in the TC and the Yungas of La Paz**

### **IR 2.1 Indicator: Incremental sales**

**Title of the performance indicator:** Increases in sales generated by economic initiatives supported by the ICDF.

**Unit of Measure:** U.S. Dollars x 1,000

To date, with 4.7 million US dollars in increased sales, the ICDF has surpassed its goal for the LOP for this indicator. In spite of the transfer of the majority of its agricultural activities to the ARCo project in mid 2011, the ICDF has continued to measure sales generated by projects that were not transferred, such as the microenterprise activity in the Alto Beni and La Asunta regions. During the reporting period the ICDF recorded sales in the amount of \$174,985 USD which was primarily generated from ICDF-supported poultry farms and carpentry workshops.

### **IR 2.2 Indicator: Equivalent Employment**

**Title of the performance indicator:** Equivalent employment directly attributable to initiatives supported by the ICDF.

**Unit of Measure:** Equivalent employment

During the reporting period 54 equivalent jobs were created, mainly related to the construction of school infrastructures in Irupana and Palos Blancos. The methodology called for by the PMP for measuring and verifying the equivalent employment indicator results in potable water and sanitation projects creating the highest amount of equivalent jobs. Since no potable water and sanitation projects were completed during the reporting period, the goal for this indicator has not yet been reached. Major strides in reaching the ICDF's pre-established goals are foreseen once the potable water and sanitation projects currently being implemented in La Asunta and Palos Blancos are completed. To date, the ICDF has generated 4,348 equivalent jobs, mainly within the economic development component. This figure reflects 80 percent of the ICDF's goal for this indicator for the LOP.

**Table 11. Creation of equivalent jobs by component and sub-component, October - December 2011**

<b>Component</b>	<b>Subcomponent</b>	<b>Number of equivalent jobs</b>
Community Development	Education	19
	Community Infrastructure	21
	Sanitation	7
<b>Total Community Development</b>		<b>47</b>
Economic Development	Transportation infrastructure	7
<b>Total Economic Development</b>		<b>7</b>
<b>Total general</b>		<b>54</b>

### **IR 2.3 Indicator: Number of Hectares of Agricultural Crops**

**Title of the performance indicator:** Hectares of alternative crops or hectares under forest management plans targeted by SDE programs.

**Unit of Measure:** Hectares

The ICDF did not anticipate reporting new values for the hectares indicator as per Modification 18. As such the ICDF completed its reporting on verified hectares of crops cultivated under ICDF projects in the previous quarterly report. The total number of hectares cultivated under ICDF projects reached 2,058 for different crops cultivated in the TC (until 2009) and the Yungas. This figure is equivalent to 130 percent of the goals originally established for the LOP. The global results surpass what was expected, especially with regard to the development of new crops such as plantain, stevia and amaranth in the Yungas region.

### **c. Crosscutting Indicators**

The ICDF implements projects where measurable progress contributes to both IRs. These results are reported on through the filter of two transversal indicators: counterpart and projects that are working well after one year. In accordance with the ICDF PMP, counterpart is measured annually; as such this indicator will be reported on in the January-March reporting period. With regard to the projects that are working well after one year of implementation, during the reporting period field visits were conducted to monitor the progress of 21 projects.

During field visits monitoring and evaluation personnel verified that all 21 projects are operating under normal conditions and are functioning well. Where community development projects are concerned, the project participants are making use of the infrastructure and equipment and materials provided. Project participants are also taking the necessary measures to adequately maintain the infrastructure. For example, where basic services are involved, ICDF-supported community based organizations or committees are using economic revenue obtained from service fees towards maintenance and repair.

The ICDF contributes the success of such projects to the capacity building offered throughout the implementation process. This is especially the case for specialized training offered to project participants selected to occupy positions for the administration, operation and maintenance. Whether such project participants hold

positions on CAPYSs or school boards that were formed or strengthened by the ICDF, their sense of ownership over new infrastructures and their commitment to progress significantly increases the probability for the long-term sustainability.

## VI. LOOKING FORWARD

In accordance with the previously proposed timetable, the ICDF will continue construction on the following projects:

- Potable water system for San Miguel de Huachi
- Potable water system for the District of Remolinos
- San Antonio School
- Potable Water System for San José, Olivos, 21 de Agosto and Villa Camacho
- Sewage System for Siguani Grande

School furniture for the following municipalities will be delivered in the January – March quarter:

- La Asunta
- Alto Beni
- Palos Blancos

Over 2,000 students from schools in those municipalities will benefit from over 3,700 pieces of school furniture, including chairs, tables, bench seats, desks, tripods and bookcases among other supplies.

In La Asunta, the Rene Barrientos Ortuño School which includes 12 classrooms and both girls and boys bathrooms, is scheduled to be handed over to the community and inaugurated by both USAID and the VCDI, during the next reporting period. It is expected that the delivery of school furniture for La Asunta and the Rene Barrientos Ortuño School will be orchestrated in the same event. The multi-grade classroom in Churubamba, located in the Municipality of Irupana will also be completed in the coming quarter.

In regards to administrative procedures, the ICDF expects to scale back roughly a third of its personnel per quarter over the next three reporting periods. This process is in accordance with the obligated budget as well as work flow projections. Disposition of fixed assets will be a continuing process which will also be phased over the following three quarters as it too will correspond to a gradual reduction in project activity.

*ANNEXES*

*ANNEX II Success Story*

## Lilium Success Story

The Taquesi valley extends from the arid Andean highlands to the humid subtropics as it cuts through the Southern Yungas mountain gorge. The sleepy town of Yanacachi lies nestled within, approximately 55 km away from the city of La Paz. The area's steep topography provides dramatic cliff-side views for hikers and passersby en route to the more populated centers of Chulumani and Irupana. But for those who live alongside one of the world's most dangerous roads, this improbable setting is home and they eke out a living from what the land can produce. For locals, extreme variations in altitude and the resulting microclimates make agricultural enterprise unpredictable and difficult at best. Fortunately such climate fluctuations can be ideal for the demands inherent to floriculture and those who take a closer look will notice the mixed hues of lavender, white and orange that dot the misty piedmont. These vivid colors come from different varieties of agapanthus, hydrangea and fragrant lilies among other flowers that provide a steady source of income for area inhabitants.



The residents of Yanacachi's outlying communities have long been involved in floriculture. Over the last four years they have discovered advantages specific to lily production thanks to an ICDF-supported intervention entitled *Generation of Jobs and Sales within the Flower Production Chain*. Such advantages include a year-round market for the species' many varieties and high prices per cut stem. Local farmers had prior experience marketing *azucena*, a wild flower similar to Oriental and Asiatic lilies in appearance and physiological behavior. Unfortunately most of the area's *azucenas* fell victim to blight and harvesting what few stems remain is no longer cost effective for Yanacachi's flower producers. Intrigued by its similarity to their native *azucena* and to the variations in color and size, local producers developed an interest in lily production and requested support from institutions committed to development in the region.

In response to requests for assistance, in 2008 the ICDF coordinated with *Fundación Taquesi*, a development organization based in the Municipality of Yanacachi, to support 120 flower producers from the communities of Sakahuaya, Florida, Sirupaya, Pichu, Chaco, and Yerbani in their efforts to begin lily production. Through workshops using the field school training methodology, the ICDF gave the project participants instruction in the technical aspects of lily production. Such workshops also covered market trends and explained the positive aspects of lily production including those that benefit quality of life and the environment. Quintin Mamani, president of the association of floriculturists, comes from the low-lying community of Sakahuaya and has only positive things to say about what lily production has meant for his family and neighbors. “*In truth, this project aims to improve all of our lives, and almost 90 percent of the project participants are women. Lily production doesn't require big spaces, it doesn't require that we burn our forests nor that we cut down trees. The lily parcels are close to our homes and because the daily chore of caring for the flowers is not too strenuous, it favors women and the elderly*”.





To begin implementing the project, the ICDF co-financed activities and materials that would allow the 120 individuals to begin lily production. After four months all project participants began selling lily stems to markets in La Paz. Mr. Mamani looks pleased as he calculates figures offhand for the community of Sakahuaya, “*Our community has 18 lily producers. As a group we put about 40 to 50 packages together each harvest week; each package has ten stems and we sell everything in La Paz.*”

The production cycle in Sakahuaya permits harvesting to occur during 21 weeks out of the year. Since each stem sells for an average of US\$1.30, during these weeks flower sales result in an income of up to US\$36.00 per week for each of the community’s 18 lily producers. Lucia Lopez is also from Sakahuaya and is appreciative of how the boost in her income from lily production has helped her family “*I have four sons who study in La Paz; the extra money we make from selling lilies helps us pay for their food and transportation so they can focus on their studies.*”



Project participants also received important support through the ICDF volunteer program. In the project’s third year, Judith Freeman of The Lily Garden, one of the foremost lily production enterprises in the United States, lent her expertise to the project participants during a three-week long volunteer consultancy. As a means of improving project sustainability, during her time in the field she taught producers how to reproduce lilies from scaled lily bulbs and from seeds. Mrs. Lopez is content with the lily propagation skills she has acquired, “*The technical assistance was great. I have had new lilies come up from seeds, mostly of the Asiatic variety.*” Ms. Freeman also gave project participants important tips on preventing viral diseases and others such as botrytis and bulb rot on their parcels.

As part of its exit strategy, the ICDF gradually phased out its share of the project’s financing while the cash counterparts provided by the lily producers increased with each production cycle. As a logical next step to having taken ownership of the project, in 2011 the lily producers accomplished the important task of formalizing their association. As a legal entity the group is now called the *Yanaptasiñani Integral Association of Floriculturists of Yanacachi*. Mr. Quispe looks proud as he explains the meaning of the association’s name, “*Yanaptasiñani is an Aymara word that means mutual assistance. We demonstrate teamwork by helping each other. This is why we gave our association this name*”. The association’s members have shown their dedication to lily production by attending regular workshops throughout the duration of the four-year project and by doing the work necessary to keep their lily parcels healthy and productive. By choosing a word synonymous with mutual support for the name of their association, its members are constantly reminded of their co-commitment to helping their communities move forward through enterprise and solidarity.

***ANNEX III PROJECT MATRIX***

***Annex III. Project Matrix***

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
1	TC0002	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	21 comunidades	Provisión Mobiliario Unidades Educativas	CONCLUIDO	10.518
2	TC0003	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Chimore	Senda D,Puerto Aurora,Cesarzama,San Andres,Tacuaral Entre Rios,6 de Agosto,Senda B	Iluminación 7 Canchas Polifuncionales	CONCLUIDO	13.828
3	TC0004	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado de Ivirgarzama	Diseño: Construcción Parque Infantil	CONCLUIDO	282
4	TC0005	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Entre Rios	Centro Poblado Bulo Bulo	Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo	CONCLUIDO	16.880
5	TC0006	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	4 de Abril,Monte Rico,San Luis	Provisión Mobiliario Unidades Educativas (3)	CONCLUIDO	2.958
6	TC0007	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Majo Pampa e Ibiruzu Bajo	Construcción Defensivos de Oroyas	CONCLUIDO	10.125
7	TC0046	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Uriuta	Diseño: Unidad Educativa Uriuta	CONCLUIDO	251
8	TC0047	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Eterazama	Diseño: Escuela Mixta Eterazama	CONCLUIDO	248
9	TC0148	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Chimore (Convenio TAC)	Mejoramiento infraestructura TAC	CONCLUIDO	117.840
10	TC0179	Comunitario	Capacitación comunitaria	Tropico Cbba	Varios TC	Varios TC	Formación de líderes CAF/IDEA	CONCLUIDO	7.158
11	TC0187	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Fortalecimiento al Desarrollo Turístico de Villa Tunari	CONCLUIDO	17.523
12	TC0194	Comunitario	Capacitación comunitaria	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Apoyo a pequeñas iniciativas democráticas de la Sociedad Civil	CONCLUIDO	3.970
13	TC0202	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Dotación de mobiliario y equipamiento - Central de Comunidades de Ivirgarzama	CONCLUIDO	4.376
14	TC0203	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirza	Dotación de mobiliario - Central Valle Ivirza	CONCLUIDO	2.482
15	TC0204	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de mobiliario y equipamiento - FSCCT	CONCLUIDO	9.007
16	TC0205	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Chimore	Dotación de mobiliario y equipamiento - Federación única de Centrales Unidas	CONCLUIDO	9.620

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
17	TC0208	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Refacción y Ampliación Sede Central 1° de Mayo en Valle Tunari	CONCLUIDO	3.951
18	TC0209	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Israel	Dotación de mobiliario escolar para 6 aulas "Unidad Educativa Israel"	CONCLUIDO	5.795
19	TC0211	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Entre Ríos	Entre Ríos	Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - Fase 1	CONCLUIDO	298
20	TC0217	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Senda 6	Construcción viviendas para maestros Unidad Educativa Hernán Siles de Senda 6	CONCLUIDO	10.501
21	TC0218	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Construcción oficinas y escenario en la Sede de la Central Puerto Villarroel	CONCLUIDO	5.201
22	TC0223	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa 14 de septiembre	Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón Bolívar	CONCLUIDO	239
23	TC0294	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Estaño Palmito	Dotación de mobiliario escolar - Unidad Educativa Estaño Palmito	CONCLUIDO	2.077
24	TC0415	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Lauca Ñ	Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas	CONCLUIDO	3.788
25	TC0417	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Poblado Shinahota	Mobiliario Escolar, UE G. Busch A	CONCLUIDO	2.609
26	TC0419	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Villa Barrientos	Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre	CONCLUIDO	4.288
27	TC0425	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Vida	Equipamiento del Internado Unidad Educativa comunidad indígena Nueva Vida	CONCLUIDO	19.626
28	TC0430	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Vía Recuate,Islas - Solteritas,Capernahu,Nueva Capernahu,Santa Isabel,Puerto las Flores,Tres Bocas	Dotación de menaje de cocina y víveres – Comunidades indígenas	CONCLUIDO	4.578
29	TC0431	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Bélén, Capinota,Lagunillas,Pampa Grande,2 de Agosto A,1° de Mayo,Ana Rancho,Palmeras,Estibadores,2º Ana Rancho,Indígenas Yuracaré,Norte Islas	Dotación de víveres – Central Puerto Villarroel	CONCLUIDO	13.695
30	TC0432	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Construcción defensivos para inundaciones y drenaje en el Centro Poblado de Puerto Villarroel	CONCLUIDO	16.256
31	TC0440	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de mobiliario, equipamiento, menaje cocina y capacitación a educadoras	CONCLUIDO	16.344

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
32	TC0499	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de UNAPAL	CONCLUIDO	95.258
33	TC0500	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Varios TC	Varios	Plan de emergencia - Equipamiento para el control de dengue del Trópico de Cochabamba	CONCLUIDO	10.016
34	TE0001A	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	4 de Abril	Refacción Unidad Educativa "4 de Abril"	CONCLUIDO	5.126
35	TE0001B	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Ibuelo	Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo"	CONCLUIDO	7.150
36	TE0001C	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	San Isidro	Refacción Núcleo Educativo "San Isidro"	CONCLUIDO	5.126
37	TE0001D	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Centro Urbano Shinaota	Galpón Metálico Nucleo Educativo "German Bush A"	CONCLUIDO	19.657
38	TE0001E	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Centro Urbano Shinaota	Refacción Galpón Unidad Educativa "German Bush B"	CONCLUIDO	7.227
39	TE0018	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	San Luis	Reposición Terraplén Puente Méndez	CONCLUIDO	2.889
40	TE0149	Comunitario	Varios	Tropico Cbba	Yapacani	Varias	Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz)	CONCLUIDO	24.480
41	TE0150	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Varios TC	Villa Tunari y Shinaota	Construcción de atracaderos para pontones	CONCLUIDO	38.552
42	TE0151	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Carretera Cbba - Sta Cruz	Restitución paso vehicular Km. 121	CONCLUIDO	60.857
43	TE0176	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Varios TC	5 comunidades	Campaña vacunación contra la fiebre aftosa 13vo y 14vo Ciclo	CONCLUIDO	122.822
44	TE0201	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Varios TC	Varios TC	Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Palmito el el Trópico de Cochabamba - Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cbba.	CONCLUIDO	497.962
45	TE0206	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de máquinas industriales de coser y mobiliario- (FSMCT)	CONCLUIDO	10.067
46	TE0213	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Carrasco Tropical	Construcción Empacadora de Banano y Piña en Tamborada A-3 (Tipo B)	CONCLUIDO	9.244
47	TE0214	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Carrasco Tropical	Dotación de máquinas de coser, mobiliario y curso de capacitación -Central de Mujeres Valle Ivirza	CONCLUIDO	2.979
48	TE0215	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Tamborada A-3	Intalación de 700 m de cable vía y una Compuerta "Tamborada A-3"	CONCLUIDO	9.137
49	TE0219	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Mariposas	Contrucción Mercado de Frutas en Centro Poblado de Mariposas	CONCLUIDO	19.670

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
50	TE0222	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Esperanza	Centro de Acopio de Flores y Capacitacion para Mujeres	CONCLUIDO	17.841
51	TE0224	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Santa Fe	Construcción del Puente sobre el río Chua Mayu (San Isidro) en Santa Fe	CONCLUIDO	19.805
52	TE0226	Economico	Transformacion	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Jugos La Esperanza UNAGRUP II	CONCLUIDO	4.042
53	TE0291	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Sipe Sipe	Construcción del Puente Vehicular sobre el rio el Conde Arroyo 2 en 5 Esquinas	CONCLUIDO	14.042
54	TE0293	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Chimore	NA	Capacitacion en adminstración, contabilidad básica y elaboración de perfil de proyectos- Federaciones de varones y de Mujeres, Trópico de Cochabamba	CONCLUIDO	7.950
55	TE0298	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Entre Ríos,Isarzama,Manco Kapac	Apoyo a la Producción Apícola	CONCLUIDO	2.530
56	TE0299	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Machu Pijchu	Apoyo a la producción de Banano	CONCLUIDO	4.871
57	TE0300	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Los Amigos,Palmar, San Miguel	Apoyo a la producción de Piña	CONCLUIDO	23.224
58	TE0301	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Entre Rios	Entre Ríos,Manco Kapac,Río Blanco	Apoyo a la producción pecuaria	CONCLUIDO	7.007
59	TE0302	Economico	Transformacion	Tropico Cbba	Entre Rios	Ivirgarzama	Apoyo a AUPAII VII	CONCLUIDO	3.465
60	TE0315	Economico	Transformacion	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Vida	Construcción de Cartonera para Empacadora de Banano	CONCLUIDO	8.083
61	TE0316	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Nueva Estrella	Actividades Complementarias de Potenciamiento a proyectos Piscícolas	CONCLUIDO	8.254
62	TE0317	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Shinaota	2º Valle Hermoso,3 Valle Hermoso,Bolívar	Apoyo a la cadena productiva de piña	CONCLUIDO	26.287
63	TE0321	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Dorado Chico	Mejoramiento de Camino Dorado Chico - Florida	CONCLUIDO	13.426
64	TE0322	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Santibañez	Mantenimiento del camino 5 Esquinas - Santibáñez	CONCLUIDO	9.942
65	TE0411	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Arenales	Apoyo a la producción de cultivos anuales (Puente Arenales 11 m)	CONCLUIDO	20.568
66	TE0412	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Bolívar	Apoyo a las cadenas productivas de banano, palmito y cítricos (Puente Bolívar 7 m)	CONCLUIDO	7.168
67	TE0413	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Dorado Chico	Apoyo a la cadena productiva de banano (Puente Dorado Chico)	CONCLUIDO	17.654

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
68	TE0414	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Villa Victoria	Apoyo a la cadena productiva de piña, banano y palmito (Puente Villa Victoria 8.5 m )	CONCLUIDO	17.848
69	TE0420	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Senda 2	Mejoramiento y conclusion ambientes de UNABANA	CONCLUIDO	9.462
70	TE0421	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	San Francisco,San Isidro,Santa Rosa Ñ ,Villa Victoria	Apoyo a la cadena productiva de cítricos (Incremento de ventas y empleos)	CONCLUIDO	12.280
71	TE0422	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Generación de empleos y venta en la cadena productiva de Palmito UNAGRUP II	CONCLUIDO	51.232
72	TE0434	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Capernau,Nueva Capernau,Puerto Las Flores,Santa Isabel,Tres Bocas,Tres Islas,Vía Recuete	Generación de ingresos para familias afectadas por inundaciones y establecimiento de plantaciones forestales y prácticas de agroforesteria	CONCLUIDO	11.739
73	TE0435	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Fortalecimiento de la Unidad de Turismo de la Alcaldía de Villa Tunari	CONCLUIDO	2.964
74	TE0436	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Construcción señalización urbana Villa Tunari	CONCLUIDO	3.171
75	TE0438	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Mejoramiento de los atractivos, actividades y servicios turísticos existentes	CONCLUIDO	2.171
76	TE0439	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	Varios	Cursos de capacitación en costura industrial para las federaciones TC	CONCLUIDO	6.256
77	TE0442	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Villa Tunari	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Villa Tunari	CONCLUIDO	25.617
78	TE0443	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Chimore	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Chimore	CONCLUIDO	2.940
79	TE0444	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Shinaota	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Shinahota	CONCLUIDO	3.477
80	TE0445	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Puerto Villarroel	CONCLUIDO	15.257
81	TE0446	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Entre Ríos	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Entre Ríos	CONCLUIDO	52.064
82	TE0452	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente 6)	CONCLUIDO	19.895
83	TE0453	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente Argentino)	CONCLUIDO	19.277
84	TE0498	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención de brotes de fiebre aftosa en el Trópico de Cochabamba.	CONCLUIDO	81.759

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
85	TR0121	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Chimore	Trinidadcito (# 1)	Diseño: Construcción posta salud y equipamiento	CONCLUIDO	1.175
86	TR0122	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Betania	Construcción 2 aulas, baños y mobiliario	CONCLUIDO	22.666
87	TR0123	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Monte Sinai	Construcción 2 aulas, baños y mobiliario	CONCLUIDO	21.028
88	TR0124	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Puerto Victoria	Construcción aula multigrado y batería baños	CONCLUIDO	13.812
89	TR0125	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado Valle Sacta (# 1)	Mobiliario Colegio Juan Pablo II	CONCLUIDO	6.922
90	TR0126	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Senda 5 (# 1)	Mobiliario UE San Francisco de Asis	CONCLUIDO	2.405
91	TR0127	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Calle peatonal	CONCLUIDO	23.803
92	TR0128	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Mercado Municipal	CONCLUIDO	63.230
93	TR0129	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Complejo deportivo recreacional	CONCLUIDO	42.185
94	TR0130	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Poblado de Shinaota (# 1)	Diseño final "Terminal de buses" - Shinaota	CONCLUIDO	16.445
95	TR0132	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado de Ivirgarzama (# 1)	Construcción Guardería	CONCLUIDO	59.270
96	TR0170	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Entre Rios	Barrio Imperial	Cubierta e iluminación UE Octavio Pastrana	CONCLUIDO	48.514
97	TR0171	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Chimore	Diseño Construcción y equip. taller artesanal	CONCLUIDO	2.598
98	TR0177	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Shinaota	Shinahota	Diseño Carpintería Comunitaria	CONCLUIDO	1.958
99	TR0178	Comunitario	Agua Potable	Tropico Cbba	Entre Rios	23 comunidades,2 urb. (# 2)	Construcción Sistema Agua Potable 4 centrales	CONCLUIDO	80.433
100	TR0198	Comunitario	Agua Potable	Tropico Cbba	Entre Rios	Sindicato 1ra Volcan	Conclusión sistema de agua potable	CONCLUIDO	18.785
101	YC0008A	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Alto Beni	Boopi Sararia	Implementación de UHFs (201 UHFs)	CONCLUIDO	456.388
102	YC0008B	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Sector Boopi / Sapecho	Implementación de UHFs (259/97 UHFs)	CONCLUIDO	568.634
103	YC0008B2	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	Zona tradicional	Implementación de UHFs	CONCLUIDO	76.027

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
104	YC0009	Comunitario	Salud	Yungas	Yanacachi	Kollana Uta	Vivienda Centro de Salud Kollana Uta	CONCLUIDO	14.906
105	YC0011	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	Arapata	Ampliación Centro de Salud - Arapata	CONCLUIDO	17.954
106	YC0013	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos	CONCLUIDO	70.301
107	YC0014	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi	CONCLUIDO	8.838
108	YC0015	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Chulumani - Chulumani	Equipamiento Mob. Municipio Chulumani	CONCLUIDO	13.941
109	YC0017	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio Coripata	CONCLUIDO	25.218
110	YC0019	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Varios YUN	Varias	Evaluación Técnica SAP SERVIR	CONCLUIDO	5.391
111	YC0020	Económico	Servicios	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Telecentro para Municipio	CONCLUIDO	66.928
112	YC0022	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Refacción Colegio Miguel Mercado	CONCLUIDO	42.582
113	YC0023	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Ocobaya - Ocobaya	Conclusión Colegio de Ocobaya	CONCLUIDO	19.174
114	YC0024	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Tajma - Tajma	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	88.441
115	YC0025	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Motoncoro	Construcción Aulas Multigrado Motoncoro	CONCLUIDO	11.029
116	YC0026	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Construcción Viviendas p/ Profesores N Escolar	CONCLUIDO	22.639
117	YC0027	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Suiquimilamiani	Construcción de Aulas y Viviendas p/maestro	CONCLUIDO	20.978
118	YC0028	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	San Juan	Centro de Salud - San Juan	CONCLUIDO	42.202
119	YC0029	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Huayrapata	Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata	CONCLUIDO	3.570
120	YC0030	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	San Agustín	UE San Agustín	CONCLUIDO	89.177
121	YC0031	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Mina Chojlla	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	133.334
122	YC0032	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	111.088
123	YC0033	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	99.914
124	YC0034	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Chiquina	Diseño: Escuela Multigrado Chiquina	CONCLUIDO	72
125	YC0035	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Financiamiento Puente Mancomunidad Yungas	CONCLUIDO	3.860
126	YC0036	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Cutusuma - Montequilla	Centro de Capacitación Productiva Montequilla	CONCLUIDO	22.650
127	YC0037	Comunitario	Infraestructura	Yungas	Chulumani	Huancane - Huancane	Empedrado calle al Colegio Huancane	CONCLUIDO	17.314

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
			comunitaria						
128	YC0038	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Ocobaya - Ocobaya	Mejoramiento Mingitorio Ocobaya	CONCLUIDO	14.244
129	YC0039	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Tajma - Villa Remedios	Const. Baño para la Escuela Villa Remedios	CONCLUIDO	14.014
130	YC0040	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani - Zona Cancha	Mejoramiento Mingitorio cerca cancha Chulumani	CONCLUIDO	11.043
131	YC0041	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani - Zona Junin	Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin	CONCLUIDO	47.313
132	YC0042	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Rio Blanco - Rio Blanco	Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa Río Blanco	CONCLUIDO	34.565
133	YC0043	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani - Chulumani	Refacción UE Kinder Chulumani	CONCLUIDO	36.402
134	YC0044	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Santa Getrudis	Construcción aulas UE Santa Gertrudis	CONCLUIDO	17.558
135	YC0045	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Dorado Grande	Construcción aulas UE Dorado Grande	CONCLUIDO	32.331
136	YC0048	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Huancane - Tongobaya	Centro de Capacitación	CONCLUIDO	12.742
137	YC0049	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Iquicolo	Instalación Red Matriz Agua Potable	CONCLUIDO	9.608
138	YC0050	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Chacala	Mejoramiento Sistema Agua Potable	CONCLUIDO	11.054
139	YC0051	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Santa Rosa de Lima	Ampliación Agua Potable	CONCLUIDO	33.193
140	YC0058	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Huancane - Huancane	Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. Cristóbal	CONCLUIDO	49.476
141	YC0060	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Santa Rosa	Construcción Escuela Multigrado Santa Rosa	CONCLUIDO	18.877
142	YC0083	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coripata	Coripata	Apoyo al interyungueño de fútbol 2006	CONCLUIDO	4.067
143	YC0102	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Protección y conservación de microcuencas FCDI	CONCLUIDO	69.954
144	YC0104	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Reposición obras piscina y fortalec. municipal	CONCLUIDO	47.227
145	YC0105	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento CAPYS de sistemas SERVIR	CONCLUIDO	79.573
146	YC0107	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos de Coripata y Arapata	CONCLUIDO	13.770
147	YC0134	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Ampliación Colegio Martín Cárdenas	CONCLUIDO	203.091
148	YC0137	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Tocaña	Construcción obras complem. centro cultural	CONCLUIDO	65.702
149	YC0138	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano	CONCLUIDO	169.315

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
150	YC0146	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Conclusión sede social Piquendo	CONCLUIDO	25.621
151	YC0147	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Canalización río Nilo - Carmen Pampa	CONCLUIDO	83.408
152	YC0152	Economico	Fortalecimiento institucional	Yungas	Alto Beni	Nueva Kollasuyo,San Antonio,Sararía	Reforzamiento al Funcionamiento del Modelo de Gestión y Productivo de los Internados de San Antonio, Sararía y Nueva Kollasuyo	CONCLUIDO	18.985
153	YC0162	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coroico	Varios	Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico)	CONCLUIDO	17.478
154	YC0163	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varios	Fort. institucional (PDM Alcaldía P. Blancos)	CONCLUIDO	21.563
155	YC0164	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Formación de líderes CAF/IDEA	CONCLUIDO	39.492
156	YC0165	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación funcionarios públicos de los Yungas	CONCLUIDO	32.700
157	YC0166	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varias	Apoyo a interinstitucional Alto Beni "IIAB"	CONCLUIDO	29.891
158	YC0167	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de visibilidad	CONCLUIDO	41.340
159	YC0168	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Intervención en UAC-CP	CONCLUIDO	320.811
160	YC0169	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Tocaña	Conclusión obra fina posta de salud	CONCLUIDO	21.007
161	YC0172	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Tocaña	Desarrollo turístico comunitario	CONCLUIDO	29.799
162	YC0173	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Varios YUN	Varias	Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado	CONCLUIDO	39.273
163	YC0181	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Computadora Braile UE para no videntes)	CONCLUIDO	4.464
164	YC0182	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Alto Beni	Fortalecimiento estra. comunicación Alto Beni	CONCLUIDO	25.031
165	YC0186	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Brecha H	Dotación Escuela Técnica Sup.	CONCLUIDO	1.840
166	YC0189	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación bachilleres	CONCLUIDO	1.430
167	YC0190	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	varias	Apoyo actividades deportivas Yungas	CONCLUIDO	8.845
168	YC0192	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo Festival Folklórico Internacional Coroico 2007	CONCLUIDO	4.050

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
169	YC0193	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Apoyo a pequeñas Iniciativas Democráticas de la Sociedad Civil en Yungas	CONCLUIDO	10.448
170	YC0200	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	varias	Monitoreo alcantarillado Alto Beni	CONCLUIDO	1.794
171	YC0287	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	La Asunta	Varias	Procesos de priorizacion de proyectos en de la IL-43	CONCLUIDO	6.109
172	YC0288	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Enlasetado Av. Principal de Palos Blancos	CONCLUIDO	3.471
173	YC0303	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Riό Blanco	Sistema de Agua Potable Rio Blanco	CONCLUIDO	134.437
174	YC0305	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Conclusión Obra fina 1er piso Colegio Bartolina Sisa de Rio Blanco (Fase 2)	CONCLUIDO	48.452
175	YC0306	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	El Colpar	Construcción Plaza Principal - El Colpar	CONCLUIDO	40.194
176	YC0307	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Conclusión Centro de Capacitación- Palma Pampa	CONCLUIDO	1.125
177	YC0308	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chorrillo	Construcción Polifuncional, y .Vivienda para un maestro	CONCLUIDO	480
178	YC0309	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Anacurí	Construcción complejo deportivo turistico	CONCLUIDO	186.579
179	YC0310	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	San José de Peri	Conclusión Centro de Capacitación - San José de Peri - 1ra fase	CONCLUIDO	115.421
180	YC0311	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Huaycuni	Conclusión Centro de Capacitación - Huaycuni	CONCLUIDO	127.887
181	YC0327	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Villa El Porvenir	Construcción Aula Multigrado Villa El Porvenir-Central Pto.Unido	CONCLUIDO	24.921
182	YC0328	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Antonio	Construcción Aula Multigrado San Antonio- Central Pto.Unido	CONCLUIDO	24.638
183	YC0329	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Pablo	Construcción Multifuncional San Pablo - Central Cotapata	CONCLUIDO	29.646
184	YC0330	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Cotapata	Dotación 7 Computadoras para Colegio y Generador E.Eléctrica - Central Cotapata	CONCLUIDO	17.610
185	YC0331	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto Rico Histórico	CONCLUIDO	1.270
186	YC0357	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de visibilidad de las actividades del FCDI y del Programa de Desarrollo Alternativo Integral	CONCLUIDO	58.572
187	YC0426	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Auquisamana	Conclusion Obra Fina Iglesia Auquisamaña	CONCLUIDO	27.674

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
188	YC0427	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Marquiviri	Construcción de 2 Viviendas y Batería de Baños Marquiviri	CONCLUIDO	23.902
189	YC0457	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Yanamayu	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Yanamuyu I-II - La Asunta	CONCLUIDO	4.554
190	YC0458	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a Jóvenes de Fed. La Asunta- La Asunta	CONCLUIDO	741
191	YC0459	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Chamaca	Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a Jóvenes de Fed. Chamaca- La Asunta	CONCLUIDO	11.035
192	YC0460	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Varios	Capacitación en Enfermería - Becas Magíster UAC-CP	CONCLUIDO	14.727
193	YC0461	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Capacitación Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Sapecho B- Alto Beni	CONCLUIDO	4.088
194	YC0462	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Capacitación Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Palos Blancos B- Alto Beni	CONCLUIDO	5.604
195	YC0463	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Irupana	Chicaloma	Capacitación Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Chicaloma- Irupana	CONCLUIDO	2.631
196	YC0464	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Irupana	Irupana	Capacitación Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E 5 de Mayo- Irupana	CONCLUIDO	2.631
197	YC0465	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Cruz Loma	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Téc. Humanístico Cruz Loma- Coroico	CONCLUIDO	2.632
198	YC0466	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Reyes Ortiz - Coroico	CONCLUIDO	2.631
199	YC0467	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Chulumani	Chulumani	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Miguel Mercado - Chulumani	CONCLUIDO	2.722
200	YC0468	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Chulumani	Huancane	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E San Cristobal Huancane - Chulumani	CONCLUIDO	2.636
201	YC0469	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Félix Ernesto Moscoso - Yanacachi	CONCLUIDO	2.631
202	YC0470	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Yanacachi	La Chojilla	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Jorge Zalles- Chojilla	CONCLUIDO	2.631
203	YC0471	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa- Coripata	CONCLUIDO	2.631
204	YC0472	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coripata	Arapata	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Rosemary Barrientos-Arapata- Coripata	CONCLUIDO	2.631
205	YC0473	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Cotapata	Capacitación a Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Cotapata - La Asunta	CONCLUIDO	5.776
206	YC0474	Comunitario	Capacitación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo -	CONCLUIDO	5.776

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
			comunitaria				U.E René Barrientos Ortuño - La Asunta		
207	YC0475	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Adventista - La Asunta	CONCLUIDO	5.884
208	YC0476	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Charia	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Charia - La Asunta	CONCLUIDO	5.884
209	YC0477	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Calzada	Capacitación a Jóvenes en D.Humano y Liderazgo - U.E Mercedes- La Calzada - La Asunta	CONCLUIDO	4.661
210	YC0478	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Santa Rosa - La Asunta	CONCLUIDO	4.714
211	YC0479	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	La Asunta	Estrategia de Comunicación La Asunta	CONCLUIDO	161.034
212	YC0482	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	1ro de Julio	Construcción Unidad Educativa y Vivienda para Maestro	CONCLUIDO	43.384
213	YC0483	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Incahuara	Construcción Unidad Educativa y Vivienda para Maestro	CONCLUIDO	47.318
214	YC0484	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Arapata	Conclusión de la Unidad Educativa Franz Tamayo	CONCLUIDO	73.136
215	YC0485	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	San Joaquin	Relleno Sanitario - Coroico	CONCLUIDO	241.764
216	YC0492	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	La Asunta	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina	CONCLUIDO	27.340
217	YC0493	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	PuertoRico	Sistema de agua potable - Puerto Rico	CONCLUIDO	144.270
218	YC0494	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Cotapata	Sistema de agua potable - Cotapata	CONCLUIDO	130.759
219	YC0496	Comunitario	Salud	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de emergencia / Equipamiento para el control dengue.	CONCLUIDO	13.467
220	YC0501	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gerencia de funcionarios públicos	CONCLUIDO	14.322
221	YC0502	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Chicaloma	Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua de la Población de Chicaloma.	CONCLUIDO	25.600
222	YC0503	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Yanacachi	Chajro	Diseño Muros Defensivos en el Río Chajro	CONCLUIDO	602
223	YC0504	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el idioma inglés	CONCLUIDO	10.000
224	YC0506	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Paraiso	Construcción del sistema de alcantarillado de Paraiso	CONCLUIDO	144.832
225	YC0507	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Milluguaya	Construcción del sistema de agua potable en Milluguaya	CONCLUIDO	100.376
226	YC0508	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolívar II	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar II	CONCLUIDO	14.108

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
227	YC0509	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolívar III	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III	CONCLUIDO	14.281
228	YC0510	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolívar IV	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV	CONCLUIDO	29.635
229	YC0511	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar Chulumani.	CONCLUIDO	7.585
230	YC0512	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	Bolívar	Rehabilitación de la hidroeléctrica de Chamaca	CONCLUIDO	4.687
231	YC0513	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Bolívar	Diseño del sistema de agua potable para la Central Bolívar	CONCLUIDO	3.457
232	YC0515	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Dotación mobiliario ADEPCOCA	CONCLUIDO	6.227
233	YC0516	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Provisión de materiales para la construcción de comedor de la UAC-CP	CONCLUIDO	33.757
234	YC0519	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia San Pedro	Construcción de la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la comunidad de San Pedro	CONCLUIDO	21.153
235	YC0520	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Villa El Carmen	Construcción de la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la comunidad de Villa El Carmen	CONCLUIDO	16.787
236	YC0521	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Tupiza A	Construcción de la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la población de Tupiza A	CONCLUIDO	42.921
237	YC0522	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Tupiza B	Diseño Final y construcción de la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la Población de Tupiza B.	CONCLUIDO	489
238	YC0523	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Batallas	"Construcción de obra de toma y aducción para el sistema de agua potable de la comunidad de Batallas"	EJECUCIÓN	8.323
239	YC0524	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Santa Ana	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Santa Ana	CONCLUIDO	3.957
240	YC0525	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Yuni Grande	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Yuni Grande	CONCLUIDO	1.522
241	YC0526	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Uquina	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Uquina	CONCLUIDO	1.225
242	YC0527	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Silala	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Silala	CONCLUIDO	1.244
243	YC0528	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Yanamayo	Refacción del Sistema de agua potable Yanamayo	CONCLUIDO	7.026
244	YC0529	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Comunidad Cajones	Refacción del Sistema de agua potable Cajones	CONCLUIDO	4.162

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
245	YC0530	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	San Felipe	Refacción del Sistema de agua potable San Felipe	CONCLUIDO	9.093
246	YC0531	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de Agosto	Complementación del Sistema de Agua Potable 21 de Agosto	CONCLUIDO	10.244
247	YC0532	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Refacción del Sistema de agua potable Santa Rosa	CONCLUIDO	9.649
248	YC0533	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Los Olivos	Refacción Sistema de agua potable Los Olivos	CONCLUIDO	28
249	YC0534	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Refacción sistema de agua potable Palos Blancos	CONCLUIDO	5.838
250	YC0535	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Comunidad Huayrapata	Refacción Sistema de agua potable Huayrapata	CONCLUIDO	3.808
251	YC0536	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Bajo Loa	Refacción Sistema de agua potable Bajo Loa	CONCLUIDO	4.487
252	YC0537	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Quilasa	Refacción Sistema de agua potable - Quilasi	CONCLUIDO	2.232
253	YC0538	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Cuchumpaya	Refacción Sistema de agua potable - Cuchumpaya	CONCLUIDO	6.593
254	YC0539	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Comunidad San Felix	Construcción sistema de agua potable San Félix – Dorado Chico – Dorado Grande.	CONCLUIDO	22.459
255	YC0540	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Dorado Grande	Construcción sistema de agua potable Dorado Chico – Dorado Grande.	CONCLUIDO	16.686
256	YC0541	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Coroico	Equipamiento complementario del hospital básico de Coroico	CONCLUIDO	31.059
257	YC0542	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento complementario hospital básico de Palos Blancos	CONCLUIDO	36.865
258	YC0543	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario clínico y complementario del Centro de Salud de La Asunta	CONCLUIDO	59.025
259	YC0544	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. Chamacas)	CONCLUIDO	13.991
260	YC0545	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. La Asunta)	CONCLUIDO	15.890
261	YC0546	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	Coripata	Equipamiento clínico complejo para el hospital básico de Coripata	CONCLUIDO	26.413
262	YC0547	Comunitario	Salud	Yungas	Irupana	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y administrativo para cuatro establecimientos de salud de Irupana	CONCLUIDO	9.901
263	YC0548	Comunitario	Salud	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Equipamiento de mobiliario clínico y equipo básico para el puesto de salud de Chakala	CONCLUIDO	1.311

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
264	YC0549	Comunitario	Salud	Yungas	Chulumani	Chulumani	Equipamiento de mobiliario clínico para 3 establecimientos de salud.	CONCLUIDO	35.232
265	YC0550	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Varios	Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos educativos - Coroico	CONCLUIDO	35.370
266	YC0551	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Varios	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos – Palos Blancos	CONCLUIDO	29.717
267	YC0552	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varias	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos, Fed. La Asunta	CONCLUIDO	41.455
268	YC0553	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos, Fed. Chamaca	CONCLUIDO	49.885
269	YC0554	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Varios	Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos educativos, Coripata	CONCLUIDO	27.009
270	YC0555	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Varios	Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos educativos, Irupana	CONCLUIDO	14.676
271	YC0556	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Varios	Equipamiento mobiliario para 6 establecimientos educativos - Yanacachi	CONCLUIDO	5.384
272	YC0557	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Varios	Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos educativos - Chulumani	CONCLUIDO	10.901
273	YC0558	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Comunidad San Pedro Zona "C"	Construcción de alcantarillas tramo San Pedro C - La Florida	CONCLUIDO	7.188
274	YC0559	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Comunidad Pichari	Construcción de alcantarillas tramo Pichari - Nogalani - 10 de Febrero	CONCLUIDO	17.979
275	YC0578	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Campana de salud dental en niños y jóvenes.	CONCLUIDO	16.741
276	YC0579	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Campana de detención de Cáncer en mujeres.	CONCLUIDO	2.924
277	YC0580	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema "Medio Ambiente" con enfoque en "Agua"	CONCLUIDO	8.838
278	YC0581	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipamiento con material didáctico y deportivos a unidades educativas de Yungas.	CONCLUIDO	27.857
279	YC0582	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varios	Equipamiento al Proyecto OSCAR	CONCLUIDO	28.111
280	YC0583	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Chicaparque	Ampliación del Sistema de agua potable Chicaparque - Yolosita	CONCLUIDO	2.489
281	YC0584	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Calabatea	Ampliación del Sistema de agua potable Calabatea de Ayacucho.	CONCLUIDO	1.092
282	YC0585	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Chiquiña	Construcción aducción sistema de agua potable de Chiquiña	CONCLUIDO	1.560

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
283	YC0586	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Santa Ana	Refacción del Sistema de Agua Potable Santa Ana	CONCLUIDO	4.071
284	YC0587	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Gerónimo	Ampliación del Sistema de agua potable San Gerónimo	CONCLUIDO	2.548
285	YC0588	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Cochuma	Rehabilitación del sistema de agua de Cochuma - Coroico	CONCLUIDO	8.000
286	YC0589	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Coroico	Refacción una sección de la red de agua potable - Coroico Urbano	CONCLUIDO	1.923
287	YC0590	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Marca	Ampliación Sistema de agua potable Marca	CONCLUIDO	632
288	YC0591	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y comedor para maestros en la U.E. San Pedro de Coroico	CONCLUIDO	3.835
289	YC0593	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Santiago Grande	Diseño sistema de agua potable Santiago Grande	CONCLUIDO	5.453
290	YC0594	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Cristóbal	Diseño y construcción del Sistema de agua potable San Cristóbal.	CONCLUIDO	28.432
291	YC0597	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento y equipamiento técnico de la MMYLP	CONCLUIDO	27.102
292	YC0605A	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Calzada	Mejoramiento de baños en colegios y escuelas en La Asunta - La Calzada	CONCLUIDO	19.622
293	YC0605B	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Construcción batería de baños en la U. E. de Santa Rosa	CONCLUIDO	23.500
294	YC0605C	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Yanamayu	Construcción batería de baños en la U. E. de Yanamayu	CONCLUIDO	25.500
295	YC0605D	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Bolívar II	Construcción batería de baños en la U. E. de Bolívar II	CONCLUIDO	8.677
296	YC0605E	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Bolívar III	Construcción batería de baños en la U. E. de Bolívar III	CONCLUIDO	8.197
297	YC0605F	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Rene Barrientos Ortuno	Construcción batería de baños en la U. E. de Rene Barrientos Ortuno	CONCLUIDO	30.897
298	YC0607	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Comunidad Inicua Bajo	Diseño y construcción del sistema de agua potable de Inicua Bajo	CONCLUIDO	84.510
299	YC0608	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipamiento de bibliotecas de centros de educación técnica y superior.	CONCLUIDO	21.948
300	YC0609	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Parques recreativos para niños en los Yungas	CONCLUIDO	75.010
301	YC0610	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Campaña de limpieza y concientización en el manejo de residuos sólidos en Yungas	CONCLUIDO	71.738
302	YC0611	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios YUN	Campaña de prevención de leishmaniasis	EJECUCIÓN	5.973

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
303	YC0613	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento del VCDI para la generación de propuestas de proyectos de desarrollo integral	CONCLUIDO	4.019
304	YC0614	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	El Choro, Milliguaya	Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El Choro Grande – Milluguaya).	CONCLUIDO	1.777
305	YC0615	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Charobamba, Nogalani	Equipamiento mobiliario para 2 U.E. Charobamba y Huirí Nogalani	CONCLUIDO	3.475
306	YC0616	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Nogalani	Diseño y construcción obra fina 8 aulas en la U.E. de la comunidad de Nogalani	CONCLUIDO	69.466
307	YC0617	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de la obra fina de 16 viviendas y batería de baños UE de La Asunta.	CONCLUIDO	16.679
308	YC0618	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diseño final del Centro de Salud de La Asunta	CONCLUIDO	247
309	YC0619	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Construcción de un bote con motor fuera de borda	CONCLUIDO	4.178
310	YC0620	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Diseño puente peatonal en San Gabriel	CONCLUIDO	3.759
311	YC0621	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Charcas I	Diseño y construcción de vivienda para médico y enfermera C. Charcas	CONCLUIDO	19.963
312	YC0622	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Transferencia de capacidades a CCVV	CONCLUIDO	24.387
313	YC0623	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Joaquin	Diseño y construcción del sistema de agua potable San Joaquín.	CONCLUIDO	91.196
314	YC0625	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento institucional y equipamiento de los Centros Técnicos Humanísticos Agropecuarios (CETHAs)	CONCLUIDO	49.545
315	YC0626	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diseño de 12 aulas para la Unidad Educativa René Barrientos Ortúño de La Asunta	EJECUCIÓN	247.400
316	YC0627	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Cotapata	Elaboración del Diseño final del sistema de alcantarillado sanitario para el centro poblado de Cotapata.	CONCLUIDO	10.649
317	YC0629A	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en La Asunta	CONCLUIDO	4.520
318	YC0629B	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en La Asunta y Palos Blancos	CONCLUIDO	3.140
319	YC0631	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Muchane	Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la Unidad Educativa Muchane	CONCLUIDO	159
320	YC0632	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Comunidad La Cascada	Construcción de 16 viviendas para maestros distrito educativo La Cascada	CONCLUIDO	106.800

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
321	YC0633	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	Cotapata	Diseño y construcción de la Plaza Central en la Comunidad de Cotapata	CONCLUIDO	42.144
322	YC0635	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coripata	San Agustín	Diseño final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Agustín	CONCLUIDO	5.292
323	YC0637	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Alto Remolinos	Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Alto Remolinos	CONCLUIDO	6.511
324	YC0640	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diagnóstico integral de saneamiento básico en el Municipio de La Asunta	CONCLUIDO	10.375
325	YC0642	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de los centros de capacitación de las Centrales de La Asunta y El Progreso en el Municipio de La Asunta	CONCLUIDO	3.693
326	YC0643	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Tocaña	Dotación de Tubería para la extensión de la línea de aducción del sistema de agua de la comunidad de Tocaña.	CONCLUIDO	4.914
327	YC0645	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Irupana	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Irupana	CONCLUIDO	19.935
328	YC0646	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Yanacachi	CONCLUIDO	7.535
329	YC0647	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Chulumani.	CONCLUIDO	20.361
330	YC0648	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Coripata	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Coripata	CONCLUIDO	20.504
331	YC0649	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Coroico	CONCLUIDO	28.928
332	YC0650	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos del Centro poblado de La Asunta	CONCLUIDO	30.585
333	YC0651	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Chamaca	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos Federación Chamaca	CONCLUIDO	30.585
334	YC0652	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos Federación La Asunta	CONCLUIDO	30.585
335	YC0653	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos Blancos	CONCLUIDO	31.394
336	YC0654	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Área II del Municipio de Palos Blancos	CONCLUIDO	21.340
337	YC0655	Comunitario	Varios	Yungas	Varios	Varias	Fondo para la elaboración de diseños de proyectos	CONCLUIDO	69.293

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
					YUN				
338	YC0656	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Apoyo al campeonato Interyungueño de Fútbol 2010	CONCLUIDO	8.072
339	YC0659	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Fortalecimiento institucional del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral -VCDI	CONCLUIDO	37.730
340	YC0660	Comunitario	Varios	Yungas	Varios YUN	Varios	Diagnóstico regional de las nuevas áreas de intervención	CONCLUIDO	11.723
341	YC0661	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana Moseten	Diseño final de construcción de una cubierta para la cancha polifuncional de la Unidad Educativa de Santa Ana de Moseten	CONCLUIDO	38.260
342	YC0662	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Brecha I	Ajuste del diseño final y construcción del sistema de agua potable en la Comunidad de Brecha I (Luz, Porvenir y Calama)	CONCLUIDO	8.437
343	YC0663	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Elaboración de diseños de talleres técnicos para la formación de bachilleres técnico - humanísticos en unidades educativas de los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	23.064
344	YC0664	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coripata	Coripata	Construcción de un baño público en el sector de la Plaza - Coripata	CONCLUIDO	2.498
345	YC0664A	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Irupana	Construcción de un Baño público para la población de Irupana en el barrio de Churiaca.	CONCLUIDO	34.157
346	YC0664B	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	La Asunta	Construcción de un baño público y duchas en la plaza principal de la Población de La Asunta	CONCLUIDO	30.000
347	YC0664C	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Construcción de un baño público en cruce de Sapecho	CONCLUIDO	2.557
348	YC0664D	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Construcción de un baño público en el Mercado de Palos Blancos	CONCLUIDO	2.017
349	YC0664E	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Comunidad Puente Villa	Construcción de un baño público en la comunidad de Puente Villa	CONCLUIDO	2.691
350	YC0664F	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani	Construcción de baños públicos en la Calle Sucre - Chulumani	CONCLUIDO	2.824
351	YC0664G	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Irupana	Construcción de baños públicos en el sector de la plaza Corico	CONCLUIDO	2.556
352	YC0665	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varios	Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La Paz	EJECUCIÓN	48.000
353	YC0666	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Sindicato San Jose de Llojeta	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Llojeta	CONCLUIDO	27.000

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
354	YC0667	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Churubamba	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Churubamba	EJECUCIÓN	33.000
355	YC0668	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Lejna	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Alto Lejna	CONCLUIDO	29.243
356	YC0669	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Comunidad Huirí Lanza	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Huirí Lanza	CONCLUIDO	27.000
357	YC0670	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Varios	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Alto Beni	EJECUCIÓN	31.500
358	YC0671	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Chulumani	CONCLUIDO	31.500
359	YC0672	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Coripata	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Coripata	CONCLUIDO	31.500
360	YC0673	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Coroico	CONCLUIDO	31.500
361	YC0674	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Chamaca	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Federación Chamaca	EJECUCIÓN	31.500
362	YC0675	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Federación La Asunta	EJECUCIÓN	31.500
363	YC0676	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Irupana	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Irupana	CONCLUIDO	31.500
364	YC0677	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Palos Blancos	EJECUCIÓN	31.500
365	YC0678	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Palos Blancos – Área V y VI	EJECUCIÓN	31.500
366	YC0679	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Centro poblado La Asunta	EJECUCIÓN	31.500
367	YC0680	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del	CONCLUIDO	21.000

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
							municipio de Yanacachi		
368	YC0681	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Comunidad Carmen Pampa	Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del puesto de salud de Carmen Pampa.	EJECUCIÓN	99.000
369	YC0683	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Diseño Unidad Educativa Machacamarca	CONCLUIDO	5.736
370	YC0685	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	Varios	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina – Fase II	CONCLUIDO	65.720
371	YC0686	Comunitario	Varios	Yungas	Varios YUN	Varios	Acciones de visibilidad y comunicación de las actividades del FCDI	EJECUCIÓN	30.000
372	YC0687	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	San Miguel de Huachi	Construcción del Sistema de Agua Potable de San Miguel de Huachi.	EJECUCIÓN	370.020
373	YC0689	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Arapata	Diseño final de la línea de la aducción del sistema de agua potable de Arapata, dotación de tubería y fortalecimiento de su CAPYS	CONCLUIDO	16.856
374	YC0690	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Remolinos	Construcción del Sistema de Agua Potable para el Distrito Remolinos	EJECUCIÓN	292.425
375	YC0691	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Sistemas de administración de activos fijos municipales	CONCLUIDO	5.446
376	YC0692	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de Agosto,San Jose	Construcción del sistema de agua potable de San José, Los Olivos y 21 de Agosto	EJECUCIÓN	453.600
377	YC0695	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Varios	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Alto Beni	EJECUCIÓN	54.000
378	YC0696	Comunitario	Otros	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Palos Blancos	EJECUCIÓN	76.000
379	YC0697	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Coroico	Refacción de la toma de agua del SAP del centro poblado de Coroico	EJECUCIÓN	24.675
380	YC0699	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Comunidad San Joaquin	Conclusión de la UE de San Joaquín	CONCLUIDO	11.757
381	YC0700	Comunitario	Agua potable	Yungas	La Asunta	La Asunta	Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La Asunta	CONCLUIDO	7.966
382	YC0701	Comunitario	Agua potable	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Fondo de Diseños de proyectos de agua potable Alto Beni - Palos Blancos	CONCLUIDO	13.230
383	YC0702	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Fernando	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Fernando.	CONCLUIDO	2.982
384	YC0703	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Construcción de aulas y batería de baños del Colegio Técnico Humanístico Agroforestal San Antonio.	EJECUCIÓN	234.910
385	YC0704	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Diseño y construcción de la cubierta de techo en la UAC- CP	CONCLUIDO	33.500

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
386	YC0705	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varios	Puesta en valor y plan de transferencia de activos fijos en custodia del FCDI	EJECUCIÓN	14.000
387	YC0706	Comunitario	Agua potable	Yungas	Varios YUN	Varios	Fondo de diseños de proyectos de agua potable Zona Tradicional	CONCLUIDO	1.133
388	YC0707	Comunitario	Agua potable	Yungas	Cajuata	Varios	Fondo de diseños de proyectos para el Municipio de Cajuata	CONCLUIDO	378
389	YC0708	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción de una batería de baños en la UE de Siguani Grande	CONCLUIDO	3.233
390	YC0709	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Quinuni	Construcción de batería de baños en la UE de Santa Rosa de Quinuni	CONCLUIDO	3.321
391	YC0710	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Mejoramiento integral de la UE de San Martín	CONCLUIDO	3.264
392	YC0711	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Colonia San Juan Unidos	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Juan Unidos	CONCLUIDO	1.444
393	YC0712	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Puerto Aroma	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Puerto Aroma	CONCLUIDO	3.154
394	YC0713	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Colonia Nuevos Horizontes	Construcción de vivienda de maestros y batería de baños en la UE de Nuevos Horizontes	CONCLUIDO	3.533
395	YC0714	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Nueva Union	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Nueva Unión	CONCLUIDO	3.042
396	YC0715	Comunitario	Agua potable	Yungas	Alto Beni	Union Camacho	Refacción sistema de agua potable Camacho	CONCLUIDO	102
397	YC0716	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento y dotación de materiales para la enseñanza a niños con capacidades especiales	CONCLUIDO	21.314
398	YC0717	Comunitario	Agua potable	Yungas	Alto Beni	Varios	Construcción del SAP de la Central Nuevo Amanecer - Altamira	CONCLUIDO	21.063
399	YC0718	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la población de Siguani Grande	EJECUCIÓN	265.000
400	YC0719	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Colonia Villa Potosí	Construcción de los servicios higiénicos en la UE Villa Nueva Potosí.	CONCLUIDO	4.119
401	YC0720	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Los Olivos	Construcción de los servicios higiénicos de la UE Los Olivos	CONCLUIDO	3.020
402	YC0721	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	San Jose	Construcción de una batería de baños en la UE de Pichari	CONCLUIDO	3.430
403	YC0722	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Construcción de un Baño Público en la Plaza Central de Palos Blancos	CONCLUIDO	2.557
404	YE0010	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Sede Social - Sindical (ADEPCOCA)	CONCLUIDO	67.364

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
405	YE0012A	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Sector Yolosa - Caranavi	Apoyo a Actividades de Rescate (Municipio)	CONCLUIDO	606
406	YE0012B	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Sector Yolosa - Caranavi	Apoyo a Actividades de Rescate (FEJUVE)	CONCLUIDO	10.842
407	YE0021	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Cont. bloque de talleres UE Martín Cárdenas	CONCLUIDO	50.228
408	YE0081	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Villa Unificada	Const. aulas, viviendas y bat.banios	CONCLUIDO	51.514
409	YE0082	Economico	Servicios	Yungas	Chulumani	Chulumani	Apoyo a las empresas constructoras que se adjudicaron proyectos en la Feria a la Inversa del Municipio de Chulumani	CONCLUIDO	46.379
410	YE0085	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Porvenir - 20 de Mayo	Puente Peatonal Colgante	CONCLUIDO	28.036
411	YE0133	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipo móvil para emergencias	CONCLUIDO	14.023
412	YE0154	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Varios	Apoyo implementación 3 pastelerías	CONCLUIDO	40.049
413	YE0155	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Varios	Apoyo en Iniciativas de Negocio en la implementación de 4 Inict. de Neg. en transformación y comercialización, en la región de los Yungas	CONCLUIDO	23.302
414	YE0156	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Producción pollos parrilleros - Granja Adriana	CONCLUIDO	15.453
415	YE0157	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Santa Rosa	Transformación y comer. Curcuma	CONCLUIDO	2.981
416	YE0158	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Piquendo,Bella Vista	Producción y comercialización de frijol negro	CONCLUIDO	3.348
417	YE0159	Economico	Servicios	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Tarjetas artesanales	CONCLUIDO	1.761
418	YE0160	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Brecha J	Implementación de colmenas ADAEPAB	CONCLUIDO	3.468
419	YE0161	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Carpintería industrial	CONCLUIDO	6.286
420	YE0183	Economico	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Elaboración de 109 planes de negocio en Alto Beni	CONCLUIDO	92.473
421	YE0184	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes emprendedores	CONCLUIDO	39.216
422	YE0185	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Intercambio academico Zamorano UAC/CP	CONCLUIDO	15.088
423	YE0195	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Intercambio de líderes productivos	CONCLUIDO	24.683

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
424	YE0197	Economico	Pecuario	Yungas	Varios YUN	Varias	Censo Avícola en los Yungas	CONCLUIDO	17.540
425	YE0199	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Coroico	Charobamba	Diseño acceso al Puente vehicular colgante	CONCLUIDO	10.558
426	YE0227	Economico	Medio ambiente	Yungas	La Asunta	Varias	100 Ha de parcelas agroforestales familiares en sustitución de cocales	CONCLUIDO	39.229
427	YE0228	Economico	Turismo	Yungas	Varios YUN	Varias	Senalizacion caminera/turistica de Yungas	EJECUCIÓN	65.300
428	YE0229	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	La Asunta	Produccion de pollos Donato	CONCLUIDO	599
429	YE0230	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Modernización de la Planta Industrial de Derivados Lácteos "CACIQUE"	CONCLUIDO	50.320
430	YE0231	Economico	Apicola	Yungas	Alto Beni	Bella Vista	Apicultura "APAAB"	CONCLUIDO	8.842
431	YE0232	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Brecha H - Palos Blancos	Producción de Jugo y Concentrados de Cítricos	CONCLUIDO	47.214
432	YE0233	Economico	Servicios	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Acopio y Venta de Áridos	CONCLUIDO	4.535
433	YE0234	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Colonia Belén	Elaboración y Comercialización de derivados Citricolas "ASOPROCID"	CONCLUIDO	43.915
434	YE0235	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Bella Vista	Planta Procesadora de Derivados Lácteos "APROLAB"	CONCLUIDO	27.778
435	YE0236	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Transformación y Comercialización de Productos Medicinales Naturales	CONCLUIDO	9.096
436	YE0237	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Crianza de Ovinos de Pelo	CONCLUIDO	7.838
437	YE0238	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Illimani - San Antonio	Pollos Parrilleros Illimani San Antonio	CONCLUIDO	22.590
438	YE0239	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Complementación del Hotel Magdalena	CONCLUIDO	11.838
439	YE0239B	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Complementación del Hotel Rigman	CONCLUIDO	11.563
440	YE0240	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Colonia Ingavi Cobija - Santa Rosa	Elaboración de Derivados Lácteos "TICOLAC"	CONCLUIDO	18.712
441	YE0241	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha J - Popoy	Producción y Comercialización de Cerdos	CONCLUIDO	15.381
442	YE0242	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Apóstol Santiago - Sapecho	Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL SANTIAGO"	CONCLUIDO	17.153
443	YE0243	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Popoy	Implementación de una Planta Procesadora de Embutidos	CONCLUIDO	17.096

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
444	YE0244	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Elaboración de Derivados de Estevia - "IPAN"	CONCLUIDO	458
445	YE0245	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	El Sillar	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero "ILLAMPU"	CONCLUIDO	13.070
446	YE0246	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Puerto Santa Ana	Circuito Etnoecoturismo en el río La Paz y Beni	CONCLUIDO	14.830
447	YE0247	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha B - Sapecho	Mejoramiento del Hato y Comercialización de Leche "DELGADILLO"	CONCLUIDO	19.880
448	YE0248	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Peladora de Arroz y Silos	CONCLUIDO	8.477
449	YE0249	Economico	Servicios	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Implementación de Microempresa Metalmecánica	CONCLUIDO	10.429
450	YE0250	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia La Forestal - Bella Vista	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "INGAVI - COBIJA"	CONCLUIDO	10.643
451	YE0251	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Ingavi Cobija - Santa Rosa	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "LA FORESTAL"	CONCLUIDO	7.290
452	YE0252	Economico	Agrícola	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Semilla Hibrida de Caco y Cítricos	CONCLUIDO	11.487
453	YE0253	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Implementación de Colmenas - "ECOTOP"	CONCLUIDO	4.772
454	YE0254	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha H - Palos Blancos	Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA PATI"	CONCLUIDO	11.537
455	YE0255	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA NINA"	CONCLUIDO	1.202
456	YE0256	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Santa Rosa	Comercialización de Carne y Piel de Cuye	CONCLUIDO	67
457	YE0257	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Los Tigres	Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El Pahuichi - "CEINAP"	CONCLUIDO	18.235
458	YE0258	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Wiñay Marca	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "WINAY MARCA"	CONCLUIDO	15.665
459	YE0259	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Popoy	Carpintería Industrial "Inicua"	CONCLUIDO	7.292
460	YE0260	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Illimani	Porcinocultura - "FLORES"	CONCLUIDO	222
461	YE0261	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Colorado	Implementación de Colmenas - San Martín de Agua Rica	CONCLUIDO	2.864
462	YE0262	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Colonia Villazón	Implementación de Apíarios - "DORADO"	CONCLUIDO	2.302
463	YE0263	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Planta Procesadora de Jugos Naturales - "EL PARAISO"	CONCLUIDO	45.881

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
464	YE0264	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Charcas I	Porcinocultura - "VILLEGAS"	CONCLUIDO	17.199
465	YE0265	Economico	Servicios	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Materiales Didácticos - "JULI"	CONCLUIDO	9.852
466	YE0266	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Circuitos Turísticos guiados por Mocetenes	CONCLUIDO	13.392
467	YE0267	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU"	CONCLUIDO	19.259
468	YE0268	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Artesanías - "ARTMOS"	CONCLUIDO	6.264
469	YE0269	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Villa El Porvenir	Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP"	CONCLUIDO	9.076
470	YE0270	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Es spontánea Illimani	Implementación de una Planta Procesadora de Alimentos Km. 52	CONCLUIDO	9.052
471	YE0271	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha F - Palos Blancos	Granja de Producción de Huevos - "TORRICO"	CONCLUIDO	9.734
472	YE0272	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Es spontánea San Antonio de Boopi	Producción de Huevos - "SAN ANTONIO"	CONCLUIDO	2.170
473	YE0273	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Deshidratado Frutas Tropicales	CONCLUIDO	6.482
474	YE0274	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Colonia Tarapacá	Agropecuaria "ICHUTA"	CONCLUIDO	18.073
475	YE0275	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Carpintería Industrial "Callisaya"	CONCLUIDO	13.504
476	YE0276	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Carpintería Industrial "Ramos"	CONCLUIDO	15.184
477	YE0277	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Suapi Km73	Agropecuaria "Martin Cardenas"	CONCLUIDO	3.767
478	YE0278	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Concesión Illimani	Mejoramiento del Hato Lechero - "ILLIMANI"	CONCLUIDO	6.233
479	YE0279	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Brecha C - Palos Blancos	Artesanias Inicua	CONCLUIDO	3.197
480	YE0280	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO"	CONCLUIDO	14.127
481	YE0281	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	San Pedro - Sapecho	Implementación de Apiario - "SAN PEDRO"	CONCLUIDO	3.400
482	YE0282	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Mejillones Brecha H - Palos Blancos	Implementación de Colmenas - "LUCANA"	CONCLUIDO	9.015
483	YE0283	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Villa Prado - Pista Soapi	Agropecuaria "ALBORTA"	CONCLUIDO	18.770

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
484	YE0284	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	Varias	Formacion tecnica de jovenes en La Asunta	CONCLUIDO	80.000
485	YE0286	Economico	Medio ambiente	Yungas	Palos Blancos	Varias	Parcelas agroforestales en Alto Beni	CONCLUIDO	49.971
486	YE0295	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	La Asunta	Intercambio de Productores Lideres - La Asunta	CONCLUIDO	32.262
487	YE0332A	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL ERIKA"	CONCLUIDO	16.093
488	YE0332B	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL 20 DE SEPTIEMBRE"	CONCLUIDO	16.419
489	YE0332C	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL BELLA VISTA"	CONCLUIDO	23.536
490	YE0333	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Carniceria "GUTIERREZ"	CONCLUIDO	6.543
491	YE0334	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Cerdos "Torrez"	CONCLUIDO	10.566
492	YE0335	Economico	Pecuario	Yungas	Coripata	San José de Peri	Producción de Pollos Parrilleros "Doña Martha"	CONCLUIDO	16.518
493	YE0336	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Snack "DOÑA LUPE"	CONCLUIDO	2.263
494	YE0337	Economico	Pecuario	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Producción de Cerdos "Choque"	CONCLUIDO	23.766
495	YE0338	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	San José de Peri	Carpintería "Juan de la Cruz"	CONCLUIDO	4.041
496	YE0339	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Heladería "Los Manzanales"	CONCLUIDO	12.721
497	YE0340	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Colpar	Avícola Loza-Navia - Pollos Parrilleros	CONCLUIDO	20.705
498	YE0341	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	San José de Peri	Pollereria Alberta	CONCLUIDO	2.325
499	YE0342	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Venta de Pollos Broaster y Salchipapería "Angélica"	CONCLUIDO	2.775
500	YE0343	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	San José de Peri	Comidería "DOÑA JUAQUINA	CONCLUIDO	7.388
501	YE0344	Economico	Agrícola	Yungas	Coripata	San José de Peri	Producción de mangos san Rafael	CONCLUIDO	4.635
502	YE0345	Economico	Apicola	Yungas	Coripata	San José de Peri	Miel de abejas "NINA"	CONCLUIDO	6.404
503	YE0346	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	San José de Peri	Panadería "San José"	CONCLUIDO	9.360
504	YE0347	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Cerdos "Flores"	CONCLUIDO	21.383
505	YE0348	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Producción de gallinas de postura "LAYDI"	CONCLUIDO	16.398
506	YE0349	Economico	Apicola	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de miel y jalea "ESCOBAR"	CONCLUIDO	7.574

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
507	YE0350	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Panadería "JHONNY"	CONCLUIDO	11.442
508	YE0351	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Pasto Pata	Producción de Pollos "AVERANGA"	CONCLUIDO	16.887
509	YE0352	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Panadería "Julia"	CONCLUIDO	11.217
510	YE0353	Economico	Apicola	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Miel de Abejas "RIO BLANCO"	CONCLUIDO	2.532
511	YE0354	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Colpar	Panaderia Umalinda	CONCLUIDO	9.441
512	YE0355	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	El Colpar	Carnicería "Santa Rita"	CONCLUIDO	4.510
513	YE0356	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Pollos Parrilleros "Nido"	CONCLUIDO	13.275
514	YE0358	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Panaderia "ESTHER"	CONCLUIDO	4.757
515	YE0359	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura "Meza"	CONCLUIDO	4.724
516	YE0360	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Puerto Unido - Santa Teresita	Granja gallinas ponedoras "Río Seco"	CONCLUIDO	17.000
517	YE0361	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Taller de Confecciones de ropa de vestir "Yola"	CONCLUIDO	5.484
518	YE0362	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Cotapata	Taller de Carpintería "Quispe"	CONCLUIDO	20.103
519	YE0363	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura "Cuba"	CONCLUIDO	4.964
520	YE0364	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Porvenir 20 de Mayo, Progreso - San San Unido	Corte y Confección "Gloria"	CONCLUIDO	6.752
521	YE0365	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	La Asunta	Producción de pollos parrilleros "Roco"	CONCLUIDO	12.014
522	YE0366	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Puerto Unido - San Antonio	Taller de Carpintería CORFAB	CONCLUIDO	12.647
523	YE0367	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Cotapata	Panaderia "Integral"	CONCLUIDO	7.022
524	YE0368	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Taller de Carpintería "Alex"	CONCLUIDO	24.103
525	YE0369	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Porvenir 20 de Mayo, Progreso - San San Unido	Pollos parrilleros "Doña Isabel"	CONCLUIDO	19.490
526	YE0370	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Jugos naturales "Silvia"	CONCLUIDO	6.165
527	YE0371	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	San Pablo	Pollos parrilleros FICO	CONCLUIDO	17.151
528	YE0372	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cuchumpaya	Apicultura "Mamani"	CONCLUIDO	4.880
529	YE0373	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Jugos Naturales "Erika"	CONCLUIDO	7.248
530	YE0374	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Heladería "Jeremy"	CONCLUIDO	17.757
531	YE0375	Economico	Servicios	Yungas	La Asunta	PuertoRico	Transporte en bote de Carga y Pasajeros "Titanic"	CONCLUIDO	8.663

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
532	YE0376	Economico	Servicios	Yungas	La Asunta	La Asunta	Salon de Peinados y Peluquería "Chura"	CONCLUIDO	7.431
533	YE0377	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura San Gabriel	CONCLUIDO	5.153
534	YE0378	Economico	Medio ambiente	Yungas	Chulumani	Varias	Recuperación de suelos (40 has) de ex cocaes en la Zona Tradicional	CONCLUIDO	105.687
535	YE0379	Economico	Agrícola	Yungas	Yanacachi	Varias	Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Flores del Municipio de Yanacachi	CONCLUIDO	175.452
536	YE0380	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Charagua	Granja Avícola "Adrian"	CONCLUIDO	8.229
537	YE0381	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Florida" Plan Negocio	CONCLUIDO	36.752
538	YE0382	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola Daza- Parrilleros	CONCLUIDO	9.955
539	YE0383	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chacala	Granja Avícola "COSTAS"	CONCLUIDO	15.801
540	YE0384	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Granja Avícola Daniel	CONCLUIDO	15.398
541	YE0385	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Granja Avícola "Yupanqui" Plan Negocio	CONCLUIDO	199
542	YE0386	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros Plan Negocio	CONCLUIDO	204
543	YE0387	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Chalco"	CONCLUIDO	17.411
544	YE0388	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Marilena"	CONCLUIDO	18.474
545	YE0389	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Azucena"	CONCLUIDO	4.494
546	YE0390	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Granja Avícola "ISIDORO"	CONCLUIDO	19.313
547	YE0391	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola Tapia - Parrilleros Plan Negocio	CONCLUIDO	205
548	YE0392	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Poma"	CONCLUIDO	16.380
549	YE0393	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Granja Avícola "Cirilo" Plan Negocio	CONCLUIDO	229
550	YE0394	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Pichu	Granja Avícola "Loza" Plan Negocio	CONCLUIDO	229
551	YE0395	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Avícola "Patty" Plan Negocio	CONCLUIDO	229
552	YE0396	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chojlla	Granja Avícola "APPP"	CONCLUIDO	20.805
553	YE0397	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Ochoa"	CONCLUIDO	16.765
554	YE0398	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Granja Avícola "Yungas"	CONCLUIDO	8.357
555	YE0399	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Chaco" Plan Negocio	CONCLUIDO	229

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
556	YE0400	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Porcina "Florida"	CONCLUIDO	21.214
557	YE0401	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Aquice" Plan Negocio	CONCLUIDO	229
558	YE0402	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sacahuaya	Granja Avicola "ROJAS"	CONCLUIDO	14.828
559	YE0403	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Calixto" Plan Negocio	CONCLUIDO	76
560	YE0404	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Avicola "Apaza"	CONCLUIDO	18.072
561	YE0405	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Porcina "Porfiria"	CONCLUIDO	21.951
562	YE0406	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Porcina "Machaca"	CONCLUIDO	16.065
563	YE0407	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chajro	Granja Avícola "Cáceres"	CONCLUIDO	8.194
564	YE0408	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	La Chojilla	Granja Porcina "APPLC"	CONCLUIDO	47.557
565	YE0423	Economico	Agrícola	Yungas	Palos Blancos	Brecha D	Provision de motadeshierbadoras	CONCLUIDO	3.547
566	YE0424	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Santa Elena	Provision de motadeshierbadoras	CONCLUIDO	4.434
567	YE0486	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta	CONCLUIDO	44.734
568	YE0487	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Cafe	CONCLUIDO	138.377
569	YE0488	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Estevia	CONCLUIDO	235.134
570	YE0489	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Platano	CONCLUIDO	121.559
571	YE0490	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Brecha J	Plan Avicola	CONCLUIDO	16.960
572	YE0491	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Apicola	CONCLUIDO	59.216
573	YE0495	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Puente del Desarrollo	CONCLUIDO	18.828
574	YE0497	Economico	Turismo	Yungas	Coripata	Coripata	Diseño final terminal de buses Coripata	CONCLUIDO	11.832
575	YE0514	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo al sector turístico: Festival Cultural Coroico 2009	CONCLUIDO	5.320
576	YE0517	Economico	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Estrategia Forestal para la Zona Tradicional	CONCLUIDO	45.426
577	YE0518	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación: Gestión empresarial con enfoque de género	CONCLUIDO	9.597
578	YE0560	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Puerto Rico - San Fernando - Cuarta Bolívar	CONCLUIDO	16.172

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
579	YE0561	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Central Simon Bolivar	Construcción de alcantarillas en los caminos de la Central Bolívar	CONCLUIDO	17.949
580	YE0562	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Santa Lucia	Construcción de alcantarillas tramo Santa Lucia - Chispanito	CONCLUIDO	16.992
581	YE0563	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Colonia Incahuara	Construcción de alcantarillas tramo 10 de Febrero - Churubamba - Incahuara de Canaan	CONCLUIDO	18.000
582	YE0564	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción de alcantarillas tramo Siguani Grande - Quillabamba	CONCLUIDO	17.998
583	YE0565	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de Agosto	Construcción de alcantarillas tramo Nogalani - 21 de Agosto	CONCLUIDO	16.129
584	YE0566	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Cotapata - San Felipe - 10 de febrero	CONCLUIDO	18.106
585	YE0567	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Chamaca - Tunquini - Alto Charobamba	CONCLUIDO	17.963
586	YE0568	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Alto Charobamba,Chamaca,Tunquini	Construcción de alcantarillas tramo Villa Victoria - Palmeras	CONCLUIDO	17.937
587	YE0569	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Chorrillo - San Lorenzo	CONCLUIDO	14.340
588	YE0570	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Implementación/equipamiento de centros de acopio y procesamiento apícola	CONCLUIDO	60.502
589	YE0571	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Consolidar la calidad del café a través del co-financiamiento de despulpadoras individuales	CONCLUIDO	68.282
590	YE0572	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	La Asunta	Equipamiento y complementación de tres plantas procesadoras de cítricos	CONCLUIDO	55.092
591	YE0573	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Incremento de la base productiva del cultivo de Stevia en el municipio de La Asunta	CONCLUIDO	37.647
592	YE0574	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Estudios de mercado y capacitación en costos, mercadeo y marketing	CONCLUIDO	20.570
593	YE0575	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	Varias	Creación de una base productiva hortícola en Yungas de La Paz	CONCLUIDO	19.187
594	YE0576	Economico	Agrícola	Yungas	Varios YUN	Varias	Consolidación de Proveedores en la Cadena de Amaranto Orgánico de Alta Calidad en los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	112.028
595	YE0577	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación y equipamiento en corte y confección	CONCLUIDO	41.213
596	YE0592	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Comunidad San Felix	Mejoramiento del sitio turístico de la comunidad de San Félix	CONCLUIDO	22.941

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
597	YE0595	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes emprendedores yungueños en la “Semana Mundial del Emprededurismo	CONCLUIDO	10.049
598	YE0596	Economico	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Modernización de la red meteorológica de los Yungas	CONCLUIDO	79.033
599	YE0598	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Irupana	Irupana,Varios	Construcción de alcantarillas en caminos comunales de Irupana	CONCLUIDO	13.335
600	YE0599	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Coripata	Comunidad Anacuri,Comunidad Auquisamaña	Construcción de alcantarillas: Tramo Coripata – Pte Chacon y Anaruri - Auquisanana	CONCLUIDO	6.245
601	YE0600	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta,Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar II	CONCLUIDO	165
602	YE0601	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta,Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar III	CONCLUIDO	165
603	YE0602	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta,Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar IV	CONCLUIDO	171
604	YE0603	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Palos Blancos	Comunidad Inicua Bajo	Construcción de alcantarillas en los caminos de las comunidades Liquimuni y Bajo Inicua	CONCLUIDO	18.629
605	YE0612	Economico	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento de las capacidades de control sanitario de SENASAG – Yungas	CONCLUIDO	19.858
	YE0624	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	La Asunta	Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas del FCDI	CONCLUIDO	53.000
607	YE0634	Economico	Pecuario	Yungas	Coroico	Varias	Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de Avicultores de La Paz- Coroico	CONCLUIDO	2.386
608	YE0636	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Curso en gestión microempresarial para el sector de costura	CONCLUIDO	4.131
609	YE0639	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani Chico	CONCLUIDO	28.771
610	YE0641	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Puerto Aroma	Diseño y provisión de materiales para la construcción del puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto Aroma.	CONCLUIDO	29.676
611	YE0644	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 2010	CONCLUIDO	3.322
612	YE0657	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	74.855
613	YE0658	Economico	Agrícola	Yungas	Irupana	Irupana	Desarrollo de proveedores en la cadena de amaranto orgánico de alta calidad en los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	117.688
614	YE0682	Economico	Servicios	Yungas	Chulumani	Chulumani	Panaderia MAMA-LUI	CONCLUIDO	5.355

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
615	YE0684	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Apoyo, a los asociados de APEPLA, en los procesos/fase de cosecha, pos cosecha, negociación y comercialización.	CONCLUIDO	51.886
616	YR0016	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Varias	Megaproyecto Agua Potable (Fase II)	CONCLUIDO	471.505
617	YR0052	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Tucupi	Construcción 8 aulas UE 13 de mayo	CONCLUIDO	79.777
618	YR0053	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Tucupi	Const. 4 viviendas y amp. centro salud	CONCLUIDO	74.961
619	YR0054	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	74.774
620	YR0055	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Plaza	CONCLUIDO	49.340
621	YR0056	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Construcción Centro de Salud Santa Rosa Quilo	CONCLUIDO	100.192
622	YR0057	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	Suapi	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	88.821
623	YR0059	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Chicaloma	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	252.396
624	YR0061	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Irupana	Chicaloma	Plaza Población Chicaloma	CONCLUIDO	76.412
625	YR0062	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Const. Unidad Educativa Palmar Suapi	CONCLUIDO	52.608
626	YR0063	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Sararia - Area Urbana	Construcción complejo educativo Sararia	CONCLUIDO	169.391
627	YR0064	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Sararia - Area Urbana	Construcción centro de salud	CONCLUIDO	50.452
628	YR0065	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Puente Alto Beni	Construcción de sala de reuniones	CONCLUIDO	33.059
629	YR0066	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Mercedes	Construcción posta sanitaria	CONCLUIDO	66.201
630	YR0067	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Kollasuyo	Conclusión posta sanitaria	CONCLUIDO	2.051
631	YR0068	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Central San Antonio	Sala de reunión central San Antonio	CONCLUIDO	82.583
632	YR0069	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Area Urbana Popoy	Sede Social Múltiple	CONCLUIDO	87.842
633	YR0070	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Brecha H	Construcción viviendas y bat.baños UE Mejillones	CONCLUIDO	26.023
634	YR0071	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana - urbano	Construcción Casa de Gobierno	CONCLUIDO	33.362
635	YR0072	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana de Mosetenes	Construcción viviendas de maestros	CONCLUIDO	8.364

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
636	YR0073	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana - urbano	Const. baterías de baños - UE Santa Ana	CONCLUIDO	12.482
637	YR0074	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Delicias	Const. aulas, viviendas y bat. baños UE	CONCLUIDO	950
638	YR0075	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Belen	Diseño: Construcción escuela y batería de baños	CONCLUIDO	121
639	YR0076	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	San Miguel de Huachi	Complejo Educativo Fase II	CONCLUIDO	201.245
640	YR0077	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Arapata	Construcción Mercado Central	CONCLUIDO	127.107
641	YR0078	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Chicaloma	Refacción Unidad Educativa Chicaloma	CONCLUIDO	150.085
642	YR0079	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Cocochi	Equipamiento mini hospital	CONCLUIDO	24.348
643	YR0080	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Puerto Carmen	Equipamiento mini hospital	CONCLUIDO	24.509
644	YR0084	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Cuchumpaya	Puente Peatonal Colgante	CONCLUIDO	96.457
645	YR0086	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Porvenir - 20 de Mayo	Construcción Unidad Educativa El Porvenir	CONCLUIDO	31.685
646	YR0087	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	El Colpar	Conclusión Vivienda Maestros y batería baños	CONCLUIDO	40.734
647	YR0088	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Simay	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	51.623
648	YR0089	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Simayuni,Los Andes	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	152.519
649	YR0090	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	V. Concepcion,S. Covendo	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	139.122
650	YR0091	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	San Pedro de Cogotay	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	50.534
651	YR0092	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Covendo y alrededores	Sistema de Agua Potable (Megaproyecto)	CONCLUIDO	215.831
652	YR0093	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Brecha T	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	61.182
653	YR0094	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	San Luis 2da.	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	94.861
654	YR0095	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Nueva California	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	33.038
655	YR0096	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Pista Suapi	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	25.049

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
656	YR0097	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Villa Santiago	Complementación Agua Potable	CONCLUIDO	31.881
657	YR0098	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Nuevo Amanecer	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	26.044
658	YR0099	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Colke Alta,22 de Julio	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	153.341
659	YR0100	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Porvenir,Paraiso,Chichas,Villa Litoral	Sistema de Agua Potable - Central Porvenir	CONCLUIDO	10.680
660	YR0101	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Polifuncional deportivo de Coroico	CONCLUIDO	126.918
661	YR0103	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Anacuri	Obra fina iglesia	CONCLUIDO	41.175
662	YR0106	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Bolognia, Belen	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	90.156
663	YR0108	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Apóstol Santiago	Provisión Motodeshierbadoras (20)	CONCLUIDO	4.117
664	YR0109	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Entre Ríos - Playa Azul	Provisión Motodeshierbadoras (16)	CONCLUIDO	3.624
665	YR0110	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Expontánea Illimani	Provisión Motodeshierbadoras (11)	CONCLUIDO	3.022
666	YR0111	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Ingavi - Cobija	Provisión Motodeshierbadoras (20)	CONCLUIDO	4.411
667	YR0112	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Nueva Collasuyo	Provisión Motodeshierbadoras (26)	CONCLUIDO	5.443
668	YR0113	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Nueva Esperanza	Provisión Motodeshierbadoras (22)	CONCLUIDO	6.128
669	YR0114	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Ocampo	Provisión Motodeshierbadoras (32)	CONCLUIDO	7.654
670	YR0115	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Pajonal I	Provisión Motodeshierbadoras (21)	CONCLUIDO	5.858
671	YR0116	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Villa Camacho	Provisión Motodeshierbadoras (38)	CONCLUIDO	10.158
672	YR0117	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Provisión Motodeshierbadoras (22)	CONCLUIDO	4.951
673	YR0118	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Provisión Motodeshierbadoras (146)	CONCLUIDO	39.806
674	YR0119	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Varias (6 comunidades)	Megaproyecto Agua Potable - Sapecho	CONCLUIDO	332.188
675	YR0120	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Delicias,J. Bapt	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	65.261
676	YR0131	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Implementación planta procesadora de frutas	CONCLUIDO	6.371
677	YR0135	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Varias (10 comunidades)	Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua	CONCLUIDO	352.389
678	YR0136	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos	Palos Blancos	Sistema de Agua Potable Hoyada Kollasuyo (17)	CONCLUIDO	60.986

No.	Código	Componente	Subcomponente	Región	Municipio	Comunidad	Proyecto	Estado	Monto CT
					Blancos		Colonias)		
679	YR0139	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Machacamarca	Obra fina sede social	CONCLUIDO	78.659
680	YR0140	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Machacamarca	Agua potable	CONCLUIDO	102.068
681	YR0141	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Tabacal	Refacción casa de hacienda para albergue	CONCLUIDO	119.517
682	YR0142	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Santa Rosa (Arapata)	Polifuncional Santa Rosa de Lima	CONCLUIDO	24.750
683	YR0143	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	San Juan Suapi,Villa El Prado	Sistema de Agua Potable (11 comunidades)	CONCLUIDO	21.964
684	YR0144	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Colopampa	Agua potable	CONCLUIDO	65.638
685	YR0145	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Santa Rosa	Obra fina iglesia	CONCLUIDO	40.594
686	YR0153	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Inicua	Construcción 20 viviendas	CONCLUIDO	192.836
687	YR0174	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	Anacuri	Clasificadora de áridos	EJECUCIÓN	63.741
688	YR0175	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	Anacuri	Cortadora piedra laja	CONCLUIDO	28.365
