




PD-ABX-685

118749



## DEL REASENTAMIENTO TEMPORAL A LA RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN



**12 DE NOVIEMBRE DE 1999  
TEGUCIGALPA, M.D.C.**

A

# I N D I C E

PRESENTACION GENERAL-----	2
RESUMEN EJECUTIVO-----	4
BALANCE Y LECCIONES DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO TEMPORAL DE LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN MITCH-----	12
CUADRO 1: INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y SANITARIA-----	14
CUADRO 2A: POBLACION TOTAL EN LAS CHATS-----	15
CUADRO 2B: POBLACION TOTAL EN LAS CHATS (DISTRIBUIDAS POR SEXO)-----	16
CUADRO 3A: SERVICIOS SOCIALES EN LOS ALBERGUES (EDUCACION Y ORGANIZACION COMUNITARIA)-----	17
CUADRO 3B: SERVICIOS SOCIALES EN LOS ALBERGUES (SALUD)-----	18
CUADRO 4A: REASENTAMIENTO PERMANENTE-----	19
CUADRO 4B: ESTADO DE AVANCE DE LAS VIVIENDAS COMPROMETIDAS-----	20
CUADRO 5: EMPLEO vrs. DESEMPLEO-----	21
CUADRO 6: KITS DE EMERGENCIA-----	22
CUADRO 7: DISTRIBUCION DE OFICINAS Y PERSONAL DEL PROGRAMA CHAT's-----	23
<b>ZONA CENTRAL-----</b>	<b>24</b>
<b>I. TEGUCIGALPA</b>	
A. PRESENTACION-----	25
B. CONSTRUCCION-----	28
1. PROCESO CONSTRUCTIVO	
2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y SANITARIA	
3. MANTENIMIENTO	
C. ADMINISTRACION-----	34
1. POBLACION	
2. MARCO INSTITUCIONAL	
3. SERVICIOS ESENCIALES	
4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION	
5. REASENTAMIENTO PERMANENTE	
6. REINSERCCION SOCIO-ECONOMICA	

**ZONA NORTE-----42**

**II. RIBERAS DEL CARIBE**

**A. PRESENTACION-----43**

**B. CONSTRUCCION-----45**

- 1. PROCESO CONSTRUCTIVO
- 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
- 3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA
- 4. MANTENIMIENTO

**C. ADMINISTRACION-----47**

- 1. POBLACION
- 2. MARCO INSTITUCIONAL
- 3. SERVICIOS ESENCIALES
- 4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION
- 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE
- 6. REINSERCIÓN SOCIO-ECONOMICA

**III. NUEVA MASICALES, TRUJILLO, COLON**

**A. PRESENTACION-----53**

**B. CONSTRUCCION-----55**

- 1. PROCESO CONSTRUCTIVO
- 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
- 3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA
- 4. MANTENIMIENTO

**C. ADMINISTRACION-----57**

- 1. POBLACION
- 2. MARCO INSTITUCIONAL
- 3. SERVICIOS ESENCIALES
- 4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION
- 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE
- 6. REINSERCIÓN SOCIOECONOMICA

**IV. CEIBITA, TOCOA, COLON**

**A. PRESENTACION-----61**

**B. CONSTRUCCION-----63**

- 1. PROCESO CONSTRUCTIVO
- 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
- 3. INFRAESTRUTURA SANITARIA
- 4. TRANSPORTE

**C. ADMINISTRACION-----65**

- 1. POBLACION
- 2. MARCO INSTITUCIONAL
- 3. SERVICIOS ESENCIALES
- 4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION
- 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE
- 6. REINSERCIÓN SOCIOECONOMICA

V. 25 DE SEPTIEMBRE, SONAGUERA, COLON

A. PRESENTACION-----	71
B. CONSTRUCCION-----	73
1. PROCESO CONSTRUCTIVO	
2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	
3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
4. MANTENIMIENTO	
C. ADMINISTRACION-----	75
1. POBLACION	
2. MARCO INSTITUCIONAL	
3. SERVICIOS ESENCIALES	
4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION	
5. REASENTAMIENTO PERMANENTE	
6. REINSERCIÓN SOCIOECONOMICA	

VI. EL PROGRESO, YORO

A. PRESENTACION-----	80
B. CONSTRUCCION-----	82
1. PROCESO CONSTRUCTIVO	
2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	
3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
4. MANTENIMIENTO	
C. ADMINISTRACION-----	84
1. POBLACION	
2. MARCO INSTITUCIONAL	
3. SERVICIOS ESENCIALES	
4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION	
5. REASENTAMIENTO PERMANENTE	
6. REINSERCIÓN SOCIOECONOMICA	

VII. BARACOA Y GRAN VILLA, PUERTO CORTES, CORTES

A. PRESENTACION-----	91
B. CONSTRUCCION-----	93
1. PROCESO CONSTRUCTIVO	
2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL	
3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA	
4. MANTENIMIENTO	
C. ADMINISTRACION BARACOA-----	95
1. POBLACION	
2. MARCO INSTITUCIONAL	
3. SERVICIOS ESENCIALES	
4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION	
5. REASENTAMIENTO PERMAMNETE	
6. REINSERCIÓN SOCIOECONOMICA	
D. ADMINISTRACION GRAN VILLA-----	100
1. POBLACION	
2. MARCO INSTITUCIONAL	
3. SERVICIOS ESENCIALES	
4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION	

- 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE
- 6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA

VIII. *COMUNIDAD VIDA NUEVA, COFRADIA, CORTES*

- A. PRESENTACION-----105
- B. CONSTRUCCION-----107
  - 1. PROCESO CONSTRUCTIVO
  - 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
  - 3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA
- C. ADMINISTRACION-----109
  - 1. POBLACION
  - 2. MARCO INSTITUCIONAL
  - 3. SERVICIOS ESENCIALES
  - 4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION
  - 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE
  - 6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA

**ZONA SUR-----115**

I. *NUEVA CHOLUTECA, LIMON DE LA CERCA, CHOLUTECA*

- A. PRESENTACION-----116
- B. CONSTRUCCION-----118
  - 1. PROCESO CONSTRUCTIVO
  - 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL
  - 3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA
  - 4. MANTENIMIENTO
- C. ADMINISTRACION-----121
  - 1. POBLACION
  - 2. MARCO INSTITUCIONAL
  - 3. SERVICIOS ESENCIALES
  - 4. ORGANIZACION COMUNITARIA Y CAPACITACION
  - 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE}
  - 6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA

## **PRESENTACION GENERAL**

La presentación de este informe por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) obedece al propósito de sistematizar todas las acciones de diez meses de apoyo al reasentamiento temporal de los damnificados del huracán Mitch.

Este documento incluye todas las actividades relativas a la construcción de las Comunidades Habitacionales de Transición (CHAT's), así como al mantenimiento de su infraestructura.

Se ha incluido en un capítulo especial la atención brindada a los damnificados ubicados en CHAT's en materia de servicios sociales como salud, educación y organización comunitaria, así como la dotación de electricidad, agua y saneamiento.

El proceso de reasentamiento permanente a través de la construcción de viviendas definitivas para los damnificados también es objeto de recopilación de información y su respectivo análisis.

Las coordinaciones interinstitucionales efectuadas durante todo el proceso se han recopilado y sistematizado en un capítulo aparte, que enfatiza el valor de los procesos de sinergia generados a partir del proceso de reasentamiento temporal.

Finalmente, se incorpora una ficha técnica de cada una de las 13 CHAT's, donde se detallan minuciosamente todas sus características.

El aporte del Gobierno de Honduras, dirigido por el Gabinete de Reconstrucción y coordinado por la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO), resultó vital para el éxito del proceso, tanto a través del diseño y planificación del reasentamiento temporal, así como de la implementación de varios de sus componentes, particularmente en la dotación de los servicios sociales.

El apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional los Estados Unidos (USAID) ha permitido el desarrollo de un proceso integral que combina la atención humanitaria de emergencia, así como la generación de las condiciones propicias para el reasentamiento permanente. El apoyo en Tegucigalpa, mediante el Programa de Salida de los damnificados ubicados en CHAT's y microalbergues, asegura la conclusión exitosa de la transición hacia la vivienda definitiva.

También la contribución del Gobierno de Noruega, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el inicio de la construcción de CHAT's en Tegucigalpa permitió obtener resultados desde un primer momento. Igualmente el apoyo de agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, PMA,

OPS/OMS, UNESCO y FNUAP fortaleció el apoyo a los damnificados, en áreas vitales como alimentación, educación y salud.

La sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales también ha contribuido en la atención a los damnificados de CHAT's, particularmente en un aspecto sensible y en el cual reside el éxito de todo el proceso, como es el de la construcción de viviendas definitivas para los damnificados.

En definitiva un nuevo modelo de cooperación que involucra los esfuerzos y acciones conjuntas de las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad internacional es factible a través de procesos como el que se describe en este informe.

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **1.- ANTECEDENTES**

Como consecuencia del devastador efecto del Huracán Mitch sobre las viviendas de miles de hondureños, éstos se vieron obligados a buscar refugio temporal en escuelas y otras instalaciones similares.

Dada la situación de emergencia, el 16 de diciembre de 1998, el Gobierno de Honduras solicita al Sistema de las Naciones Unidas y a la OIM el diseño e implementación de un censo de damnificados refugiados en escuelas, iglesias, centros comunales, etc., y la construcción de albergues temporales para éstos.

Ante esta situación la OIM reinstala su Misión en Honduras el 1 de diciembre de 1998 para apoyar el proceso de reconstrucción nacional en coordinación con el Gabinete de Reconstrucción. Como un primer paso hacia la identificación de soluciones a corto y mediano plazo, entre el 5 y el 13 de enero se llevo a cabo el censo determinándose la existencia de 26,667 damnificados ubicados en refugios temporales a esa fecha.

A continuación se inició en ese mismo mes la construcción de los nuevos albergues en Tegucigalpa, denominados Comunidades Habitacionales de Transición (CHAT's).

### **2.- CONSTRUCCION DE CHAT's**

Entre enero y agosto de 1999 fueron construidas 13 CHAT's, de las cuales 4 se encuentran en Tegucigalpa y las restantes 9 en el interior del país. Las CHAT's fueron construidas en 9 municipios (Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés, La Ceiba, Tocoa, Sonaguera y Trujillo), pertenecientes a 6 departamentos del país (Francisco Morazán, Choluteca, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón).

Las primeras CHAT's en finalizar la construcción fueron El Trébol I y El Molino I y II, completadas en un período de un mes. El último fue finalizado en el mes de agosto, siendo el mismo El Trébol II, ubicado también en Tegucigalpa.

Los terrenos en que se edificaron las CHAT's fueron concedidos para uso temporal en arriendo o préstamo (Tegucigalpa, El Progreso, Puerto Cortés) o definitivo (Choluteca, San Pedro Sula, Sonaguera, La Ceiba, Ilanga, Tocoa).

Para iniciar la construcción se debió realizar labores de preparación, limpieza y nivelación de los terrenos, tareas que estuvieron a cargo del FHIS y las Alcaldías Municipales con el apoyo de OIM.

Se utilizaron tres modelos de construcción, que son: galeras, 60 metros de largo por 8 metros de ancho máximo, que se dividen en dos alas de 15 unidades familiares de 4 x 4 metros (Tegucigalpa, SPS, Puerto Cortés, El Progreso, Trujillo, Tocoa); módulos cuatrfamiliares (Ceiba), y módulos uni-familiares, construidos en aquellos lugares donde el terreno fue donado en forma definitiva y los lotes individuales fueron asignados a las familias beneficiadas (Choluteca y Sonaguera).

Se construyeron 77,418 metros cuadrados lo que implicó la utilización de 59,460 laminas de zinc, 59,460 laminas de panelit y 891,833 pies cúbicos de madera, entre los principales materiales utilizados. Éstos serán destinados a beneficiar a las comunidades en donde se reasentarán las familias damnificadas de forma definitiva.

El saneamiento fue contemplado en cada CHAT, construyéndose un total de 1,112 letrinas, 957 baños y 621 lavaderos.

Con el fin de dotar a las CHAT's de electricidad se coordinó con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que instaló la electricidad externa (postes y cableado hasta las acometidas), quedando a cargo de OIM la instalación interna de la energía eléctrica.

La dotación de agua se ha hecho a través del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), con la conexión a redes locales o por medio de provisión en cisternas que son transportadas en camión para suministro en recipientes que abastecen a la población en un promedio de 20 galones por familia.

En todo el proceso de construcción accedieron a un empleo temporal más de 1,000 personas de las cuales un porcentaje de ellos fueron los propios damnificados. En cada proyecto OIM dispuso de una estructura operativa que contaba con un ingeniero residente, maestros de obras, bodegueros, carpinteros, albañiles y personal logístico.

En forma posterior a la construcción, se dio inicio a un proceso de mantenimiento permanente de las CHAT's aprovechando la experiencia adquirida en términos de la participación de los propios damnificados en lo posible en el mantenimiento de su hábitat temporal. El mantenimiento incluye actividades tales como: reparaciones menores en infraestructura de paneles, puertas y lavaderos; estabilización de taludes; cercado de galeras con pendiente; canalización para drenajes de aguas lluvias; refuerzo de techos; sellado de letrinas; reparación de la infraestructura de pisos; construcción de plataformas; reparación de forros en paneles de cubículos dañados; instalación de tanques de almacenamiento de agua, y mantenimiento de letrinas.

### **3. ORGANIZACION SOCIAL DE CHAT 's**

El proceso de atención a los damnificados, no concluía con la construcción de la infraestructura física; además requería de la implementación de servicios sociales que permita también la atención humanitaria de los damnificados, y su preparación para el reasentamiento definitivo.

En cada CHAT se establecieron administradores, con las funciones de coordinar y apoyar en la intervención de las distintas instituciones involucradas, articular a las mismas con los damnificados y promover la organización en la vida diaria de las CHAT 's entre otras actividades.

En Tegucigalpa, la Cruz Roja Hondureña fue designada como la institución administradora de El Trébol I y II, El Molino I y II. En el interior del país, OIM en coordinación con las Alcaldías Municipales administra las CHAT 's de Tocoa, La Ceiba, Sonaguera, Trujillo y Puerto Cortés. A las instituciones mencionadas en Choluteca se agrega la ONG Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) y en El Progreso el Comité de Reconstrucción de la Iglesia Católica. En San Pedro Sula, la entidad administradora es la Fundación Vida Nueva, integrada por la Alcaldía de este municipio y diversas ONG's. En todos los casos OIM apoya la administración.

Para desarrollar esta función de administración o apoyo a la misma, OIM cuenta con un equipo que se distribuye de la siguiente manera:

<b>OFICINA CENTRAL</b>	Coordinador de Atención a Damnificados Oficial de Enlace Coordinador Organización Comunitaria y Capacitación Oficial de Información Consultores en las áreas de Salud, Educación y Empleo
<b>CHAT TEGUCIGALPA</b>	2 Coordinadores de Albergue
<b>REGIÓN SUR (Sub-sede en Choluteca)</b>	Coordinador Regional 2 promotores
<b>REGIÓN CORTÉS Y YORO (Sede en San Pedro Sula)</b>	Coordinador Regional 3 Coordinadores de Albergue 2 Promotores Sociales
<b>REGIÓN ATLÁNTIDA Y COLÓN (Sede en La Ceiba)</b>	Coordinador Regional 4 Coordinadores de Albergue 3 Promotores Sociales

Entre los componentes de atención humanitaria se han desarrollado los siguientes aspectos:

a) Atención directa.

La principal contribución en materia de atención directa fue la donación de kits de emergencia, los cuales fueron entregados a las familias damnificadas que residen en los albergues en todo el país y cuyo contenido fue seleccionado con énfasis en las necesidades de la mujer y los niños; los kits incluyen artículos para infantes, de higiene, utensilios para cocinar y comer, y colchones.

b) Programas sociales

Salud

La atención brindada en materia de salud se ha concentrado en mejorar los servicios de salud ofrecidos a la población damnificada, en reconocimiento al nivel de vulnerabilidad que la caracteriza, así como en los aspectos de salud preventiva, incluyendo el mejoramiento en las condiciones y las prácticas relacionadas al saneamiento e higiene básica.

En tal sentido, se convocó a la Secretaría de Salud, las agencias especializadas en salud del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo OPS, UNICEF y FNUAP, y a la Cruz Roja Hondureña, para exponer la situación de la salud en los albergues y solicitar una respuesta coordinada entre las entidades indicadas. En seguida se generalizó al interior del país, dónde se tomó contacto con los beneficiarios, municipalidades, oficinas regionales de la Secretaría de Salud y ONG's claves en la atención a salud en cada CHAT para determinar un plan local. Como resultado de la coordinación mencionada, la presencia del personal de Salud Pública ha aumentado en las CHATs en materia de atención y programas de educación/sensibilización; dicha iniciativa del Gobierno es apoyado por OPS a través del financiamiento de varios estudios médicos, equipamiento médico para varios centros que atienden a las CHATs y la contratación de veintiuno (21) personal médico, incluyendo 6 médicos, 5 enfermeras, 6 promotores y 2 odontólogos, y por OIM en el compromiso de habilitar consultorios médicos y apoyar en la organización de los beneficiarios en torno a la salud.

Como resultado de esta coordinación, también se realizaron algunas intervenciones puntuales en lo que respecta a saneamiento básico, que incluye la provisión de tubería (por UNICEF) y de llaves (por OPS) para ampliar la red de distribución de agua potable en la CHAT de Sonaguera, un estudio técnico para identificar una solución al problema de la disposición de basura en Baracoa y otro estudio técnico para explorar las alternativas de solución a la carencia de letrinas en Choluteca, ambos financiado por OPS.

Educación

La metodología aplicada para el diseño y formulación de la intervención en el área de educación es parecida a la detallada arriba, es decir, se convocó a la Secretaría de Educación, al FHIS y a las agencias del Sistema de las NNUU especializadas en el tema, incluyendo UNICEF y UNESCO para buscar una solución integrada. Tras una serie de reuniones en el campo y en la Ciudad Capital, para las cuales se contó con la participación de actores claves del ámbito local y especialmente de los beneficiarios, se suscribió un convenio con la Secretaría de Educación el 3 de septiembre de 1999, que contempla la provisión de servicios de educación preescolar, primaria y adulta (no formal), así como la atención a infantes mediante la habilitación de Hogares de Cuidado Infantil en cada CHAT.

Dado el alto grado de deserción e inasistencia por los niños dentro de la población meta, se realizó una campaña para motivar la participación de niños y niñas en un curriculum extraordinario (primaria acelerada), apoyado por la Secretaría de Educación, que les permite iniciar sus estudios en el mes de septiembre, continuar durante las vacaciones regulares (noviembre a febrero) y examinarse para aprobar el año lectivo.

Para cumplir con los objetivos establecidos en el convenio en mención, OIM asumió el compromiso de habilitar los espacios educativos, financiar la contratación por la Secretaría de Educación, de 28 maestros para manejar el curriculum especial y fortalecer las escuelas existentes en las CHATs, proveer de un estímulo económico a las madres educadoras de los centros preescolares (CEPENFs) y el equipo para los hogares infantiles. Adicionalmente, el Programa contribuirá con US\$16,000 para el Programa de EDUCATODOS destinados para la provisión de educación para adultos en las CHATs. UNICEF ha contribuido a la formación técnica del personal en mención, el mobiliario para los CEPENFs y las escuelas primarias y materiales educativos. La Secretaría de Educación se ha responsabilizado por el funcionamiento de todos los componentes del Programa, la selección y supervisión de los maestros, la provisión de textos escolares y la facilitación de los trámites requeridos para certificar a los estudiantes.

### Organización Comunitaria

La organización comunitaria se percibe como una necesidad, tanto para el manejo y administración adecuada de las CHATs, como para asegurar el impacto y la sostenibilidad de las iniciativas del Programa.

Las actividades de apoyo a la organización de los beneficiarios se han realizado en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil presentes en cada CHAT, incluyendo ONG's, iglesias y otros grupos locales, y en coordinación con el departamento de Desarrollo Comunitario de cada Municipalidad.

Aunque la metodología se adapta a las características específicas de la organización y el liderazgo local en cada CHAT, el modelo básico de organización incluye la elección democrática de coordinadores por fila o agrupación de unidades familiares y la formación de comisiones específicas en áreas como salud, educación, seguridad y limpieza.

#### Formación técnico profesional

El Programa contempla un componente de apoyo a la reinserción socioeconómica a través de la habilitación y formación técnico profesional de los beneficiarios y la articulación entre la oferta y demanda de empleo en cada zona de intervención. Actualmente, se está realizando una consultoría con el objetivo de identificar la demanda de empleo y servicios en cada municipalidad y para iniciar contactos con las empresas e instituciones dedicadas a la formación técnico profesional y apoyo a la microempresa. Los insumos de esta consultoría permitirán el diseño y formulación adecuada del componente para iniciar su implementación en el mes de diciembre del año en curso.

#### **4. REASENTAMIENTO DEFINITIVO**

Como parte de un proceso integral de reasentamiento definitivo, OIM también apoya el proceso de dotación de viviendas permanentes para los damnificados en Tegucigalpa y monitorea el mismo en el interior del país.

El caso de Tegucigalpa amerita un análisis aparte en la medida que los problemas estructurales de la capital que determinan un déficit de viviendas histórico han demorado el proceso de reasentamiento permanente. Expresión de esta problemática lo han constituido la dificultad para identificar terrenos, problemas legales en cuanto a la propiedad de los mismos, falta de infraestructura sanitaria o de acceso a servicios sociales, problemas ambientales, limitación de oportunidades de empleo en las áreas identificadas, entre otros han generado un ritmo más lento que el observado en las ciudades del interior. Sin embargo esto a la vez se ha traducido en la oportunidad de planificar y diseñar procesos integrales de reasentamiento, que involucren no solamente vivienda, sino accesos, saneamiento, empleo, salud, educación, fortalecimiento del componente social y otros elementos que aseguran el éxito del proceso. En tal sentido OIM con fondos de la OTI/USAID ha puesto en marcha el Programa de Salida de Albergues, con el propósito de facilitar el acceso a vivienda definitiva aproximadamente a 2,000 familias que residen en albergues, mediante la provisión de asistencia financiera y técnica a las ONG's involucradas en la implementación de soluciones habitacionales.

## **5.- COORDINACION INTERINSTITUCIONAL**

La implementación del proyecto de Construcción de Macro Albergues y Asistencia de Emergencia a Damnificados ha determinado además de un esfuerzo de recursos humanos y financieros dirigidos a la ejecución directa de los componentes financiados por USAID, una coordinación de esfuerzos y apoyos de distintas entidades tanto organizaciones hondureñas gubernamentales y no gubernamentales, como de la Comunidad Internacional. En tal sentido se han coordinado actividades con las siguientes instituciones:

### **Gobierno Central**

La Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (IHNFA), la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) y la Policía Nacional, entre otros.

### **Gobiernos Municipales**

En Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés, La Ceiba, Trujillo, Tocoa y Sonaguera. En el interior del país, se han suscrito convenios de cooperación relacionados con la administración de las CHATs en La Ceiba, Sonaguera y Tocoa y están por firmarse en los otros municipios.

### **Comunidad Internacional**

Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana para la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas de Población (FNUAP); ONG's internacionales, incluyendo el Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI), Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Española, CARITAS, Catholic Relief Services, ATLAS Logistique, Acción Contra el Hambre, CARE, Asociación Navarra Nuevo Futuro y varias iglesias.

### Sociedad Civil Hondureña

Las organizaciones nacionales de la sociedad civil han asumido un rol importante en varias CHATs, particularmente en materia de organización comunitaria y atención psicosocial, entre ellos Socorro Jurídico en El Progreso, Mujeres Universitarias de Honduras y el Centro de Derechos de la Mujer, entre otros.

## **6. RECURSOS FINANCIEROS**

USAID canalizó US\$ 6,808,605 dólares para la construcción de CHAT's, mantenimiento y su administración, dotación de kits de emergencia, transporte de damnificados, saneamiento en el interior del país, electricidad interna, educación y salud, formación técnico social y profesional, gastos administrativos de la operación, así como US\$ 3,094,439 dólares dirigidos a la implementación de soluciones habitacionales permanentes en Tegucigalpa, a través de ONGs.

Por otra parte, para la construcción en Tegucigalpa el Gobierno de Noruega a través del PNUD aportó US\$ 600,000, OPS aportó US\$ 215,136 para el saneamiento de las CHAT's en Tegucigalpa y UNICEF US\$ 43,095 para la instalación del sistema de aguas grises.

## **BALANCE Y LECCIONES DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO TEMPORAL DE LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACAN MITCH**

El proceso de reasentamiento temporal de los damnificados, presenta los siguientes logros:

- ◆ Inicio del ciclo lectivo del año 1999 en la Ciudad Capital, mediante la construcción de las CHAT's , sin mayores retrasos.
- ◆ Se brinda una atención integral a los damnificados en cuanto a servicios de salud, educación, formación técnico profesional, así como dotación de alimentación, agua y electricidad, lo que configura una transición digna hacia el reasentamiento definitivo.
- ◆ En la etapa de reasentamiento temporal, se crean condiciones para el proceso de reasentamiento definitivo a través del desarrollo de la formación técnico profesional, técnico social para fortalecer la organización comunitaria, así como en varios casos a través de la facilitación del proceso de auto-construcción de sus viviendas.
- ◆ Se generaron procesos de sinergia en apoyo a los damnificados con el trabajo conjunto con más de 11 instituciones gubernamentales y 9 Municipalidades y 20 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
- ◆ A través de un convenio con la Secretaría de Educación, 446 niños y niñas que no obtuvieron cupo en escuelas o que no podían acceder a éstas por distintos motivos o que estudiaban en las escuelas habilitadas en las CHATs sin acceso a servicios adecuados (maestros, materiales, textos escolares, etc.), tendrán la oportunidad de aprobar el año escolar. Asimismo se atienden a 1765 niños en educación primaria (curso regular) y 736 niños en los centros pre-escolares. El Programa financia 28 maestros.
- ◆ En materia de salud, a través de coordinaciones con la Secretaría de Salud y OPS/OMS, se brinda atención médica a más de un mil (1,000) beneficiarios por semana, existen once (11) centros y puestos de atención a salud y se cuenta con un equipo de veintiuno personas, incluyendo médicos, odontólogos, enfermeras y promotores de salud para atender a la población meta.
- ◆ Se entregan kits de emergencia a las familias damnificadas que residen en albergues en todo el país, que enfatizan las necesidades de la mujer y los niños, población predominante en las CHAT's.

- ◆ Para fortalecer la organización y la participación comunitaria, se ha brindado apoyo en la formación de 66 Comités Comunitarios en diversas áreas, incluyendo salud, educación, coordinación, vigilancia y género.
  
- ◆ Se generó una infraestructura temporal de la cual a través de sus materiales se contribuirá a la infraestructura social y familiar de los lugares de reasentamiento definitivo.

Como aspectos pendientes o susceptibles de fortalecimiento podemos mencionar:

- La incorporación de programas de generación de ingresos que consoliden el reasentamiento permanente, particularmente en algunos municipios (Sonaguera).
  
- La agilización del proceso de reasentamiento permanente en Tegucigalpa, Puerto Cortés y Sonaguera.

**CUADRO 1: INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y SANITARIA**

CHAT	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Infraestructura Habitacional				Infraestructura Sanitaria			Electricidad	
			No. Unidades Familiares	No. Cocinas	No. Mód. Sociales	Área Const. Mts <sup>2</sup>	No. Letrinas	No. Baños	No. Lavaderos		
ZONA CENTRAL	Molino I	1/18/99	2/19/99	471	40	35 <sup>1</sup>	7,936	92	150	190	Instalada
	Molino II	1/18/99	2/19/99	199	22	3 <sup>1</sup>	3,296	44	77	111	Instalada
	Trébol I	1/13/99	2/12/99	449	45	39 <sup>1</sup>	7,264	200	404	188	Instalada
	Trébol II	6/22/99	9/2/99	306	28	3	5,430				Instalada
	Cofradía	2/10/99	6/3/99	593		67 <sup>1</sup>	9,600	110	170	56	Instalada
	Progreso	1/22/99	5/10/99	406		60 <sup>1</sup>	7,648	180	144	20	Instalada
ZONA NORTE	Gran Villa	2/12/99	4/16/99	92		2 <sup>1</sup>	1,440	30	12	12	Instalada
	Baracoa	2/13/99	4/16/99	44		6 <sup>1</sup>	1,504	20			Instalada
	Ceiba	26/2/99	4/1/99	164		10 <sup>1</sup>	2,784	28		24	Instalada
	Sonaguera	4/10/99	6/20/99	310		7 <sup>1</sup>	5,072	317			Externa No Instalada
	Trujillo	4/30/99	6/10/99	154		16 <sup>1</sup>	2,592	35		10	Externa No Instalada
	Tocoa	3/20/99	5/20/99	177		5 <sup>1</sup>	2,912	56		10	Externa No Instalada
ZONA SUR	Choluteca	3/1/99	7/8/99	1200		10	19,940				Externa En perímetro de la CHAT
<b>TOTALES</b>				<b>4,565</b>	<b>135</b>	<b>263</b>	<b>77,418</b>	<b>1,112</b>	<b>957</b>	<b>621</b>	

■ Saneamiento ejecutado por el FHIS. No se tiene cuantificación de la obra.

■ Su construcción forma parte del Programa de Mantenimiento.

■ El diseño no incluyó área de cocina.


■ Proyecto sanitario a cargo del FHIS, AID en ejecución.

<sup>1</sup> El número reflejado corresponde al número de cubículos utilizados.

**CUADRO 2 A:**

**Población Total en las CHATS**

CHAT	FAMILIAS		Categorías de Edad (años)					TOTAL (Personas)
	CENSADAS	ACTUALES	0-5	6-12	13 - 17	18 - 50	> 50	
<b>ZONA CENTRAL</b>								
Molino I	491	491	517	501	288	748	99	2153
Molino II	183	183	196	184	90	343	49	862
Trébol I	455	455	463	479	237	639	89	1907
Trébol II*	275	275	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.	S.I.
<b>TOTAL</b>	<b>1404</b>	<b>1404</b>	<b>1176</b>	<b>1164</b>	<b>615</b>	<b>1730</b>	<b>237</b>	<b>4922</b>
<b>ZONA NORTE**</b>								
Ceiba	166	166	158	159	74	292	37	720
Trujillo	127	135	98	156	54	176	33	517
Tocoa	137	200	124	173	74	230	36	637
Sonaguera	315	315	280	356	164	523	56	1379
El Progreso	289	293	223	363	189	439	95	1309
Baracoa	33	41	30	35	16	54	10	145
Gran Villa	74	77	52	85	24	101	20	282
Cofradía	447	486	532	540	212	728	88	2100
<b>TOTAL</b>	<b>1588</b>	<b>1713</b>	<b>1497</b>	<b>1867</b>	<b>807</b>	<b>2543</b>	<b>375</b>	<b>7089</b>
<b>ZONA SUR</b>								
Choluteca ***	506	506	487	493	273	901	193	2347
<b>TOTAL</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>487</b>	<b>493</b>	<b>273</b>	<b>901</b>	<b>193</b>	<b>2347</b>
<b>TOTALES</b>	<b>3498</b>	<b>3623</b>	<b>3160</b>	<b>3524</b>	<b>1695</b>	<b>5174</b>	<b>805</b>	<b>14358</b>

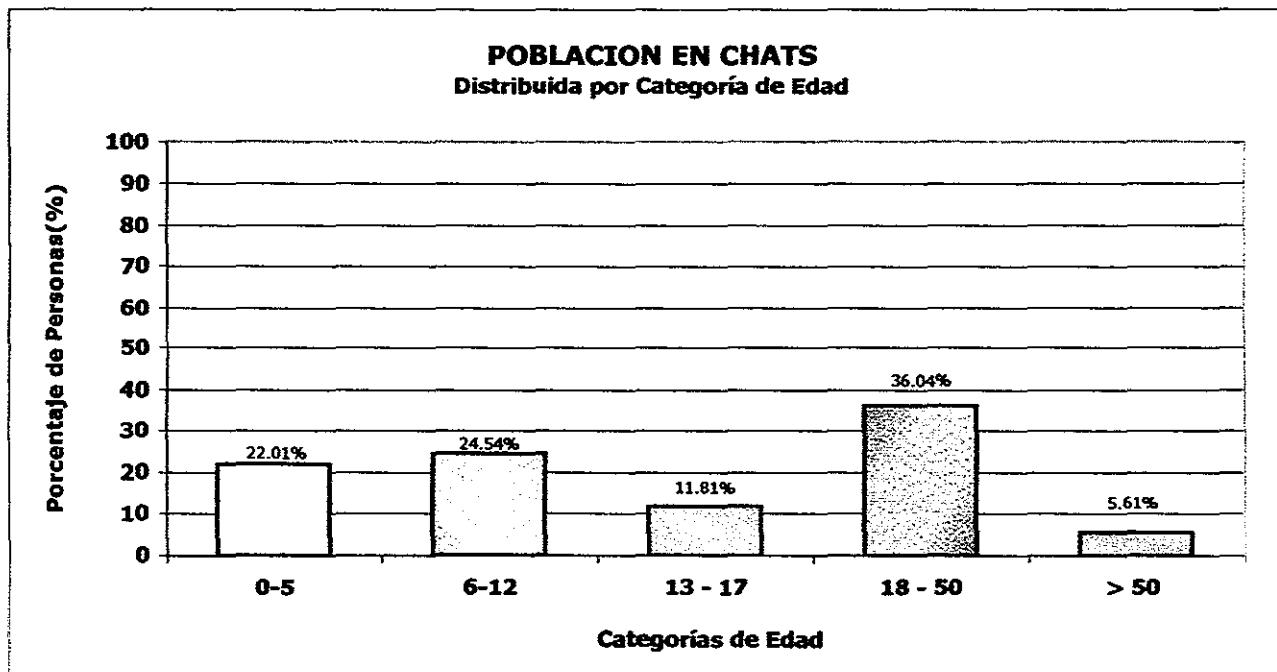

\* Datos provistos por la Cruz Roja Hondureña.

\*\* Información basada en censo realizado en los meses de Julio y Agosto, el cual está en proceso de actualización.


\*\*\* Datos basados en censo realizado en Choluteca que resultan parciales, en la medida que existen beneficiarios con permanencia semi-regular en los microalbergues.

S.I. :Sin Información.

**CUADRO 2 B:**

**Población Total en las CHATS  
Distribuida por Sexo**

CHAT	SEXO		TOTAL
	Femenino	Masculino	
<b>ZONA CENTRAL</b>			
Molino I	1199	954	2153
Molino II	450	412	862
Trébol I	1066	841	1907
Trébol II	S.I.	S.I.	S.I.
<b>TOTAL</b>	<b>2715</b>	<b>2207</b>	<b>4922</b>
<b>ZONA NORTE**</b>			
Ceiba	385	335	720
Trujillo	233	284	517
Tocoa	330	307	637
Sonaguera	680	699	1379
El Progreso	665	644	1309
Baracoa	69	76	145
Gran Villa	141	141	282
Cofradía	1070	1030	2100
<b>TOTAL</b>	<b>3573</b>	<b>3516</b>	<b>7089</b>
<b>ZONA SUR</b>			
Choluteca **	1225	1122	2347
<b>TOTAL</b>	<b>1225</b>	<b>1122</b>	<b>2347</b>
<b>TOTALES</b>	<b>7513</b>	<b>6845</b>	<b>14358</b>



\*\* Información basada en censo realizado en los meses de Julio y Agosto, el cual está en proceso de actualización.

\*\*\* Datos basados en censo realizado en Choluteca que resultan parciales, en la medida que existen beneficiarios con permanencia semi-regular en los microal S.I. :Sin Información.

**CUADRO 3 A: SERVICIOS SOCIALES EN LOS ALBERGUES**

**EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA**

CHAT	SERVICIOS SOCIALES						
	ESPACIOS EDUCATIVOS HABILITADOS POR OIM	EDUCACION			Maestros Financiados por AID-OIM	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (NÚMERO DE COMITES)	
		ASISTENCIA		PRIMARIA ACELERADA			
		CEPENF	PRIMARIA				
<b>ZONA CENTRAL</b>	Molino I	1	---	265	---	4	2
	Molino II	---	---	---	---	---	2
	Trébol I	1	---	185	---	5	2
	Trébol II	1	---	---	---	---	---
	Ceiba	2	42	---	66	3	7
	Trujillo	2	80	132	7	1	2
<b>ZONA NORTE</b>	Tocoa	2	161	131	50	2	7
	Sonaguera	3	100	173	20	1	7
	El Progreso	7	95	---	80	4	5
	Baracoa	2	13	15	23	5	10
	Gran Villa	2	15	---	42		10
<b>ZONA SUR</b>	Cofradía	6	45	371	88	3	---
	Choluteca	7	185	493	70		12
<b>TOTALES</b>	<b>36</b>	<b>736</b>	<b>1,765</b>	<b>446</b>	<b>28</b>	<b>66</b>	

**CUADRO 3 B: SERVICIOS SOCIALES EN LOS ALBERGUES**


**SALUD**

CHAT	SERVICIOS EN LA CHAT					
	SALUD					
	CENTRO/PUESTO DE SALUD EN LA CHAT (SI /NO)	PERSONAL OPS	ATENCIÓN EN SALUD (PROMEDIO SEMANAL)	REMISIONES (PROMEDIO SEMANAL)	SISTEMA DE AGUA	
<b>ZONA CENTRAL</b>	Molino I	SI	2	145	11	Cisternas del SANAA
	Molino II	SI		70	2	Cisternas del SANAA
	Trébol I	SI		360	13	Red local conectada a 18 llaves de agua potable en cada galera
	Trébol II	---		---	---	Red local conectada a 18 llaves de agua potable en cada galera
<b>ZONA NORTE</b>	Ceiba	SI	2	30	6	Agua potable suministrada a través de un máquina potabilizadora. Adicionalmente, existen 3 pozos para usos domésticos.
	Trujillo	SI	2	11	2	Agua potable suministrada a través de llaves públicas con conexión a la red local. Existe un pozo para usos domésticos.
	Tocoa	SI	---	50		Por conexión a la red local
	Sonaguera	SI	3	22	2	Por conexión a la red local y a través de dos pozos construidos por OIM y la Secretaría de Salud
	El Progreso	SI	2	40	10	Por conexión a la red local
	Baracoa	---	3	20	7	Por conexión a la red local
	Gran Villa	---		31	4	Por conexión a la red local
	Cofradía	SI	3	150	2	Vejigas de agua abastecidas a diario
<b>ZONA SUR</b>	Choluteca	SI (2)	5	98	5	4 pozos; se presume que FHIS instalará bombas eléctricas de agua y una red de distribución en la comunidad, mientras tanto OIM suministra agua potable almacenada en vejigas
<b>TOTALES</b>			<b>22</b>	<b>1,027</b>	<b>64</b>	

**CUADRO 4 A: REASENTAMIENTO PERMANENTE**

	CHAT	NÚMERO DE FAMILIAS	VIVIENDAS COMPROMETIDAS	DÉFICIT VIVIENDAS PARA GRUPO META
<b>ZONA CENTRAL</b>	Molino I	491	1404 <sup>1</sup>	0
	Molino II	183		
	Trébol I	455		
	Trébol II	275		
<b>ZONA NORTE</b>	Ceiba	166	166 <sup>1</sup>	0
	Trujillo	135	114	21
	Tocoa	200	200 <sup>1</sup>	0
	Sonaguera	315	0	315
	El Progreso	293	259	34
	Baracoa	41	0	41
	Gran Villa	77	0	77
<b>ZONA SUR</b>	Cofradía	486	486 <sup>1</sup>	0
	Choluteca	506	506 <sup>1</sup>	0
<b>TOTALES</b>		<b>3623</b>	<b>3135</b>	<b>488</b>

**REASENTAMIENTO PERMANENTE**


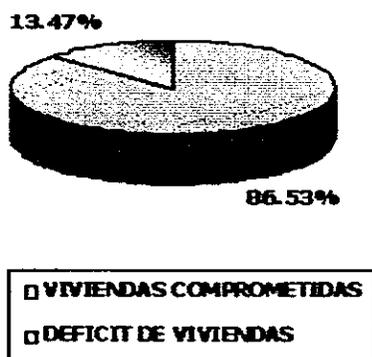


<sup>1</sup> La oferta sobrepasa el número mencionado incluyendo otros beneficiarios como por ejemplo los de microalbergues en Tegucigalpa.

**CUADRO 4 B: ESTADO DE AVANCE DE LAS VIVIENDAS COMPROMETIDAS**

	CHAT	VIVIENDAS COMPROMETIDAS	FINALIZADAS	EN CONSTRUCCIÓN	POR INICIAR
<b>ZONA CENTRAL</b>	Molino I	1404 <sup>2</sup>	27	382	995 <sup>1</sup>
	Molino II				
	Trébol I				
	Trébol II				
<b>ZONA NORTE</b>	Ceiba	166 <sup>1</sup>	130	28	8 <sup>1</sup>
	Trujillo	114	12	52	50
	Tocoa	200 <sup>1</sup>	81	119 <sup>1</sup>	0
	El Progreso	259	0	0	259
	Cofradía	486 <sup>1</sup>	0	486 <sup>1</sup>	0
<b>ZONA SUR</b>	Choluteca	506 <sup>1</sup>	506 <sup>1</sup>	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3135</b>	<b>756</b>	<b>1067</b>	<b>1312</b>

**ESTADO DE AVANCE DE LAS VIVIENDAS COMPROMETIDAS**




<sup>2</sup> La oferta sobrepasa el número mencionado incluyendo otros beneficiarios como por ejemplo los de microalbergues en Tegucigalpa.

**CUADRO 5: EMPLEO vrs. DESEMPLEO**

CHAT	Activamente Trabajando (%) (Jefes de Familia)	
	SI	NO
Molino I*	34%	66%
Molino II*	47%	53%
El Trebol I*	37%	63%
Ceiba	83%	17%
Trujillo	74%	26%
Tocoa	92%	8%
Sonaguera	48%	52%
El Progreso	75%	25%
Baracoa	76%	24%
Gran Villa	51%	49%
Cofradía	72%	28%
Choluteca	63%	37%

\* Los datos en Tegucigalpa, corresponden a la población adulta en total.

**EMPLEO vrs. DESEMPLEO**

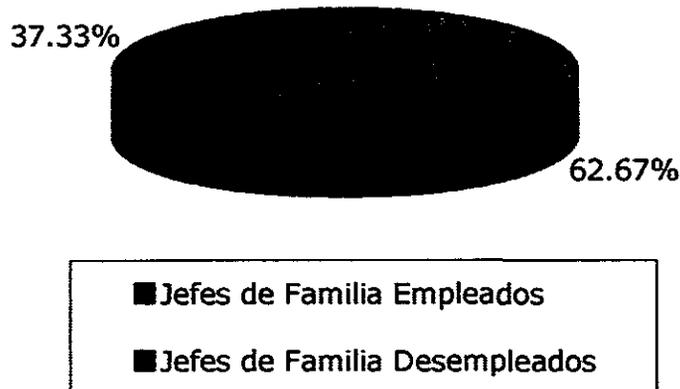


## CUADRO 6: KITS DE EMERGENCIA

Durante el periodo de 4 meses (desde 28 de abril a la fecha), la OIM entregó un kit de apoyo familiar a un total de 3,544 familias, beneficiarios de las 12 CHATs ubicadas en la ciudad capital y en el interior del país. Cada bolsa empacada cuenta con los siguientes artículos:

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD
Cepillos de dientes para adultos	4	unidad
Cepillos de dientes para niños	4	unidad
Pastas dentales	2	unidad
Shampoo	1	unidad
Barras de jabón de baño	6	unidad
Detergente	2	bolsa
Papel Higiénico	4	rollo
Toalla Sanitaria (10 unidades)	3	paquete
Toalla de baño	1	unidad
Caja de curitas (100 unidades)	1	caja
Paquete de pañales de tela (6 unidades)	1	paquete
Talco para cuerpo	1	unidad
Pepe	1	unidad
Leche	8	caja
Platos	5	unidad
Juegos de tazas	5	juego
Cucharas	5	unidad
Tenedores	5	unidad
Cuchillo	1	unidad
Cacerola	1	unidad
Freidera	1	unidad
Balde Plástico	1	unidad


Los beneficiarios recibieron una bolsa conteniendo los artículos descritos anteriormente además de 3 colchones de 4" de grosor. Cada kit esta valorado en 1,225.03 Lempiras, equivalente a US\$ 87.39.



## KITS ENTREGADOS

CHAT	CANTIDAD
Molino I	485
Molino II	177
Trébol I	436
Cofradía	486
El Progreso	292
Gran Villa	86
Baracoa	36
Ceiba	155
Sonaguera	313
Trujillo	135
Tocoa	182
Choluteca	837
<b>TOTALES</b>	<b>3620</b>


**CUADRO 7: DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS Y PERSONAL DEL PROGRAMA CHAT's**

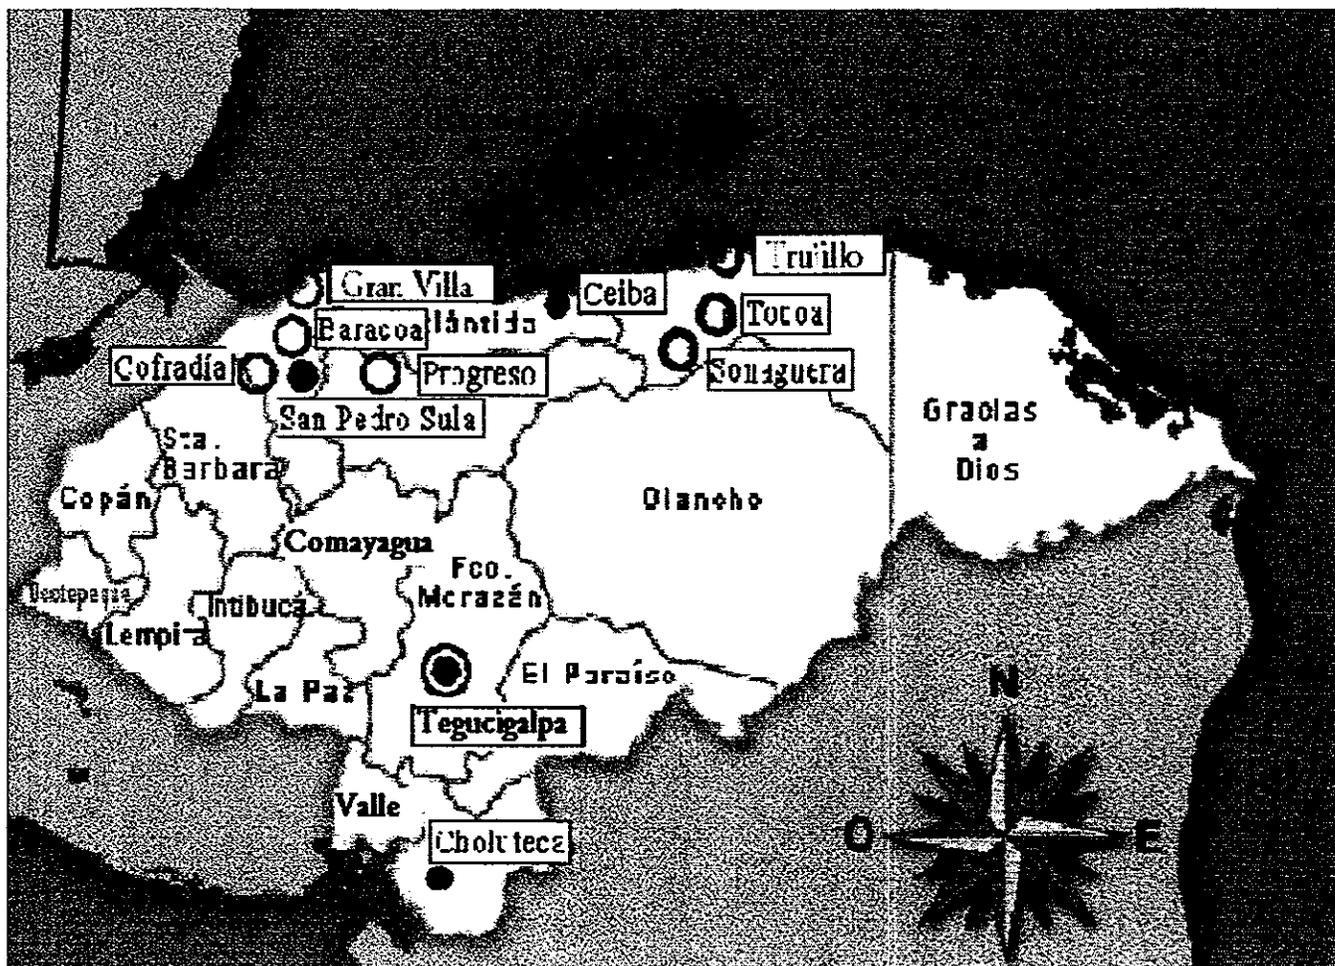

OFICINA CENTRAL     
  OFICINA DE CAMPO     
  SUB-OFICINA DE CAMPO

<b>ZONA CENTRAL</b>	Coordinador Atención a Damnificados Oficial de Enlace Coordinador Organización Comunitaria y Capacitación Oficial de Información Consultores en las áreas de Salud, Educación y Empleo 2 Coordinadores de Albergue
<b>ZONA NORTE</b>	1 Coordinador Regional departamentos de: Cortés y Yoro (sede en San Pedro Sula) 3 Coordinadores de Albergue 2 Promotor Social 1 Coordinador Regional departamentos de: Atlántida y Colón (Sede en La Ceiba) 4 Coordinadores de Albergue 3 Promotores Sociales
<b>ZONA SUR</b> (Sub-sede en Choluteca)	1 Coordinador Regional 2 promotores

# ZONA CENTRAL

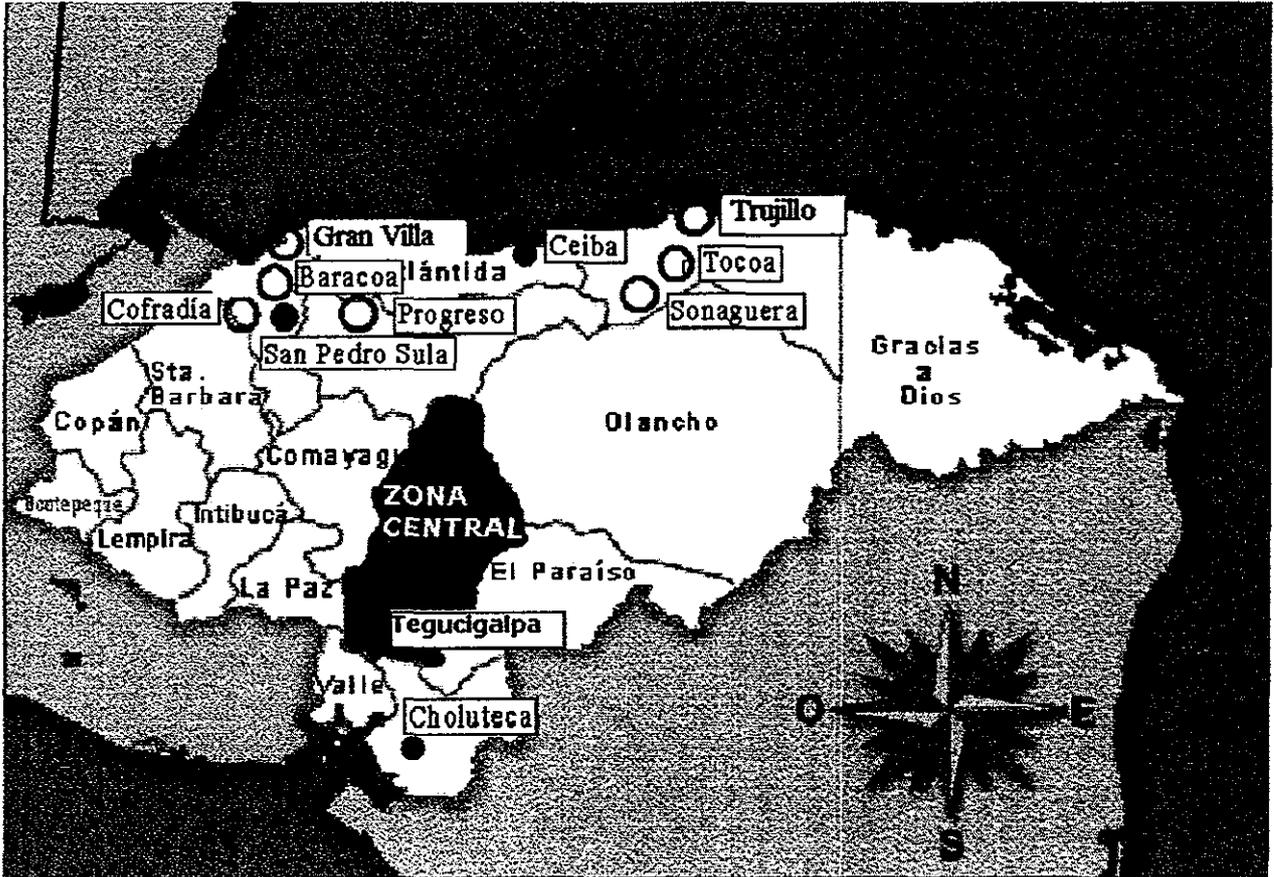

- OFICINA CENTRAL
- OFICINA DE CAMPO
- SUB-OFICINA DE CAMPO

En Tegucigalpa, la Ciudad Capital se encuentran ubicadas cuatro Comunidades Habitacionales de Transición (CHAT' S): El Molino I, El Molino II, El Trébol I y El Trébol II.

## **I. TEGUCIGALPA**

### **A. PRESENTACIÓN**

En el mes de enero del año en curso, el Censo Nacional de Albergues realizado por OIM reveló la permanencia de 2,511 familias en albergues temporales como escuelas, iglesias y centros comunales, en el Departamento de Francisco Morazán, lo cual representa el 43% de la población en albergues en todo el territorio nacional.

Dado la magnitud del problema en Tegucigalpa y la importancia de dar inicio a los procesos de reconstrucción en la Ciudad Capital, el Gobierno de Honduras solicitó la atención prioritaria a la reubicación de los damnificados en Tegucigalpa, requiriéndose un paso acelerado de ejecución debido a la necesidad de evacuar las escuelas previo al inicio del año escolar el primero de marzo.

Desde la etapa de planificación, los procesos relacionados con la construcción de CHAT's en Tegucigalpa, se desarrollaron dentro de un marco de colaboración estrecha entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, bajo la coordinación general de la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO).

La construcción de las primeras tres CHAT's en Tegucigalpa (El Molino I y II, El Trébol I) inició el 18 de enero y finalizó el 19 de febrero y fue financiada en un alto porcentaje por el Gobierno de Noruega, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Después de realizar una Campaña de Comunicación Social, en coordinación con varias agencias del Sistema de las Naciones Unidas y con el propósito de informar a los nuevos residentes de las CHATs sobre los servicios e infraestructuras de las mismas, se procedió al traslado de 1,043 familias, bajo la coordinación logística del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

Por las razones mencionadas arriba, se priorizó la población temporalmente ubicada en escuelas, cuya reubicación a las CHAT's permitió la evacuación de 100% de las escuelas en Tegucigalpa.

Antes del Huracán Mitch, estas familias residían en 123 distintos barrios de la Ciudad Capital, con una mayor concentración proveniente de las colonias La Soto, El Progreso, Reparto Arriba y Nora de Melgar.

La cifra poblacional inicial ha aumentado tras el ingreso paulatino de un total de 86 familias al Molino I y II y El Trébol I, y el traslado de 275 familias provenientes de los albergues Villa Olímpica, INFOP, Iglesia Católica La Pradera, Cuartel San Francisco y Montes del Sinaí al Trébol II durante el mes de octubre. Se prevé el traslado de otros damnificados en albergues y familias en zonas de alto riesgo durante el mes de noviembre, lo cual completará la ocupación de los 306 cubículos en esta CHAT, sumando un total de 1,435 familias residentes en las cuatro CHAT's de Tegucigalpa. La construcción de la CHAT El Trébol II fue financiada por USAID.

Las familias que residen en las cuatro CHAT de Tegucigalpa tienen acceso a los servicios básicos que aseguran una calidad de vida digna, incluyendo agua potable, energía eléctrica, saneamiento básico y alimentación. Además, debido a la respuesta inmediata del Gobierno de Honduras, la Sociedad Civil y la Comunidad Internacional, la población en albergues de Tegucigalpa ha recibido una atención integral en términos sociales, incluyendo servicios educativos y de salud, atención psicosocial, servicios recreativos, formación técnico social y formación técnico profesional.

### **Perspectivas Futuras**

En poco tiempo después del Huracán Mitch, se presentó un número importante de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, dedicadas a la implementación de soluciones habitacionales permanentes para la población damnificada en Tegucigalpa; la coordinación de estas organizaciones y el proceso de identificación y ejecución de proyectos de vivienda se ha realizado por parte de la Alcaldía Municipal AMDC en el ámbito local y por SETCO en el territorio nacional. Asimismo, el Programa de Salida de Albergues, financiado por OTI/USAID e implementado por OIM ha asumido un rol importante en la coordinación y apoyo financiero al grupo de ONGs.

Como se ha mencionado previamente, el proceso de reasentamiento definitivo en Tegucigalpa ha sufrido algunas demoras por varias razones, incluyendo las dificultades relacionadas con la adquisición de terrenos apropiados. Sin embargo, existen dieciocho (18) proyectos de vivienda en distintas etapas de desarrollo, de los cuales cabe destacar los proyectos de Hábitat para la Humanidad, CARITAS, Cristo del Picacho, ADRA, Nuestros Pequeños Hermanos, Cruz Roja Hondureña en Santa Rosa y Amarateca y el Instituto Hondureño de Educación por Radio, entre otros cuyos proyectos permitirán la reubicación las familias ubicadas en los albergues en los plazos establecidos.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidades Donantes:**

**PNUD:**

Financiamiento El  
Molino I, El Molino II, El  
Trébol.

**USAID:** Financiamiento El  
Trébol II, Programa de  
Mantenimiento.



**OPS:** Financiamiento para el saneamiento.

**UNICEF:** Financiamiento para la instalación de sistemas de aguas grises.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

**SETCO:** Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

**FHIS:** Realización de la limpieza, planteles y cunetas.

**ENEE:** Encargado del alumbrado público en las instalaciones.

**MINISTERIO DE FINANZAS:** Responsable de la coordinación interinstitucional.

**SANAA:** Responsable del suministro de agua para la población.

**ALCALDÍA MUNICIPAL:** Apoyo logístico con promotores sociales y en aspectos de limpieza.

**POLICÍA NACIONAL:** Seguridad en la construcción de los CHAT's.

**INJUPEMP:** Cesión temporal de las tierras donde se construyeron los CHAT's y coordinación operativa.

**INFOP:** Responsable del traslado de los damnificados.

**CRUZ ROJA:** Recepción de albergados y administración de CHAT`s.

**c) Trabajos Preparatorios:**

- ☞ Eliminación de maleza.
- ☞ Remoción de la capa vegetal.
- ☞ Tareas de recorte y relleno, así como la compactación del suelo.
- ☞ Elaboración de diseño ubicando galeras, vías de acceso y los límites del terreno (Poligonales).

Estas tareas, se realizaron de manera coordinada con el FHIS.

**d) Organización de OIM en el terreno:**



Para la ejecución de los dos proyectos en Tegucigalpa se organizó en equipos compuestos por: Dirección; Unidad logística; Unidades técnicas operativas en cada lugar, 7 unidades de supervisión y control. Por la presión del tiempo se tuvo que trabajar en turnos diurnos y nocturnos (7AM-5PM; 5PM-1AM).

Aproximadamente 200 a 300 trabajadores calificados y no calificados por jornada, con la supervisión del maestro de obra, logista e ingeniero.

**e) Calidad del terreno:**


Estos fueron cedidos en calidad de préstamo por parte del INJUPEMP, por un periodo de 13 meses calendario.

**f) Características del Proyecto:**



Se construyeron galerías de 15 a 30 cubículos por ambos lados.

**g) Características Técnicas:**



La construcción de los módulos familiares es de 60 metros de largo por 8 mts de ancho máximo. Estas se dividen en dos alas de 15 unidades familiares de 4 x 4 mts cada uno con una capacidad máxima para una familia de 5 miembros.

El cubículo tiene una altura interior de 2.4 metros por los 4 de largo de la galería. Por la particularidad de temporalidad de los CHAT's los materiales utilizados han sido madera, lámina de zinc, panelit, clavos, malla ciclón, plástico y cemento.

## 2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y SANITARIA

CHAT	El Molino I	El Molino II	El Trébol I	El Trébol II	TOTALES
<b>INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL</b>					
Número módulos habitacionales	20	11	24	16	71
Número unidades familiares	471	199	449	306	1425
Número cocinas <sup>1</sup>	40	22	45	28	135
Área construida	7,936 mts <sup>2</sup>	3,299 mts <sup>2</sup>	7,264 mts <sup>2</sup>	5,430 mts <sup>2</sup>	23,926 mts <sup>2</sup>
<b>INFRAESTRUCTURA SANITARIA</b>					
N. Letrinas Hombres	40	22	100	1	162
N. Letrinas Mujeres	52	22	100	1	174
N. Baños Hombres	70	33	202	1	305
N. Baños Mujeres	80	44	202	1	326
N. Lavaderos	190	111	188	1	489

<sup>1</sup> Las cocinas fueron diseñadas para uso comunal; sin embargo, se utilizan como cubículos familiares en la actualidad.


<sup>2</sup> Proyecto a cargo del RHIS. No existe información disponible.

### 3. MANTENIMIENTO


#### a) Actividades de Mantenimiento

##### **MOLINO I Y II**

- ☞ Construcción de cunetas en ambos lados de las galeras.
- ☞ Reparación de puertas de baños y letrinas.
- ☞ Colocación de malla ciclón en los taludes.
- ☞ Construcción de un puente de 14 metros entre El Molino I y Molino II, para facilitar el acceso de los habitantes del albergue.
- ☞ Construcción de gradas reforzadas con madera, en las pendientes entre los dos Molinos para el tránsito de las personas.
- ☞ División de aulas en la escuela.
- ☞ Construcción de una caseta de vigilancia, frente a la galera de Bodega Central.
- ☞ Construcción de cunetas y taludes frente a la escuela y Bodega (Molino I).
- ☞ Instalación de malla ciclón en el talud, frente a la escuela.
- ☞ Elaboración de letrinas.
- ☞ Construcción de canales de drenaje en las galeras para facilitar el flujo de aguas pluviales y grises.
- ☞ Colocación de malla ciclón en las galeras.

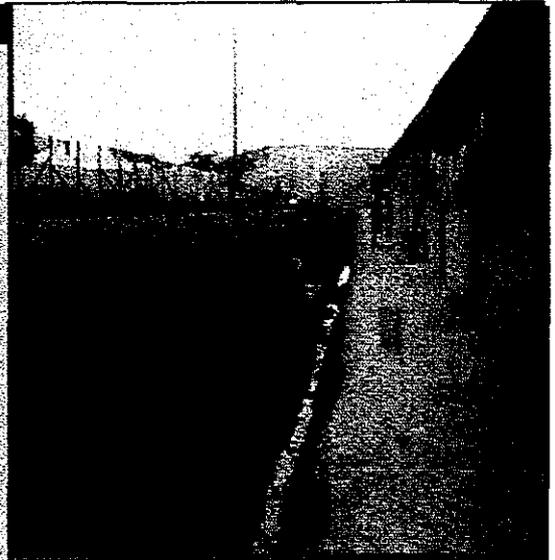

Taludes y drenajes



Puente entre Molino I y II

## TRÉBOL I Y II

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Reemplazo de láminas de zinc en mal estado.</li> <li>☞ Reforzamiento con alambre de amarre y reglas sobre el techo de todas las galeras, con el propósito de dar fortalecimiento a la cubierta y no ser dañado por cualquier viento.</li> <li>☞ Construcción de cunetas en ambos lados de las galeras, para facilitar el drenaje de las aguas lluvias, y así evitar la inundación de los cubículos.</li> <li>☞ Colocación de malla ciclón para consolidar los taludes en las galeras.</li> <li>☞ Reparación de tubería para agua potable en mal estado.</li> <li>☞ Reparación de puertas en baños y letrinas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Cercado de galeras con pendiente, con malla ciclón.</li> <li>☞ Canalización para drenaje de aguas lluvias, Se realizaron 1,256.00 ml de canalización con una sección variable según exigiera los requerimientos de pendiente y composición del suelo.</li> <li>☞ Separación del aula y la dirección del Kinder, también se conformo una capa de ladrillo con cemento en la acera para evitar el deslizamiento de las bases de la galera.</li> <li>☞ Reforzamiento del techado mediante reglas.</li> <li>☞ Reemplazo de plástico en mal estado en los cubículos.</li> <li>☞ Construcción de galera de 4 x 4 para la Vigilancia.</li> </ul> |
|---|--|



Galera Cercada de Malla Ciclón

### b) Plan de Mantenimiento

Actividades por Realizar
☞ Rehabilitación de letrinas.
☞ Instalación y reparación de tuberías para aguas grises.
☞ Fabricación e instalación de letrinas.
☞ Fabricación e instalación de puertas de baño.
☞ Canalización de aguas pluviales en el sector de las bodegas centrales
☞ Fundición y reparación de pisos.
☞ Reconstrucción de tendaderos.
☞ Reconstrucción de pilas.
☞ Reparación de tubería y sifones en 64 pilas.
☞ Limpieza de cajas de registro.
☞ Fumigación de albergues.
☞ Reparación de tanques de agua.
☞ Reparación de cercos.

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACIÓN<sup>3</sup>

#### **Molino I 491 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	275	253	156	443	72	1199
Hombres	242	248	132	305	27	954
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>501</b>	<b>288</b>	<b>748</b>	<b>99</b>	<b>2153</b>

#### **Molino II 183 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	96	89	46	185	34	450
Hombres	100	95	44	158	15	412
<b>TOTAL</b>	<b>196</b>	<b>184</b>	<b>90</b>	<b>343</b>	<b>49</b>	<b>862</b>

#### **Trébol I 455 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	244	233	117	410	62	1066
Hombres	219	246	120	229	27	841
<b>TOTAL</b>	<b>463</b>	<b>479</b>	<b>237</b>	<b>639</b>	<b>89</b>	<b>1907</b>

#### **Trébol II 275 FAMILIAS<sup>4</sup>.**

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Institución Administradora:** Cruz Roja

#### **Número de personal en la CHAT:**

Dos administradores, un coordinador del centro de apoyo (por CHAT), un coordinador de educación y un coordinador de salud.

<sup>3</sup> En El Molino I, El Molino II y Trébol I el número de familias es más alto que el espacio disponible según infraestructura habitacional debido a la política de la Cruz Roja de utilizar las cocinas y módulos sociales para albergar familias. Los datos estadísticos corresponden a un censo sobre 1118 familias realizado en los meses de Abril a Junio.

<sup>4</sup> Datos proporcionados por Cruz Roja.

### **Presencia y Estructura de OIM:**

En El Molino I y II una oficial de campo y en El Trébol I y II una oficial de campo. OIM apoya a la Cruz Roja en asuntos relacionados a la administración, organización comunitaria y la coordinación interinstitucional.

### **Presencia de otras instituciones:**

Asociación Navarra Nuevo Futuro:	Alimentación y salud.
Secretaría de Educación:	Programas de educación.
Damas de la Cruz Roja:	Capacitación vocacional.
INFOP:	Capacitación vocacional.
Secretaría de Salud:	Atención en salud.

### Sistema de las Naciones Unidas

PNUD:	Financiamiento para la construcción de El Molino I y II, y El Trébol I.
OPS/OMS:	Contribución a los servicios de salud en las CHAT`s e inició un proyecto de Centros de Educación Preescolar No Formal.
UNICEF:	Apoyo a la Secretaría de Educación a través del aporte de mobiliario, materiales didácticos y apoyo financiero para la provisión de maestros. Equipamiento de Hogares Infantiles y apoyo al Instituto Hondureño para la Niñez y la familia (IHNFA) con el mantenimiento de una oficina de atención.
UNESCO:	Desarrollo de una radiorevista, "Reconstruyendo Vidas, Sueños y Esperanzas", un programa de radio dirigido a las familias víctimas del Huracán Mitch.
PMA:	Distribución de alimentos y algunos artículos de primera necesidad en las CHAT`s.

## **3. SERVICIOS ESENCIALES**

### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada

Interna (OIM): Instalada

**b) AGUA**

Sistema de provisión de agua: Cisternas del SANAA diariamente.

**c) SALUD**

☞ **Institución a Cargo (Servicio en la CHAT):**

En El Molino I y II la función administrativa está a cargo de la Asociación Navarra Nuevo Futuro y la función operativa a cargo del Centro de Salud Colonia San Miguel.

En El Trébol I la Secretaría de Salud, el Centro de Salud Villa Adela y la Asociación Navarra Nuevo Futuro (Unión Europea) están a cargo de la salud en las CHAT`s.

CHAT	PERSONAL DISPONIBLE	HORARIO	PERSONAS ATENDIDAS
Molino I	1 médico 1 enfermera	7:00 a 12:00 M	145 (semana)
Molino II	1 médico	9:00 a 11:00 AM	70 (semana)
Trébol I	1 médico 1 enfermera	8:00 a 12:00 M	360 (semana)
	1 médico 1 enfermera	1:00 a 4:00 PM	

Los médicos brindan consulta general externa y brindan atención prenatal, revisión de dispositivos, citologías y atención en salud reproductiva.

La mayor parte de los pacientes atendidos en el Molino I y II son mujeres mayores de 17 años y niños menores de 5 años. En Trébol I la mayor parte de los pacientes son también mujeres, pero en un rango de edad diferente: entre 15 y 65 años, con un 41%, seguidos por niños entre 0 y 14 años, los que representan el 38% del total de pacientes atendidos.

☞ **Enfermedades por las que fueron atendidos**

- Problemas respiratorios
- Diarreas
- Infecciones en la piel

☞ **Centros de salud más próximos:**

En El Molino I y II: CESAMO, Colonia San Miguel.

En El Trébol I: Centro de Salud, Colonia Villa Adela.

☞ **Hospitales más cercanos:**

En El Molino I y II: Hospital San Felipe.

En El Trébol I : Hospital Escuela y Hospital Materno Infantil.

☞ **Cantidad de remisiones al servicio más cercano:**

En El Molino I y II: 11 y 2 casos semanales respectivamente.

En El Trébol I: 13 casos por semana.

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Respiratorios (Gripe, tos, bronquitis), Cuadros diarreicos e Infecciones en la piel.

☞ **Medicamentos suministrados:**

Antibióticos, antiparasitarios, vitaminas, minerales y sales de rehidratación, antitusivos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatorios, medicamentos dermatológicos.

**d) ALIMENTACIÓN**

☞ **Instituciones que suministran alimentos:**

En las cuatro CHAT´s la alimentación es brindada por:

- Cruz Roja
- PMA

☞ **Alimentación suministrada:**

Producto	Cantidad	Frecuencia
Arroz	25 libras	Mensual
Maíz	25 libras	Mensual
Frijoles	25 libras	Mensual
Aceite	32 onzas	Mensual
Harina	5 libras	Mensual

☞ **Alimentación suplementaria:**

Asociación Navarra con dos meriendas al día que incluye leche, galletas nutritivas, corn flakes, avena, arroz, entre otros; para niños entre 0 y 5 años.

**e) EDUCACIÓN**

☞ **Escuelas existentes en las CHAT` s:**

- En El Molino I: Escuela Urbana Mixta El Molino I, asisten 261 niños y niñas. Existen 4 maestros.
- En El Trébol I: Escuela Mixta El Trébol, asisten 185 niños y niñas. Existen 5 maestros.

☞ **Escuelas (otras) a las que asisten los niños:**

- En El Molino I y II : Escuela Oscar A. Flores de la Colonia Izaguirre, Escuela 18 de Julio de la colonia San Miguel.
- Asisten 211 niños y niñas en total a estas escuelas.
- En El Trébol I : Escuela República del Perú, Escuela Juan de la Cruz Avelar, Escuela Don Bosco, Escuela Tomás Dolmo, Escuela Juan G. López, Escuela Toribio Bustillo, Escuela Juan Guifarro, Escuela Juan Guifarro No. 2, Escuela Leovigildo Pineda y otras. Asisten 155 niños y niñas en total a estas escuelas.

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Aseo	Todos
Vigilancia	Todos

##### **☞ Capacitaciones recibidas:**

###### **Molino I**

<b>No.</b>	<b>Tema</b>	<b>Número de Participantes</b>	<b>Ejecutor</b>
1	Seminario Motivación para el Desarrollo	50	INFOP
2	Fibra Natural	40	INFOP (con apoyo de OIM)
3	Curso de Mochilas	36	INFOP (con apoyo de OIM)
4	Curso de belleza	20	DAMAS CRUZ ROJA
5	Relaciones Humanas	20	CRUZ ROJA
6	Violencia Intrafamiliar	20	MUJERES UNIVERSITARIAS

###### **Molino II**

<b>No.</b>	<b>Tema</b>	<b>Número de Participantes</b>	<b>Ejecutor</b>
1	Violencia Intrafamiliar	15-20	MUJERES UNIVERSITARIAS
2	Curso de Manualidades	25	DAMAS CRUZ ROJA
3	Alcoholismo	15-20	IHADFA

## Trébol I

No.	Tema	Ejecutor
1	Envasado de Alimentos	INFOP
2	Curso de Mochilas	OIM
3	Curso de Repostería (donas)	UPN
4	Curso de Junco	INFOP
5	Curso de Primeros Auxilios	CRUZ ROJA
6	Curso de Auto estima (Atención Psico-social)	UPN

## 5. REASENTAMIENTO PERMANENTE

Hasta la fecha, los proyectos apoyados o identificados para ser apoyados por OIM, a través del Programa de Salida financiado por USAID/OTI, son los siguientes:

No.	Nombre del Proyecto	Institución	No. Viviendas Total	No. Viviendas para Beneficiarios del Programa
1	San José Obrero	CARITAS	570	104
2	Residencial Hábitat	Hábitat	400	200
3	Aldea Santa Rosa	Cruz Roja	458	271
4	Villa España	Cruz Roja y Cooperación Española	1250	1250
5	Villa El Porvenir	ADRA	137	117
6	Nueva Esperanza	Nuestros Pequeños Hermanos	200	33
7	ALCAMPO	Instituto Hondureño de Educación por Radio	25	17
<b>TOTALES</b>			<b>3040</b>	<b>1994</b>

∞ **Metodología de construcción:** Mayoritariamente Auto – construcción.

## **6. REINSERCIÓN SOCIO-ECONÓMICA**

### **☞ Tipos de empleo:**


**Mujeres:** Enfermeras, secretarias, tortilleras, vendedoras, trabajos domésticos en casas particulares, empacadoras, cocineras, lavanderas, amas de casa.

**Hombres:** Electricistas, pintores, carpinteros, albañiles, motoristas, comerciantes, bodegueros, guardias de seguridad.

### **☞ Fuentes próximas de empleo identificadas:**

Fábricas aledañas, comercio en mercados y zona peatonal.

# ZONA NORTE

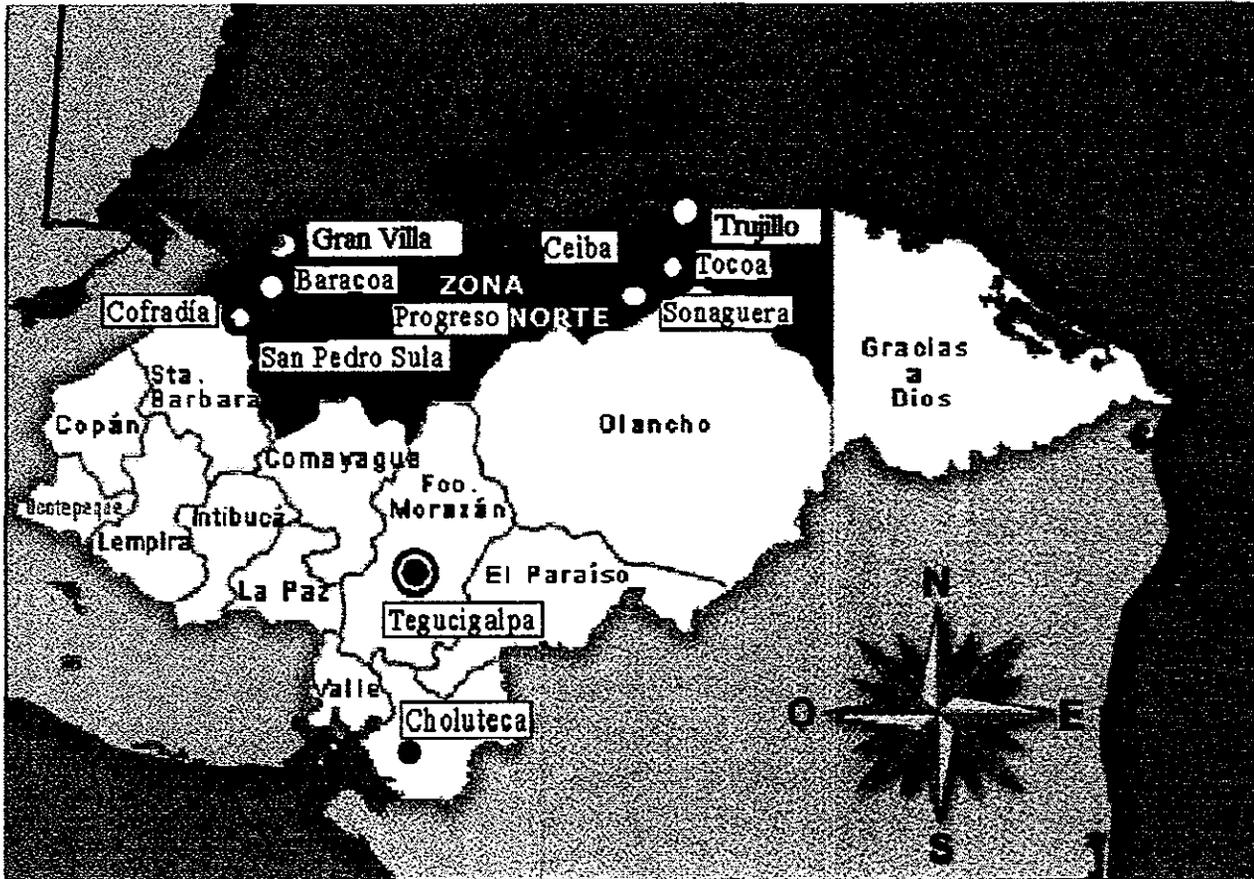

- OFICINA CENTRAL
- OFICINA DE CAMPO
- SUB-OFFICINA DE CAMPO

En la Zona Norte se han construido ocho (08) CHATs, que son Riberas del Caribe en La Ceiba, en el departamento de Atlántida; Nueva Masicales en Ilanga, Ceibita en Tocoa y 25 de Septiembre en Sonaguera, en el departamento de Colón; El Progreso en la ciudad del mismo nombre, en el departamento de Yoro; Baracoa y Gran Villa en Puerto Cortés y Comunidad Vida Nueva en Cofradía, en el departamento de Cortés.

## **I. RIBERAS DEL CARIBE, LA CEIBA, ATLANTIDA**

### **A. PRESENTACIÓN**

La CHAT en la Aldea El Bonitillo cerca de la Ciudad de La Ceiba y llamado "Riberas del Caribe", es un lugar de reubicación permanente para 166 familias provenientes de Las Colonias La Florida, Sierra Pina, El Chorizo, Las Rodas, Bordas del Rio Cangrejal y La Barra. Dado la asignación definitiva de los lotes en que se realizó la construcción, esta CHAT utilizó un modelo de construcción cuadri-modular. Inició el 26 de febrero de 1999, se completó el 1 de abril y la CHAT se inauguró el 7 de mayo de 1999. El área construida originalmente es 2,784 metros cuadrados e incluye 28 letrinas y 24 lavaderos; actualmente, OIM apoya a Médicos Sin Fronteras en la construcción de 20 letrinas adicionales. La construcción de esta CHAT fue financiada por USAID.

El programa de administración, implementado por OIM en coordinación estrecha con la Municipalidad, y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Ceiba, el componente de educación incluye la habilitación de una escuela dentro de la CHAT para atender a aquellos niños que no encontraron cupo en las escuelas regulares, la contratación de 3 maestros por OIM, y un estímulo para las madres educadoras que atienden a los niños de edad preescolar, así como el fortalecimiento de un jardín infantil cercano para ser utilizado como hogar de cuidado y CEPENFs. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para la escuela primaria y los CEPENFs.

Hasta la fecha, están registrados 66 niños y niñas en la escuela primaria de la CHAT y 42 infantes para los cursos preescolares. En el mes de noviembre, se desarrollará un componente de educación adulta por el Programa EDUCATODOS de la Secretaría de Educación.

En lo que respecta a Salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de un equipo médico de 2 personas, incluyendo una (1) enfermera y un (1) promotor, quienes brindan atención curativa y preventiva. Dentro de la CHAT, una voluntaria de salud recibe capacitación continua en la salud preventiva, curativa y la detección de epidemias. La CHAT cuenta con un puesto de salud (detección de malaria) y un botiquín de emergencia donada por la Cruz Roja Española.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido un Patronato y formado varias comisiones funciones, tales como: Comité de Salud, Vigilancia, Emergencia, Mantenimiento, Limpieza y Mujeres Organizadas.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

**USAID:** Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

**SETCO:** Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

**Alcaldía Municipal:** Instalación de vejigas de agua potable.

**FHIS:** Terracería del terreno y reparación de vías de acceso.

**Médicos Sin Fronteras:** Impulsador de un proyecto de letrinas.

**Cruz Roja Española:** Donación, instalación y mantenimiento de una planta potabilizadora y burbuja de agua.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**

Los terrenos fueron preparados por parte del FHIS y la Alcaldía: remoción de capa vegetal y compactación de los terrenos desnivelados, limpieza, así como las vías de acceso.

#### **d) Organización de OIM en el terreno:**

En esta región se designó un responsable de logística, bajo la conducción de un encargado de OIM, que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformó un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **e) Calidad del terreno:**

El terreno fue donado por la municipalidad y lotificación para que los damnificados puedan erigir sus casas definitivas.


**f) Características del Proyecto:**

En La Ceiba se aplicó el diseño de cuatrimódulos y una galera de 22 cubículos.

**g) Características Técnicas:**

El área por familia es de  $4 \times 4 \text{ mts}^2$ , su estructura de madera, techo de zinc, forrado de paredes con panelit, piso de cemento y una distancia entre cuatrimódulo de 10 mts.

**2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**



174 cubículos.

**3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

7 módulos de 4 letrinas cada uno.

**4. MANTENIMIENTO**

**a) Plan de Mantenimiento**

Tareas
Reubicación de letrinas (13.5mt <sup>3</sup> ) c/u.
Losa de concreto (0.07mm) para letrinas.
Paredes de bloques para letrinas.
Montaje de estructura (panelit y madera) en letrinas.
Mantenimiento preventivo de techos.
Revisión de letrinas.
Construcción de 20 letrinas faltantes en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Médicos Sin Fronteras.
Reparación de letrinas hundidas.
Compra de barriles para basura.

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>1</sup>

**166 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	83	78	42	164	18	385
Hombres	75	81	32	128	19	335
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>74</b>	<b>292</b>	<b>37</b>	<b>720</b>

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Instituciones Administradoras:** Alcaldía de La Ceiba y OIM.

#### **Número de personal en la CHAT:**

Un coordinador regional con sede en La Ceiba (OIM), dos oficiales de campo (un coordinador, una promotora); un promotor social de la municipalidad (presencia semi - regular).

#### **Presencia de otras instituciones:**

Secretaría de Salud: Atención en salud preventiva y curativa.

Médicos sin Fronteras: Infraestructura de saneamiento básico.

Iglesia Gran Comisión: Proyecto de viviendas (100 casas).

Iglesia Wesleyana: Proyecto de viviendas (78 casas).

### 3. SERVICIOS ESENCIALES

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada

Interna (OIM): Instalada

<sup>1</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 151 familias. Esta información está en proceso de actualización.

**b) AGUA**

Agua potable suministrada a través de una máquina potabilizadora, donada por la Cruz Roja Española, la cual abastece una burbuja con 15,000 litros, distribuido por 6 llaves públicas. Adicionalmente, existen tres pozos para agua no utilizada para consumo humano.

**c) SALUD**

☞ **Institución a Cargo (Servicio en la CHAT):**

Secretaría de Salud (Región Sanitaria No. 6).

ENTIDAD	PERSONAL DISPONIBLE	HORARIO	PERSONAS ATENDIDAS
Región Sanitaria	1 Enfermera	3 días en CHAT; 2 días en Centro de Salud aledaño.	30 ( promedio semanal)
Región Sanitaria	1 Promotor	Semi-regular	Capacitaciones Comunitarias

Las funciones principales de la enfermera son proveer atención médica, remitir casos que lo requieran a otros servicios médicos y capacitar los Comités de Salud de la CHAT.

Producto de las coordinaciones con las entidades especiales en salud, mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contrató la enfermera y el promotor mencionados arriba.

☞ **Centro de Salud más próximo:**

CESAMO, Colonia El Confite a 2.2 Km de la CHAT.

☞ **Hospital más cercano:**

Regional Atlántida a 8.9 Km de la CHAT.

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Diarrea (especialmente en niños), fiebre, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel.

☞ **Medicamentos suministrados:**

Acetaminofen, litrosol, amoxicilina (antibiótico) y aspirina.

#### **d) ALIMENTACIÓN**

☞ **Instituciones que suministran alimentos:**

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y CARE.

☞ **Alimentación suministrada:**

<b>PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>FRECUENCIA</b>
Harina (maíz)	25 libras	Quincenal
Frijoles	10 libras	Quincenal
Arroz	25 libras	Quincenal
Aceite	4 libras	Quincenal

#### **e) EDUCACIÓN**

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 3 maestros para primaria y se capacitó 1 voluntaria para preescolar.

☞ **Escuela existente en la CHAT:**

Iniciada una escuela en la CHAT con curriculum acelerada para atender a niños que no estudian actualmente. A la fecha asisten 66 niños.

☞ **Escuelas (otras) a las que asisten los niños:**

Escuela Lempira, escuela 14 de julio, escuela Ramón Montoya, escuela Cristóbal Colón, escuela Arturo Santos Delgado, escuela Claudio Barrera y escuela Manuel F. Barahona; Jardín de Niños María Luisa Viuda de Amador (hogar infantil).



Entrega de útiles educativos y recreativos a niños (donados por UNICEF)

- ☞ **Número de niños y niñas que estudian:** 149
- ☞ **Número de niños que asisten al Jardín de Niños:** 42
- ☞ **Número de maestros:** Bonitillo 3, Jardín de Niños 2.

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### ☞ **Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Salud	8
Vigilancia	3
Emergencia	5
Mantenimiento	3
Limpieza	5
Mujer	3
Patronato	12

##### ☞ **Capacitaciones recibidas:**

Como parte del proceso de formación de las comisiones OIM brindó Talleres de Liderazgo y Organización Comunitaria. Además se han brindado 4 capacitaciones a los integrantes de los comités:

Comité de Salud: Capacitación en Salud Preventiva.

Comité de Emergencia: Capacitación en Inundaciones y Derrumbes.

Comité de Limpieza: Capacitación del Cuidado y Mantenimiento a las áreas de limpieza.

Patronato: Capacitación en normas y reglas de organización.

## **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**



### **☞ Estado de avance en proyectos de vivienda:**

ENTIDAD	NÚMERO APROBADO	ESTADO DE AVANCE	
		Finalizadas	En Construcción
Iglesia Gran Comisión (Bolsa Samaritana)	100	100	0
Iglesia Wesleyana	78	78	0
<b>TOTAL<sup>2</sup></b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0</b>

### **☞ Tipos de Vivienda:**

**Iglesia Gran Comisión:** con una dimensión de 6x5.5 mts<sup>2</sup>, utilizando bloque, cemento, zinc, piso de cemento.

**Iglesia Wesleyana:** con una dimensión de 4.8x3.6 mts<sup>2</sup>, utilizando madera, bloque, cemento, zinc, piso de cemento.

**☞ Metodología de Construcción:** Auto - construcción.

<sup>2</sup> 12 de las viviendas construidas pertenecen a beneficiarios que no residieron en la CHAT.

☞ **Predio, ubicación y aspecto legales:**

El terreno, ubicado en el lado oeste de la ciudad, tiene un tamaño de 8x16 Mts. La Municipalidad tiene dominio pleno sobre el terreno y cederá derechos de propiedad a los beneficiarios en cuanto se finalice la etapa constructiva.

**6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

☞ **Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

JEFES DE FAMILIA			
EMPLEADO		DESEMPLEADO	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
91	34	15	11

☞ **Tipos de empleo:**

Vigilantes, carpinteros, albañiles, zapateros, pescadores, fontaneros, electricistas, jornaleros, agricultores, vendedores, aseadoras, dependientas, choferes, lavanderas, cocineras.

## **II. NUEVA MASICALES, TRUJILLO, COLON**

### **A. PRESENTACIÓN**

En el municipio de Trujillo, el Censo Nacional de Albergues relevó la permanencia de 92 familias en albergues temporales en el mes de enero, siendo este municipio uno de los más afectados en el Departamento de Colón por el desborde del Río Aguán y la consecuente inundación masiva de lugares bajos, como es la Aldea de Vieja Masicales, el lugar de origen de las familias damnificadas que residen en la CHAT Nueva Masicales.

La construcción de la CHAT en mención, a lado de la carretera que conduce desde Sonaguera a Tocoa, inició el 30 de abril 1999 y finalizó el 10 de junio 1999, construyéndose un total de 154 unidades familiares (distribuidas en galeras), 6 módulos sociales, 35 letrinas y 10 lavaderos, lo cual implica una área de construcción de 2,592 metros cuadrados. La construcción de esta CHAT fue financiada por USAID.

En términos de servicios esenciales, la CHAT cuenta con agua potable a través de varios sistemas complementarios, incluyendo una conexión con la red local y un pozo con bomba manual; la CHAT aún no cuenta con la instalación externa de energía eléctrica.

El programa implementado por OIM ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Nueva Masicales, el componente de educación incluye la construcción de una escuela por OIM, la habilitación de 1 CEPENF y un estímulo para la madres educadora que atiende a los niños, la habilitación y equipamiento de un Hogar de Cuidado Infantil. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 132 niños y niñas en la escuela primaria y 70 infantes para los centros preescolares.

En lo que respecta a salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular un (1) promotor y una (1) enfermera quienes brindan atención curativa y preventiva.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido un coordinador por fila (cada 15 familias) y se han formado comisiones específicas para tratar asuntos relacionados a la alimentación y salud.

### **Perspectivas Futuras**

La Iglesia Bautista prestó los terrenos en que están construidas las galeras de la CHAT y se han asignado lotes definitivos a todas las familias que residen en esta CHAT en terrenos aledaños a la misma. Dicha organización se ha comprometido a la construcción de 114 viviendas, de las cuales se han construido 24 viviendas y 4 están en construcción. También la Iglesia Cuadrangular está construyendo 36 viviendas en un lote cercano, de las cuales 1 está terminada y 14 están en construcción.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **a) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

FHIS: Confección de letrinas, baños y lavaderos.

Iglesia Católica - CRS: Proyecto de agua potable.

#### **b) Trabajos Preparatorios:**

Fue necesario realizar trabajos previos a la ejecución de la obra, estos comprendían: remoción de capa vegetal y compactación de los terrenos desnivelados, limpieza, así como las vías de acceso.

#### **c) Organización de OIM en el terreno:**

En la ciudad de Trujillo se designó un responsable logístico bajo la conducción de un encargado regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformó un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **d) Calidad del terreno:**

Los terrenos son propiedad de la Iglesia Bautista y de la Iglesia Cuadrangular.

#### **e) Características del Proyecto:**

Las características de la construcción están basadas en el diseño de galeras de 32 cubículos.

**f) Características Técnicas:**

El área por familia es de 16mts<sup>2</sup> , techado de zinc, estructura de madera, forrado de paredes con panelit y piso de cemento.

**2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**

154 cubículos y 16 módulos sociales

**3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

5 módulos de 7 letrinas.

**4. MANTENIMIENTO**

**a) Plan de Mantenimiento**

Tareas
<b>Excavación de 2 fosos (7x1x2 mts).</b>
<b>Losa de concreto parara la sustentación de letrinas y paredes de bloque (2 módulos).</b>
<b>Montaje de estructura de panelit y madera (2 módulos).</b>
<b>Culminación de pozos.</b>
<b>Mantenimiento preventivo de techos.</b>
<b>Proveer bombas manuales.</b>
<b>Reparación de letrinas.</b>

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>3</sup>

**135 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	43	66	26	80	18	233
Hombres	55	90	28	96	15	284
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>156</b>	<b>54</b>	<b>176</b>	<b>33</b>	<b>517</b>

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Institución Administradora:** Alcaldía de Trujillo y OIM.

**Número de personal en la CHAT:**

2 Oficiales de Campo (Una coordinadora, Un promotor).

**Presencia de otras instituciones:**

Secretaría de Salud:	Capacitación y sensibilización.
Médicos del Mundo:	Brigadas médicas y capacitación.
Comité de Desarrollo Local (CODEL):	Apoyo en la Organización Comunitaria.
Catholic Relief Services (CRS):	Alimentación.
Iglesia Bautista:	Vivienda y alimentación.
Iglesia Cuadrangular:	Vivienda.
COPECO:	Policía Preventiva.

### 3. SERVICIOS ESENCIALES


#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE):	No instalada
Interna (OIM):	Instalada

<sup>3</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 135 familias. Esta información está en proceso de actualización.

## b) AGUA

Agua potable suministrada a través de llaves públicas con conexión a la red local; sin embargo, el servicio es infrecuente. Existen 3 pozos de agua construidos para usos domésticos, actualmente un (1) pozo adicional está en construcción.

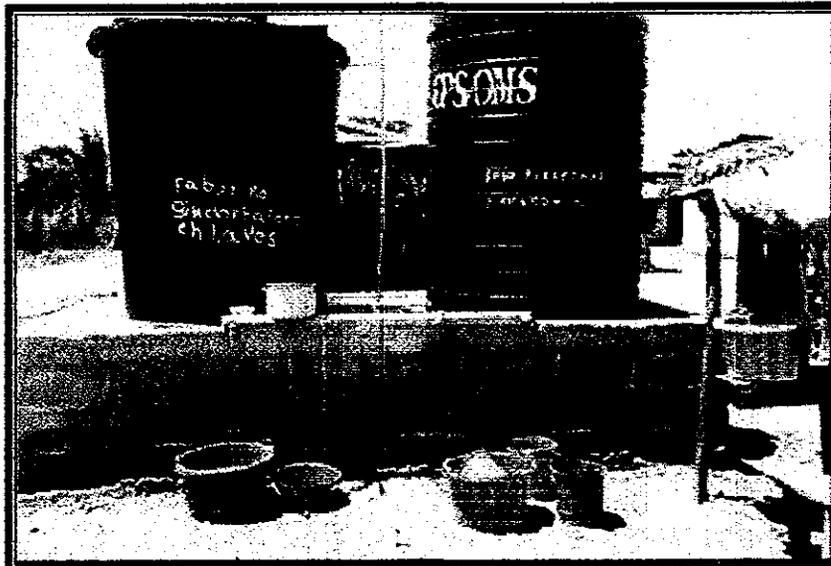

## c) SALUD

### ☞ **Institución a Cargo (Servicio en la CHAT):**

Secretaría de Salud (Área de Salud, Trujillo); Producto de las coordinaciones con las entidades especializadas en salud mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contratado un promotor de salud y una enfermera.

Actualmente existe un puesto en la CHAT para la detección de casos de malaria, atendido por una voluntaria, capacitada por la Secretaría de Salud.

### ☞ **Centro de Salud más próximo:**

CESAMO en Ilanga a 8 Km de la CHAT, personas atendidas 126.

### ☞ **Hospital más cercano:** Hospital Público en Tocoa.

### ☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Malaria, diarrea (especialmente en niños), infecciones respiratorias y enfermedades de la piel.

#### **d) ALIMENTACIÓN**

##### **☞ ~~Instituciones que suministran alimentos:~~**

Iglesia Bautista y Catholic Relief Services (CRS), a través de un programa de alimentos por trabajo (por construcción de las viviendas y obras comunales).

Médicos del Mundo también colabora brindando Alimentos por Trabajo (por obras comunales).



#### **e) EDUCACIÓN**

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrato 1 maestro para primaria y 3 voluntarias para preescolar.

☞ **Escuela existente en la CHAT:** Construida por OIM (galera) y la Iglesia Bautista.

☞ **Escuelas (otras) a las que asisten los niños:**

Escuela Rural Mixta  
"Presentación Centeno".



☞ **Número de niños y niñas que estudian en la CHAT: 122.**

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

☞ **Comités Comunitarios:** Alimentación y Salud.

☞ **Capacitaciones recibidas:**

Como parte del proceso de formación de las comisiones OIM brindo Talleres de Liderazgo y Organización Comunitaria. Además el comité de salud ha recibido capacitaciones por parte de Médicos del Mundo.

#### **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

☞ **Estado de avance en los proyectos de vivienda:**

La Iglesia Bautista ha asumido el compromiso de construir 114 viviendas para las familias de la CHAT. Hasta la fecha, se han finalizado veinticuatro (24) viviendas y otras cuatro (4) están en construcción.

La Iglesia Cuadrangular construye 36 viviendas.

☞ **Metodología de Construcción:** Auto - construcción

☞ **Predio, ubicación y aspecto legales:**

La Iglesia Bautista realizó la compra de dos predios, ubicados al lado de la CHAT para la construcción de la nueva comunidad; esta institución cederá derecho de propiedad al finalizar cinco años después de concluir la etapa constructiva.

#### **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

☞ **Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

<b>JEFES DE FAMILIA</b>			
<b>EMPLEADO</b>		<b>DESEMPLEADO</b>	
<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>79</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>27</b>

### **III. CEIBITA, TOCOA, COLON**

#### **A. PRESENTACIÓN**

La Comunidad Habitacional de Transición (CHAT), conocida como "Ceibita" por su ubicación en la aldea con el mismo nombre, fue construida en un terreno de 30 manzanas, a cuatro kilómetros de la Ciudad de Tocoa. La CHAT está ubicada en una parte elevada que se ha adecuado en terrazas, a través de la movilización de tierra.

De las 200 familias que residen en este terreno, 69 se han trasladado ya a las viviendas permanentes. La CHAT mantendrá disponibles los cubículos desocupados durante esta temporada para poder proveer refugio temporal a familias que pueden ser evacuadas en una eventual emergencia.

La construcción de la CHAT La Ceibita inició el 20 de marzo de 1999 y concluyó en dos meses, inaugurándose el 22 de mayo. El área construida cubre 2,912 metros cuadrados e incluye 177 unidades familiares y 5 unidades sociales (distribuidos en galeras) y 56 letrinas. La CHAT cuenta con agua potable por conexión a la red local y agua para usos domésticos se consigue de una quebrada cercana. La conexión de energía eléctrica por la ENEE aún está pendiente. La construcción de esta CHAT fue financiada por USAID.

El programa de administración, implementado por OIM en coordinación con la Iglesia Católica y la Municipalidad, y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar los servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios.

En Tocoa, el componente de educación incluye el fortalecimiento de la escuela cercana dotando de mobiliario de UNICEF y la contratación de 2 maestros financiados por OIM, la habilitación de 5 CEPENFs y un estímulo para las 5 jóvenes educadoras que atienden a los niños, así como la habilitación y equipamiento de un Hogar de Cuidado Infantil. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la formación técnica y habilitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó de mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 50 niños y

niñas en la escuela primaria y 161 infantes para los centros preescolares. En el mes de noviembre, se desarrollará un componente de educación para adultos por el Programa ABC de la Secretaría de Salud.

En lo que respecta a salud, se consideró que la atención brindada a través del Centro de Salud construido por Médicos del Mundo (con apoyo de la Municipalidad) es adecuada; sin embargo, se ha promovido mayor involucramiento de los promotores de la Secretaría de Salud para fortalecer el componente preventivo a través del mejoramiento en condiciones y prácticas relacionadas al saneamiento y la higiene.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido un coordinador por fila (cada 13 familias) y se han formado comisiones específicas para tratar asuntos relacionados con la salud, disciplina, recreación, alimentación, vigilancia y coordinación general del albergue.

### **Perspectivas Futuras**

El terreno en que se han construido las galeras ha sido asignado por la Alcaldía para la construcción de viviendas permanentes para los damnificados residentes de la CHAT; los compromisos de construcción por las organizaciones la Bolsa Samaritana, la Iglesia Metodista e ICADE suman a 260 viviendas, de las cuales 81 están finalizadas.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

Iglesia Católica: Equipo de construcción para abrir fosos y material de construcción.

Alcaldía Municipal: Donación de materiales de construcción y el terreno del proyecto.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**

El suelo fue preparado por parte del FHIS y la Alcaldía, realizando la tarea de remoción de capa vegetal, compactación de suelo, limpieza y la apertura de vías de acceso.

#### **d) Organización de OIM en el terreno:**

En Tocoa, se designo un responsable de la logística, todos bajo la conducción de un responsable regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformo un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **e) Calidad del terreno:**

El terreno es posesión de la municipalidad y se encuentran en proceso de asignación legal a los damnificados.

#### **f) Características del Proyecto:**

Su construcción esta basada en el diseño de galeras de 26 cubículos cada una.

**g) Características Técnicas:**

El área por familia es de 4x4 mts<sup>2</sup> , su estructura de madera, techo de zinc, forrado de paredes con panelit, piso de cemento y una distancia entre galeras de 4 metros por limitación de terreno

**2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**

177 cubículos y 5 unidades sociales

**3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

7 módulos de 8 letrinas cada uno.

**4. TRANSPORTE**

**a) Plan de Mantenimiento**

Tareas
Fundición de losa en letrinas (7) y colocación de bloques.
Reparación de pisos.
Mantenimiento preventivo de techos.
Reparación de letrinas.

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>4</sup>

**200 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
<b>Mujeres</b>	65	86	40	121	18	<b>330</b>
<b>Hombres</b>	59	87	34	109	18	<b>307</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>173</b>	<b>74</b>	<b>230</b>	<b>36</b>	<b>637</b>

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Institución Administradora:** Alcaldía de Tocoa y OIM.

**Número de personal en la CHAT:** Un Oficial de Campo.

#### **Presencia de otras instituciones:**

Iglesia Católica: Alimentación y vivienda.

Iglesia Metodista: Vivienda.

La Gran Comisión: Vivienda.

Bolsa Samaritana: Vivienda.

ICADE: Vivienda.

Municipalidad: Administración y organización comunitaria.

Secretaría Salud Pública: Salud y capacitación.

CRS: Alimentación y apoyo en la organización comunitaria.

### 3. SERVICIOS ESENCIALES

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): No instalada.

Interna (OIM): Instalada.

<sup>4</sup> La información de este cuadro proviene del último censo de 137 familias, el cual se realizó en el momento en que el primer grupo de familias se trasladaron a sus viviendas permanentes.

## b) AGUA

Por conexión a la red local, a través de cuatro llaves para todo el campamento.  
Para agua no potable, se consigue de una quebrada.

## c) SALUD

☞ **Institución a Cargo (Servicio en la CHAT):** Secretaría de Salud Pública.

ENTIDAD	PERSONAL DISPONIBLE	PERSONAS ATENDIDAS	
		Femenino	Masculino
Secretaría Salud Pública	1 enfermera, 1 medicador de malaria.	21 (promedio mensual)	103(promedio mensual)

La enfermera se dedica a la atención curativa.

Las funciones principales del medicador de malaria son curación preventiva, principalmente la detección y prevención, incluyendo capacitación en higiene y vacunación.

### ☞ **Centro de Salud más próximo:**

Construido por Médicos del Mundo con el apoyo de la Municipalidad, en el mismo predio de la CHAT.

☞ **Hospital más cercano:** Hospital de Tocoa (4 Km).

### ☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Diarrea, varicela, malaria, iras, parasitismo intestinal, anemias, erupciones en la piel, niños con desnutrición.

### ☞ **Medicamentos suministrados:**

Sulmeprin, Amoxicilina, escabiría, eritromicina, alergil, metronidazol, mebendazol, anasor, nistatina, sulfato ferroso, multivitaminas, oximil.

#### d) ALIMENTACIÓN

☞ **Institución que suministra alimentos:** CRS

☞ **Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	FRECUENCIA
Arroz	Mensual
Frijoles	Mensual
Maíz	Mensual
Aceite	Mensual

#### e) EDUCACIÓN

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 2 maestros para primaria y 5 voluntarias para preescolar.

☞ **Número de niños y niñas que estudian:** **193**

En curso regular: **143**

Grado	Niños
Primero	60
Segundo	22
Tercero	17
Cuarto	26
Quinto	13
Sexto	5
<b>Total</b>	<b>143</b>

En primaria acelerada: **50**

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Salud	4
Disciplina	4
Recreación	4
Alimentos	4
Vigilancia	4
Coordinación de Galera	8
Comité general	9
<b>Total</b>	<b>37</b>

##### **Capacitaciones recibidas:**

<b>No.</b>	<b>Tema</b>	<b>Número de Participantes</b>
1	Como acompañar a una persona en momentos de crisis	80
2	Motivación	70
3	Planificación Familiar	68
4	Violencia Doméstica	30
5	Acoso Sexual	40
6	Higiene y Salud	150
7	Clorificación de Agua	8
8	Abate para pilas, cercos, etc.	20
9	Liderazgo y Organización Comunitaria	50% de la población

## **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**



### ☞ Estado de avance en los proyectos de vivienda:

Entidad	NÚMERO APROBADAS	ESTADO DE AVANCE	
		Finalizadas	En Construcción
Bolsa Samaritana	110	55	53
Iglesia Metodista	80	26	32
ICADE	70	0	70
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>81</b>	<b>155</b>

### ☞ Tipos de Vivienda:

**Bolsa Samaritana:** con un tamaño de 30 mts<sup>2</sup>, casa con puertas y ventanas de pino, aluzinc, piso de cemento.

**Iglesia Metodista:** con un tamaño de 42.7 mts<sup>2</sup>, utilizando bloque, varilla, cemento, zinc, puertas de pino, artesón de madera de pino, piso de cemento.

**ICADE:** utilizando cemento, bloque, varilla, zinc, piso de cemento.

### ☞ Metodología de Construcción:

Auto - construcción, Alimentos por Trabajo (APT).

☞ **Predio, ubicación y aspecto legales:**

El tamaño del predio es de 250 mts<sup>2</sup>, la ubicación se asignó de acuerdo a un sorteo al azar, las personas poseen un certificado donde se establece las condiciones de entrega de las casas.

**6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

☞ **Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

JEFES DE FAMILIA			
EMPLEADO		DESEMPLEADO	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
94	32	6	5

☞ **Tipos de empleo:**

Jornaleros, Corte de palma, Albañilería, Vigilancia, Trabajo Doméstico.

## **IV. 25 DE SEPTIEMBRE, SONAGUERA, COLON**

### **A. PRESENTACIÓN**



La CHAT "25 de Septiembre" en Sonaguera, cuyos residentes provienen de los campos bananeros aledaños, se caracteriza por la construcción de módulos unifamiliares que miden 5 x 4 metros. La etapa constructiva de las 317 unidades, que inició el 10 de abril y finalizó el 20 de junio de 1999, cubre un área construida de 5,027 metros cuadrados e incluye 317 letrinas y 10 lavaderos. La construcción de esta CHAT fue financiada por USAID.

La CHAT cuenta con agua potable a través de la conexión a la red local de Sonaguera; sin embargo, problemas de abastecimiento que afectan a la Ciudad de Sonaguera, ha sido complementada con la construcción de dos pozos. La instalación de energía eléctrica por ENEE aún está pendiente.

El programa de administración, implementado por OIM en coordinación con la Municipalidad, y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Sonaguera, el componente de educación incluye el fortalecimiento de la escuela en la CHAT con mobiliario de UNICEF y la contratación de 1 maestro por OIM, la

habilitación de 4 CEPENFs y un estímulo para las madres educadoras que atienden a los infantes, así como la habilitación y equipamiento de un Hogar de Cuidado Infantil. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 171 niños y niñas en la escuela primaria y 48 infantes para los centros preescolares. En el mes de noviembre, se desarrollará un componente de educación adulta por el Programa ABC de la Secretaría de Salud.

En lo que respecta a salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de un equipo médico de 4 personas, incluyendo un (1) médico, una (1) enfermera, un (1) odontólogo y un (1) promotor, quienes brindan atención curativa y preventiva.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido un coordinador por colonia (7) y se han formado comisiones específicas para la salud, educación, trabajo, vigilancia, recreación y la alimentación.

### **Perspectivas Futuras**

Las familias que residen en la Colonia "25 de Septiembre" recibirán dominio pleno sobre los lotes en donde se les ha construido el módulo unifamiliar; la ubicación de cada módulo dentro del lote se diseñó en consideración a la futura construcción de una vivienda, lo cual permite que el beneficiario resida en la estructura temporal mientras se implementa la solución permanente. Sin embargo, hasta la fecha no se ha identificado una organización para realizar el proyecto de vivienda.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.


#### **b) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

Alcaldía Municipal: Con trazados de calles, nivelación del terreno y materiales de construcción;

FHIS: Confección de letrinas, baños y lavaderos.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**



El FHIS y la alcaldía se encargaron de la remoción de capa vegetal y compactación de los terrenos desnivelados, limpieza, así como las vías de acceso.

#### **d) Organización de OIM en el terreno:**

En Sonaguera, se designo un responsable de la logística, todos bajo la conducción de un regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformo un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

**e) Calidad del terreno:**

El terreno es un haber de la municipalidad, el que esta en proceso de asignación legal donde los damnificados van a erigir sus casas definitivas.

**f) Características del Proyecto:**

Su construcción permitió la ejecución de un diseño unimodular.

**f) Características Técnicas:**

El módulo tiene una dimensión de 5x4 mts y una distancia de 8 mts entre unimódulo.

**2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**



317 cubículos, de los cuales 10 han sido prestado por sus dueños para usos sociales.

**3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

317 letrinas individuales para cada módulo.

**4. MANTENIMIENTO**

**a) Plan de Mantenimiento**

<b>Tareas</b>
<b>Excavación de 317 fosos(1x1x1.50 mts).</b>
<b>Losas de concreto(0.07m) para letrinas y paredes de bloque.</b>
<b>Montaje y desmontaje de estructura de letrinas.</b>
<b>Culminación de pozos.</b>
<b>Forrado de letrinas con panelit (4x8x11).</b>
<b>Drenaje de cunetas con motoniveladora (1500mt).</b>
<b>Mantenimiento preventivo de techos.</b>
<b>Revisión de letrinas e identificación de casos críticos.</b>
<b>Reforzar pisos de letrinas.</b>
<b>Tubería para ampliar la red de agua potable.</b>
<b>Instalación de tubería para agua potable (ampliar).</b>

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>5</sup>                      **315 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-15	13-17	18-50	>50	TOTAL
<b>Mujeres</b>	137	166	83	266	28	<b>680</b>
<b>Hombres</b>	143	190	81	257	28	<b>699</b>
<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>356</b>	<b>164</b>	<b>523</b>	<b>56</b>	<b>1379</b>

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Institución Administradora:**      Alcaldía de Sonaguera y OIM.

#### **Número de personal en la CHAT:**

OIM    2 Oficiales de Campo (Un coordinador, Un promotor)

#### **Presencia de otras instituciones:**

Alcaldía Municipal:                      Apoyo en la organización comunitaria, gestión.  
para proyectos de infraestructura comunitaria.

Catholic Relief Services (CRS):      Alimentación.

Secretaría de Salud:                      Salud preventiva y curativa.

Secretaría de Educación:              Programas educativos (primaria y preescolar).

CODEL:                                      Alimentación.

### 3. SERVICIOS ESENCIALES

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): No instalada.

Interna (OIM): Instalada.

<sup>5</sup> Datos actualizados al 1 de noviembre.

## **b) AGUA**

Con el apoyo de OPS y UNICEF, se ha realizado la conexión con la red local, distribuido por seis (06) llaves públicas. Sin embargo, la cantidad es insuficiente por lo que se están construyendo dos pozos (OIM – Secretaría de Salud – Municipalidad). Además COSUDE está construyendo un pozo para instalar un tanque con bomba eléctrica.

## **c) SALUD**

### **☞ Institución a Cargo (Servicio en la CHAT)**

Secretaría de Salud (Centro de Salud, Sonaguera); Producto de las coordinaciones con las entidades especiales en salud mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contratado un promotor, una enfermera, un odontólogo y un médico.

Existe también un puesto en la CHAT para la detección de casos de malaria, el cual cuenta con una persona voluntaria, capacitada por Salud Pública.

☞ **Centro de Salud más próximo:** CESAMO, Sonaguera a 3 Km

☞ **Hospital más cercano:** Hospital Tocoa.

### **☞ Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Infecciones respiratorias, diarrea (especialmente en niños), y enfermedades de la piel.

## **d) ALIMENTACIÓN**

### **☞ Institución que suministra alimentos:**

CODEL a través de un Programa de alimentos por trabajo.

### **☞ Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	CANTIDAD	FRECUENCIA
Arroz	20 libras	Mensual
Maíz	30 libras	Mensual
Aceite	2.5 litros	Mensual



## e) EDUCACIÓN

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 1 maestro para primaria y 4 voluntarias para preescolar.

### ☞ Escuela existente en la CHAT:

Escuela temporal funcionando en carpa. Actualmente se construye la escuela donada por la Standard Fruit Company, la cual estará terminada en Noviembre.



### ☞ Escuela (otra) a la que asisten los niños:

Escuela Claudio Mejía, 30 niños (aprox).

### ☞ Número de niños y niñas que estudian: 223

Escuela de la CHAT: 173

Primaria acelerada: 20

Escuela fuera de la CHAT: 30



#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Salud	7
Educación	7
Trabajo	7
Vigilancia	7
Infraestructura	7
Alimentos	7
Recreación	7
<b>Total</b>	<b>49</b>

Adicionalmente existe un patronato formado por los representantes de los comités antes descritos.

##### **☞ Capacitación:**

Como parte del proceso de formación de las comisiones OIM brindó Talleres de Liderazgo y Organización Comunitaria.

#### **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

##### **☞ Estado de avance en los proyectos de vivienda:**

No existe ningún proyecto de vivienda definitiva subsidiada en esta comunidad; PRIHMUR ha ofertado su sistema de financiamiento, pero pocos beneficiarios califican por los requerimientos financieros.

## **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

### **☞ Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

<b>JEFES DE FAMILIA</b>			
<b>EMPLEADO</b>		<b>DESEMPLEADO</b>	
<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>123</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>79</b>

## **V. EL PROGRESO, YORO**

### **A. PRESENTACIÓN**

El Municipio del Progreso es uno de los más vulnerables ante las lluvias por el alto porcentaje de terrenos en áreas bajas al borde del Río Ulua; esta vulnerabilidad se manifiesta en un alto número de damnificados del Huracán Mitch (474 familias en albergues durante el mes de enero 1999) y en la evacuación de miles de personas nuevamente durante la temporada de lluvias en este año. La CHAT El Progreso está ubicada dentro de la misma ciudad; se empezó a ocupar en abril y se inauguró oficialmente el 19 de mayo de 1999. Las 289 familias que residen en la CHAT provienen de los barrios urbanos del Progreso, destruidos por inundación durante el Huracán Mitch, como son Bo. Suyapa, Pénjamo, Col. Juan Ramón Morales, Finca 8, Río Chiquito, Col. Bendeck, Policarpo Paz, Guaymita, Fátima y Quebrada Seca.

La construcción de la CHAT en El Progreso fue financiada por USAID, el cual se hizo en terrenos prestados por la Alcaldía, inició el 22 de enero y concluyó el 10 de mayo de 1999. El área construida cubre 7,648 mts<sup>2</sup> e incluye 406 unidades habitacionales y 60 unidades sociales, 180 letrinas, 144 baños y 20 lavaderos. La CHAT cuenta con energía eléctrica y agua potable por conexión a la red local.

La administración de este Macro Albergue es una función compartida con varias organizaciones, incluyendo la Municipalidad que mantiene una presencia permanente en la CHAT, el Comité de Reconstrucción de la Iglesia Católica, OIM y miembros de la Junta Directiva de la organización de beneficiarios, llamado "Damnificados Sin Techo."

El programa implementado por OIM en coordinación estrecha con las entidades antes mencionadas y financiado por USAID ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

El componente de educación en El Progreso incluye la habilitación de una escuela primaria por OIM y el financiamiento de 4 maestros; la habilitación de 5 CEPENFs y un estímulo para las madres educadoras que atienden a los niños. El personal

educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 88 niños y niñas en la escuela primaria y 95 infantes para los centros preescolares.

En lo que respecta a salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de 2 personas del equipo médico, incluyendo una (1) enfermera profesional y un (1) médico, quienes brindan atención curativa y preventiva. Adicionalmente, se han capacitado a dos voluntarios de la comunidad a quienes se les paga un estímulo económico por su trabajo dentro del Puesto de Salud en la CHAT.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido un coordinador por fila (cada 15 familias) y se han formado comisiones específicas para tratar asuntos relacionados a la salud, niñez y disciplina.

### **Perspectivas Futuras**

Como resultado de la gestión realizada por la comunidad, con la asesoría y acompañamiento del Comité de Reconstrucción de la Iglesia Católica, se aprobó el financiamiento para 480 viviendas (259 asignadas a familias del Macro Albergue) en la Aldea de Pajuiles por parte de la Cruz Roja Española y CARITAS. El proyecto es ejecutado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Vivienda mediante un sistema de auto-construcción.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora

Alcaldía Municipal: donante de algunos materiales de construcción y el terreno del proyecto.

FHIS: Terracería del terreno.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**

Las obras de preparación de terrenos fueron llevadas a cabo por parte de FHIS y la Alcaldía, tales fueron Limpieza, remoción de capa vegetal, nivelación de terrenos y terracerías. Así como la urbanización.

#### **d) Organización de OIM en el terreno:**

En El Progreso, se designo un responsable de la logística, todos bajo la conducción de un responsable regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformo un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **e) Calidad del terreno:**

El proyecto se encuentra en terrenos privados que a petición de la Alcaldía fueron cedidos temporalmente a los damnificados.

#### **e) Características del Proyecto:**

Se implemento el diseño de galeras de 30 cubículos.

**f) Características Técnicas:**

El área por familia es de 4x4mts<sup>2</sup> , techado de zinc, estructura de madera, forrado de paredes con panelit y piso de cemento.

**2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**



Se cuenta con 466 cubículos, incluyendo 406 unidades familiares y 60 unidades sociales.

**3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**



Se construyeron 180 letrinas aboneras en 18 módulos.

**4. MANTENIMIENTO**

**a) Plan de mantenimiento**

Tareas
Reparación del piso (50) cubículos.
Forro Zinc 23 baños.
Reforzamiento de Escaleras de Letrinas (5).
Cálculo de barriles y bolsas para basura.
Entrega de barriles para basura.

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>6</sup>:

**293 FAMILIAS**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	112	164	84	248	57	665
Hombres	111	199	105	191	38	644
<b>TOTAL</b>	<b>223</b>	<b>363</b>	<b>189</b>	<b>439</b>	<b>95</b>	<b>1309</b>

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

#### **Instituciones Administradoras:**

La CHAT es administrada a través de un Comité de Administración y Bienestar Social, integrada por El Comité de Reconstrucción (Iglesia Católica), la Municipalidad del Progreso, la organización de damnificados en El Progreso (Damnificados Sin Techo) y OIM.

#### **Estructura institucional en la CHAT:**

ENTIDAD	FUNCION	PERSONAL
OIM	Coordinación interinstitucional, asistencia social, mantenimiento, organización comunitaria	Un coordinador, una promotora
Comité de Reconstrucción (Iglesia Católica)	Organización comunitaria en torno a proyecto de asentamiento permanente, programas espirituales	Un coordinador (medio tiempo); un promotor
Municipalidad	Enlace con autoridades locales, acompañamiento general y distribución de donaciones (incluyendo alimentos)	Una promotora

#### **Presencia de otras instituciones:**

Secretaría de Salud:

Capacitación y atención médica.

Médicos del Mundo:

Proyecto de agua potable.

FUNDASAL:

Programa de Vivienda.

<sup>6</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 289 familias. Esta información está en proceso de actualización.

### **3. SERVICIOS ESENCIALES**

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada.

Interna (OIM): Instalada.

#### **b) AGUA**

Conexión a la red local (SANAA), suministrada 8 horas diarias.

#### **c) SALUD**

☞ **Institución a Cargo (Servicio en la CHAT)**

Secretaría de Salud (Región Sanitaria No. 3).



Producto de las coordinaciones con las entidades especiales en salud mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contratado médico y una enfermera.

<b>PERSONAL</b>	<b>FUNCION</b>
1 Supervisora (visitas semanales)	Supervisión general, capacitación al personal voluntario (damnificados).
Médico (1 día por semana)	Atención médica, coordinación de las capacitaciones, remisiones al Hospital.

Adicionalmente, en la CHAT existe un puesto de atención a la Salud, el cual cuenta con medicina simplificada y con la presencia constante de dos (2) voluntarias capacitadas y supervisadas por la Secretaría de Salud.

☞ **No. de personas atendidas en la CHAT:** 40 (promedio semanal).

☞ **Enfermedades por las que fueron atendidas:**

Infecciones respiratorias, Diarreas/Parasitismo, Malaria, Paperas, Calenturas; se brinda una atención especial a mujeres embarazadas.

☞ **Centro de Salud más próximo:** Carlos B. González

*Tienen 15 cupos diarios reservados para la población en CHAT El Progreso.*

☞ **Hospital más próximo:**

Hospital de El Progreso, a ½ Km de la CHAT.

☞ **Cantidad de remisiones:** 10 (promedio semanal).

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Infecciones respiratorias , Diarreas y Problemas gastrointestinales, Fiebre, Enfermedades de la piel.

☞ **Medicamentos suministrados:**

Aspirina, Acetaminofen, Tylenol, Antidiarréicos, Ibuprofena, Antiácidos, cremas antibióticos, expectorantes, povidine, mertiolate, novalgina, gentumina.

☞ **Atención Psico-social:**

El Instituto Hondureño de Psicoterapia realizó un diagnóstico en este tema con el financiamiento de Médicos del Mundo, el cual constituye la base para un programa de atención psicológica que iniciará próximamente. Adicionalmente, el Programa Casa de la Mujer ha desarrollado un Taller de Recuperación Emocional con líderes mujeres de la CHAT.

#### d) ALIMENTACIÓN

☞ **Instituciones que suministran alimentos:**

Los alimentos para este CHAT son donados por CARE y administrados por la Municipalidad.

☞ **Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	CANTIDAD	FRECUENCIA
Frijol Rojo	10 libras	C/10 días
Arroz	26 libras	C/10 días
CSB	13 libras	C/10 días
Aceite	4 litros	C/10 días

#### e) EDUCACIÓN

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 4 maestros para primaria y se capacitó a 4 voluntarias para preescolar.

☞ **Escuelas a las que asisten los niños:**

Escuelas en la Ciudad de El Progreso: Ramón Rosa, Visitación Padilla, San Francisco, Cabañas.

☞ **Número total de niños y niñas que estudian:** 198

En curso regular: 110 En primaria acelerada:

☞ **Atención Preescolar:**

Guardería Infantil para niños y niñas de 1 mes a 7 años, con una matrícula de 60 niños y niñas, atendido por tres (03) voluntarias.



#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Estructura Organizativa:**


La organización comunitaria en esta CHAT consiste en una Asamblea General compuesta por la población en general; delega funciones en un comité de Coordinadores de Fila (34), elegidos democráticamente y una junta directiva (presidente, secretario, tesorero y vocales) – ambas entidades se reúnen en forma semanal. Además, existen tres comités específicos, que son:

##### **☞ Comités Comunitarios:**

COMITE	FUNCION	NUMERO DE PARTICIPANTES
Disciplina	Velar por el cumplimiento del reglamento interno de la CHAT.	5
Salud	Voluntarias para administrar el centro de atención, coordinación de las capacitaciones/promoción de actividades en salud.	4
Niñez	Organizar a la comunidad para el proyecto de la guardería infantil. Soluciona problemas de maltrato infantil. Apoya actividades de niñez en la CHAT.	3

Los coordinadores han recibido talleres de liderazgo por parte de OIM y en organización por la Iglesia Católica. El Comité de Salud ha participado en las capacitaciones sobre salud curativa y saneamiento básico.

El Comité de Niñez ha recibido capacitación en el manejo de la guardería infantil.



☞ **Otras Capacitaciones:**

TEMA	EJECUTOR	GRUPO META
Saneamiento Básico	Secretaría de Salud	Coordinadores, Población en General
Atención a la Mujer en el embarazo y la lactancia materna	PROHFESAC	Mujeres, Voluntarias del puesto de Salud
Atención en Salud	Secretaría de Salud	Voluntarias del puesto de Salud
Liderazgo y Organización Comunitaria	OIM	50% de la población
Derechos y Deberes de la Comunidad	Socorro Jurídico	Población en general

**5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

☞ **Estado de avance en proyectos de vivienda:**

La Iglesia Católica y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y la Vivienda (Financiamiento por Cruz Roja Española y CARITAS), aprobaron 480 viviendas (259 para familias en la CHAT).

☞ **Tipos de viviendas:**

Las casas serán construidas con paredes de bloque y cemento, techo de zinc y piso de cemento. El área de construcción (habitabile) es 40 mts<sup>2</sup> (8x5), con un patio de 16 mts<sup>2</sup>.

☞ **Metodología de Construcción:** Auto-construcción.

☞ **Predio, ubicación y aspecto legales:**

El terreno está ubicado en Pajuiles, El Progreso y fue donado por USAID a través de la Alcaldía para la construcción de casas para damnificados. El proyecto iniciará el 10 de octubre del año en curso. Se cederá derecho de propiedad a cada familia beneficiada por un lote de 150 mts<sup>2</sup>.

## **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

### **☞ Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

<b>JEFES DE FAMILIA</b>			
<b>EMPLEADO</b>		<b>DESEMPLEADO</b>	
<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>146</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>47</b>

### **☞ Tipos de empleo: (por muestreo de 60 adultos seleccionados al azar)**

Entre los hombres empleados, se destaca el área de albañilería en la cual trabaja un 23% de las personas encuestadas, después ventas (15%), Vigilancia (14%) y trabajo de maquila, empleos públicos y agricultura (9%).

Para las mujeres, la venta de tortillas es la actividad económica en la que el mayor número de mujeres manifiesta laborar (39%), después trabajo en maquila (22%).



## **VI. BARACOA Y GRAN VILLA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS**

### **A. PRESENTACIÓN**

En el Municipio de Puerto Cortés, el Censo Nacional de Albergues relevó la permanencia de 125 familias albergados en 3 centros educativos en el mes de enero, provenientes de Marejada, Buenos Aires, Vacacional, Camagüey, Pueblo Nuevo, Miraflores, Nuevos Horizontes, Punta Rieles, 14 de Agosto, Bullchampa, Caoba, La Uva, Col. Pantanal, Calan, El Jonhson y Kilometro 6. Debido a la carencia de un terreno con la amplitud suficiente para construir una CHAT grande, estas familias fueron distribuidas en dos CHAT's en Puerto Cortés. Un grupo de 77 familias actualmente reside en la CHAT de Gran Villa y otro grupo de 41 familias, en la CHAT de Baracoa; en ambos lugares, la construcción inició en la segunda semana de febrero y finalizó el 16 de abril de 1999.

El área de construcción entre las dos CHAT's es 2,944, incluyendo 142 cubiculos (136 unidades familiares y 6 módulos sociales), 50 letrinas, 12 baños y 12 lavaderos. Las dos CHAT's cuentan con energía eléctrica y agua potable por conexión a la red local. La construcción de estas CHAT's fue financiada por USAID.

El programa de administración, implementado por OIM en coordinación estrecha con la Municipalidad, y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Puerto Cortés, el componente de educación incluye la habilitación de dos áreas para clases de primaria dentro de las CHAT's para atender a aquellos niños que no encontraron cupo en las escuelas regulares, la contratación de 5 maestros por OIM, y un estímulo para las madres educadoras que atienden a los niños de edad preescolar. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 65 niños y niñas en la escuela primaria acelerada y 28 infantes

para los cursos preescolares. Desde el mes de junio ha estado funcionando un proyecto de educación adulta por parte de EDUCATODOS.

En lo que respecta a Salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de un equipo médico de 3 personas, incluyendo un (1) médico, una (1) enfermera y un (1) promotor, quienes brindan atención curativa y preventiva. Iniciando en el mes de noviembre, cada CHAT en Puerto Cortés también contará con la presencia de un socorrista de la Cruz Roja Hondureña para realizar un programa educativo sobre la salud preventiva y curativa.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido coordinadores de cada fila (15 familias) y formado comités de: Empleo, Emergencia, Orientación, Aseo, Capacitación, Niñez, Salud, Genero, Recreación y el Comité Coordinador.

Los líderes comunitarios han recibido capacitación en liderazgo y desarrollo comunitario, impartida por OIM.

### **Perspectivas Futuras**

La Municipalidad de Puerto Cortés está buscando terreno para la construcción de viviendas permanentes para las familias damnificadas en mención, así como para las más de 300 familias en situaciones de alto riesgo en el municipio. Sin embargo, no se ha realizado la compra del terreno ni se ha identificado a una organización para la implementación del proyecto de vivienda.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

ALCALDÍA: con la donación de materiales de construcción.

FHIS: encargado de la terracería y la infraestructura vial.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**

Los terrenos fueron preparados por parte del FHIS y la Alcaldía; las actividades incluyen la remoción de capa vegetal, limpieza, así como las vías de acceso.

#### **a) Organización de OIM en el terreno:**

Se designó un responsable de la logística, todos bajo la conducción de un responsable regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformo un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **b) Calidad del terreno:**

El proyecto se encuentra en terrenos privados que a petición de la Alcaldía fueron cedidos temporalmente a los damnificados.


#### **c) Características del Proyecto:**

Se implemento el diseño de galeras de 30 cubículos.

#### **d) Características Técnicas:**

El área por familia es de 16 mts<sup>2</sup> , techado de zinc, estructura de madera, forrado de paredes con panelit y piso de cemento.

## **2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**



### **Gran Villa:**

92 cubículos habitacionales y 2 sociales.

### **Baracoa:**

44 cubículos habitacionales y 6 sociales.

## **3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

Gran Villa: 3 módulos de 10 letrinas cada uno.

Baracoa: 2 módulos de 10 letrinas cada uno.

## **4. MANTENIMIENTO**

<b>Tareas</b>
<b>Limpieza de tubos de agua potable.</b>
<b>Limpieza de tuberías de aguas grises.</b>
<b>Colocación de zinc(2) de 8 pies en cubículo B-10.</b>
<b>Colocación de Tubos (PVC) en letrinas.</b>
<b>Conformar y limpiar drenajes (aguas lluvia y grises).</b>
<b>Proyecto para entierro de basura.</b>
<b>Listado de Materiales para sistema de aguas grises.</b>
<b>Provisión de materiales para sistemas de aguas grises.</b>
<b>Estudio para entierro de basura.</b>

## C. ADMINISTRACIÓN BARACOA

### 1. POBLACION<sup>7</sup>: 41 FAMILIAS.

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
Mujeres	12	16	9	29	3	69
Hombres	18	19	7	25	7	76
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>145</b>

#### **Explicación de Faltantes:**

- ❖ Familias alojadas con familiares.
- ❖ No quisieron ir a los CHATS.

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Instituciones Administradoras:** Alcaldía de Puerto Cortés y OIM.

**Número de personal en la CHAT:** Una oficial de campo.

#### **Presencia de otras instituciones:**

EDUCATODOS: Educación.  
CARITAS: Alimentación (APT).  
Capacitación vocacional (previsto).  
Secretaría de Salud: Salud.  
ASHONPLAFA: Salud reproductiva.  
Municipalidad: Programa merienda escolar.

### 3. SERVICIOS ESENCIALES

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada

Interna (OIM): Instalada

<sup>7</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 33 familias. Esta información está en proceso de actualización.

**b) AGUA**

Sistema de provisión de agua: Conexión a la red local.


**c) SALUD**

☞ **Instituciones a Cargo (Servicio en la CHAT):** Secretaría de Salud.

PERSONAL DISPONIBLE	FUNCIONES	PERSONAS ATENDIDAS
1 médico, 1 enfermera	Atención médica 2 veces por semana y remisión de pacientes. Coordinación de charlas sobre Higiene y Salud Mental dentro de la CHAT.	80

Producto de las coordinaciones con las entidades especiales en salud mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contratado el médico y la enfermera mencionados arriba.

En el mes de Mayo fueron atendidas 203 personas de la CHAT por una brigada médica de Medicus Mundi Biscaia.

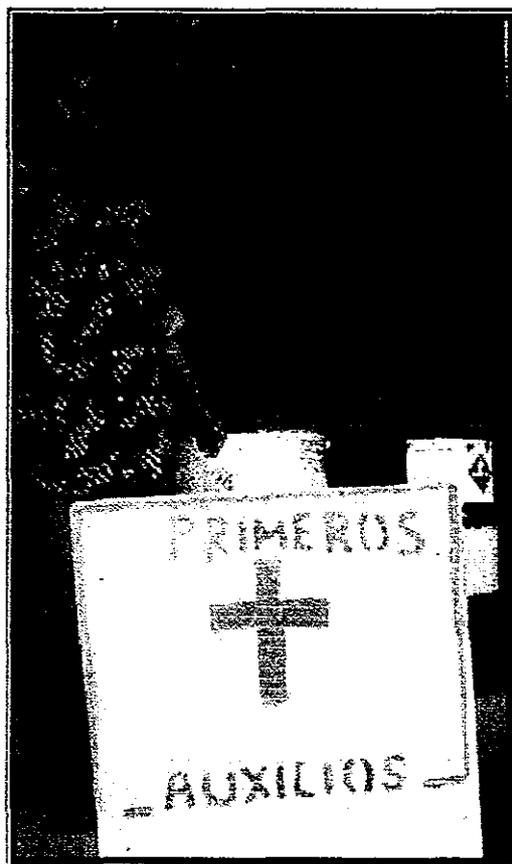

☞ **Enfermedades por las que fueron atendidos:**

Infecciones respiratorias (IRAs),  
Diarreas/parasitismo, Dermatitis,  
Biodermis, Gastritis, Neurosis.

☞ **Centro de Salud más próximo:**  
Centro de salud a 1 Km

☞ **Hospital más cercano:**  
Hospital de Area a 12 Km

☞ **Cantidad de remisiones al servicio más cercano:**  
26 (promedio mensual).

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Infecciones respiratorias (IRAs),  
diarreas/parasitismo, dermatitis.

#### d) ALIMENTACIÓN

☞ **Institución que suministran alimentos:** CARITAS.

☞ **Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	CANTIDAD	FRECUENCIA
Arroz	16.5 libras	Quincenal
Frijol Rojo	8 libras	Quincenal
Harina de Maíz	12 libras	Quincenal
Aceite	2.2 libras	Quincenal

☞ **Alimentación Suplementaria:**

La Alcaldía Municipal apoya a los beneficiarios con el Programa de Merienda Escolar brindando una bolsa de leche por cada niño en la CHAT, cada cuatro días.

#### e) EDUCACIÓN

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 1 maestro para primaria y 1 voluntaria para preescolar.

☞ **Escuela existente en la CHAT:** Escuela "EDUCATODOS".

☞ **Escuelas (otras) a la que asisten los niños:**

Escuela Francisco Morazán, Baracoa.

☞ **Población escolar:** 45 niños.

☞ **Cantidad de niños que asisten a la escuela:**

Grado	Escuela CHAT	Primaria Acelerada	Escuela Baracoa
Primero	9		7
Segundo	6		-
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>7</b>

## **5. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

### **☞ Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Comité Coordinador	3
Emergencia	3
Aseo	3
Niñez	3
Genero	3
Empleo	3
Capacitación	3
Salud	3
Recreación	3



☞ **Capacitaciones recibidas:**

Como parte del proceso de formación de las comisiones OIM brindo Talleres de Liderazgo y Organización Comunitaria. Actualmente CARITAS esta formulando un proyecto de capacitación en corte y confección.

**5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

☞ **Estado de avance en proyectos de vivienda:**

La municipalidad de Puerto Cortés ha organizado un comité pro – vivienda integrado por las distintas ONGs interesadas en proveer vivienda a los damnificados; sin embargo hasta la fecha no se cuenta con ningún proyecto de vivienda para esta población.

**6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

☞ **Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

En su mayoría los jefes de familia tienen empleos jornaleros fuera del CHAT, las jefas de familia obtienen sus ingresos mediante empleos domésticos.

JEFES DE FAMILIA			
EMPLEADO		DESEMPLEADO	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
18	7	3	5

☞ **Tipos de empleo:**

Jornaleros, carpinteros, albañiles, guardias de seguridad, maquila.

## D. ADMINISTRACIÓN GRAN VILLA

### 1. POBLACION<sup>8</sup>:

**77 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
<b>Mujeres</b>	17	42	16	58	8	<b>141</b>
<b>Hombres</b>	35	43	8	43	12	<b>141</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>24</b>	<b>101</b>	<b>20</b>	<b>282</b>

#### **Explicación de Faltantes:**

- ❖ Familias alojadas con familiares.
- ❖ No quisieron ir a los CHATS.

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

**Instituciones Administradoras:** Alcaldía de Puerto Cortés y OIM.

**Número de personal en la CHAT:** Una oficial de campo.

#### **Presencia de otras instituciones:**

EDUCATODOS: Educación.

CARE: Alimentación (APT).

Secretaría de Salud: Atención en Salud.

ASHONPLAFA: Salud reproductiva.

Municipalidad: Programa de merienda escolar.

### 3. SERVICIOS ESENCIALES

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada

Interna (OIM): Instalada

#### **b) AGUA**

Sistema de provisión de agua: Conexión a la red local.


<sup>8</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 74 familias. Esta información está en proceso de actualización.

**c) SALUD**

☞ **Instituciones a Cargo (Servicio en la CHAT):** Secretaría de Salud.

PERSONAL DISPONIBLE	FUNCIONES	PERSONAS ATENDIDAS
1 médico, 1 enfermera	Atención médica 2 veces por semana y remisión de pacientes. Coordinación de charlas sobre Higiene y Salud Mental dentro de la CHAT.	123

Producto de las coordinaciones con las entidades especiales en salud mencionadas con anterioridad la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contratado médico y una enfermera.



☞ **Enfermedades por las que fueron atendidos:**

Infecciones respiratorias (IRAs), diarreas/parasitismo, dermatitis, biodermis, gastritis, neurosis.

☞ **Centro de Salud más próximo:**

Centro de salud de Baracoa a 2 Km.

☞ **Hospital más cercano:**

Hospital de Area a 11 Km.

☞ **Cantidad de remisiones al servicio más cercano:**

14 (promedio mensual).

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Infecciones respiratorias (IRAs), diarreas/parasitismo, dermatitis.

#### d) ALIMENTACIÓN

☞ **Instituciones que suministran alimentos:** CARE

☞ **Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	CANTIDAD	FRECUENCIA
Arroz	16.5 libras	Quincenal
Frijol Rojo	8 libras	Quincenal
Harina de Maíz	12 libras	Quincenal
Aceite	2.2 libras	Quincenal

Este programa de alimentación concluyó el 30 de Septiembre del presente año.

☞ **Alimentación Suplementaria:**

La Alcaldía Municipal apoya a los beneficiarios con el Programa de Merienda Escolar brindando una bolsa de leche por cada niño en la CHAT, cada 4 días.

#### e) EDUCACIÓN


Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrató 1 maestro para primaria y 2 voluntarias para preescolar.

☞ **Escuela existente en la CHAT:** Escuela CHAT Gran Villa.

☞ **Escuela (otras) a la que asisten los niños:** Escuela de la Gran Villa.

☞ **Población escolar:**

62 niños en primer grado  
(16 en la Escuela de la CHAT,  
42 en Primaria Acelerada y  
4 en la Escuela de Gran Villa).

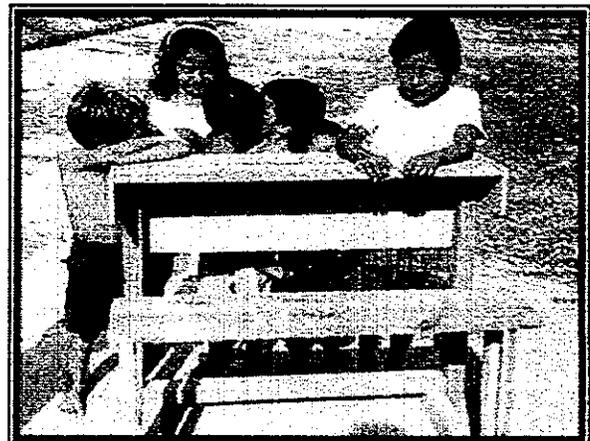

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Comités Comunitarios:**

<b>Comité</b>	<b>Número de Participantes</b>
Comité Coordinador	3
Emergencia	3
Aseo	3
Niñez	3
Genero	3
Empleo	3
Capacitación	3
Salud	3
Recreación	3

##### **☞ Capacitaciones recibidas:**

Como parte del proceso de formación de las comisiones OIM brindo Talleres de Liderazgo y Organización Comunitaria. Actualmente CARITAS esta formulando un proyecto de capacitación en corte y confección.

#### **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

##### **☞ Estado de avance en proyectos de vivienda:**

La municipalidad de Puerto Cortés ha organizado un comité pro – vivienda integrado por las distintas ONGs interesadas en proveer vivienda a los damnificados; sin embargo hasta la fecha no se cuenta con ningún proyecto de vivienda para esta población.

## **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

### **☞ Situación de empleo de los Jefes de Familia:**

En su mayoría los jefes de familia tienen empleos jornaleros fuera del CHAT, las jefas de familia obtienen sus ingresos mediante empleos domésticos.

<b>JEFES DE FAMILIA</b>			
<b>EMPLEADO</b>		<b>DESEMPLEADO</b>	
<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRES</b>	<b>MUJERES</b>
<b>27</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>22</b>

### **☞ Tipos de empleo:**

Jornaleros, carpinteros, albañiles, guardias de seguridad, maquila.

## **VII. COMUNIDAD VIDA NUEVA, COFRADIA, CORTES**

### **A. PRESENTACIÓN**

La CHAT de San Pedro Sula está ubicada en una amplia extensión de terreno cerca del Pueblo de Cofradía y dentro del área de la nueva comunidad de Vida Nueva, promovida por la Fundación Vida Nueva de San Pedro Sula (conformada por la Alcaldía de San Pedro Sula, la Fundación Principios Básicos, varias ONG's y el Cámara de Comercio).

La construcción de esta CHAT fue financiada por USAID, la cual se realizó en dos etapas, 330 cubículos fueron construidos en la primera etapa que inició el 10 de febrero; este número se duplicó durante la segunda fase, terminándose el 3 de junio de 1999. Entre las dos etapas, un área de 10,560 metros cuadrados fue construida, incluyendo 660 unidades familiares, 110 letrinas, 170 baños y 56 lavaderos. La CHAT cuenta con energía eléctrica; el agua es abastecido a través

El programa de apoyo a la administración, implementado por OIM en coordinación estrecha con la Fundación Vida Nueva, y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Cofradía, el componente de educación incluye la habilitación de una escuela dentro de la CHAT para atender a aquellos niños que no encontraron cupo en las escuelas regulares, la contratación de 3 maestros por OIM, y un estímulo para las madres educadoras que atienden a los niños de edad preescolar. El personal educativo es seleccionado y supervisado por la Secretaría de Educación; la capacitación del mismo se realizó con apoyo financiero de UNICEF, el cual también dotó el mobiliario y materiales educativos para las escuelas primarias y los CEPENFs. Hasta la fecha, están registrados 459 niños y niñas en la escuela primaria y 42 infantes para los cursos preescolares. En el mes de noviembre, se desarrollará un componente de educación adulta por el Programa EDUCATODOS de la Secretaría de Educación.

En lo que respecta a Salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de un equipo médico de 2 personas, incluyendo una (1) enfermera y un (1) promotor, quienes brindan atención curativa y preventiva. Una voluntaria de salud recibe capacitación continua en la salud preventiva, curativa y la detección de epidemias. La CHAT cuenta con un centro de salud.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han elegido coordinadores de cada fila (15 familias) y formado comités de orden y vigilancia. Estos coordinadores han recibido capacitación en liderazgo y desarrollo comunitario, impartido por OIM.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

USAID: Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

SETCO: Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

ALCALDÍA Y FUNDACIÓN VIDA NUEVA: En saneamiento y agua potable.

#### **c) Trabajos Preparatorios:**

Fue preparado por parte del FHIS y la Alcaldía de cada lugar: remoción de capa vegetal y compactación de los terrenos desnivelados, limpieza, así como las vías de acceso.

#### **d) Organización de OIM en el terreno:**

Fue designo un responsable de la logística, todos bajo la conducción de un responsable regional de OIM que respondía a las directrices de la Dirección Central en Tegucigalpa. Se conformo un equipo operativo en cada proyecto encabezado por un ingeniero o Arquitecto residente, maestro de obra, bodeguero, vigilantes, carpinteros y albañiles.

#### **e) Calidad del terreno:**

El terreno donde esta situado la CHAT , es dominio de la fundación vida nueva y está en proceso de asignación de lotes a damnificado para la construcción de las viviendas definitivas.

#### **f) Características del Proyecto:**


Su diseño de construcción es de galeras de 30 cubiculos.

#### **g) Características Técnicas:**

El área por familia se mantuvo en 4x4 metros a excepción de la estructura, distancia de 10 metros, entre ellas.

## **2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**

Cuenta con 660 cubículos.



## **3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

Cuenta con 22 módulos de 5  
letrinas secas funcionando.



## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACION<sup>9</sup>:

**486 FAMILIAS.**

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
<b>Mujeres</b>	246	268	111	393	52	<b>1070</b>
<b>Hombres</b>	286	272	101	335	36	<b>1030</b>
<b>TOTAL</b>	<b>532</b>	<b>540</b>	<b>212</b>	<b>728</b>	<b>88</b>	<b>2100</b>

#### **Explicación del faltante de residentes:**

Debido al tamaño de esta CHAT y de la comunidad nueva que se está construyendo (4,000 viviendas potenciales), se ha utilizado un número importante de cubículos para funciones sociales, incluyendo negocios (13), oficinas (4), programas educativos (30), área de salud (4) y bodegas (16). El remanente de cubículos para familias es 89 que se ocuparán en forma paulatina por familias que se encuentran en situaciones de alto riesgo.

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

#### **Institución Administradora:**

Fundación Vida Nueva (Alcaldía, Principios Básicos, Cámara de Comercio).

**Presencia de OIM en la CHAT:** Una Coordinadora.

#### **Presencia de otras instituciones:**

Cruz Roja Hondureña, Secretaría de Educación, Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (IHNFA), Secretaría de Salud, Children International, Alcaldía Municipal, UNICEF, CONVIDA y PRIDE, Hábitat para la Humanidad, Fundación Guadalupe, Asociación de Maquiladora, Obras Sociales Vicentinas (OSOVI), Fundación Ruth Paz, Centro para el Desarrollo Sostenible (CEDESO), Club Rotario Sampedrano, Bolsa Samaritana.

<sup>9</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de Julio y corresponden al número de familias censadas que es 447 familias. Esta información está en proceso de actualización

### **3. SERVICIOS ESENCIALES**

#### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Instalada

Interna (OIM): Instalada

#### **b) AGUA**

Pipas de agua mantenidas por la Alcaldía Municipal y el Sector Privado (PAGSA, PANADOL) son abastecidas a diario. La conexión a la red local (DIMA) no se está utilizando para consumo humano, ya que se determinó que el agua no es potable. Actualmente se está gestionando una máquina potabilizadora con UNICEF y DIMA.

#### **c) SALUD**

##### **☞ Institución a Cargo (Servicio en la CHAT)**

La Municipalidad de Salud a través de la Unidad Municipal de Salud, es la institución a cargo de la clínica médica y farmacia ubicada en la CHAT; el servicio cuenta con cuatro (04) personas, que son:

<b>PERSONAL</b>	<b>HORARIO</b>
Enfermera Auxiliar	Lunes a viernes, 8:30 – 16:00 horas
Enfermera Auxiliar	Lunes a viernes, 8:30 – 16:00 horas
Médico General	Lunes a viernes, 13:30 – 14:30 horas
Promotor	Semi-regular

##### **☞ No. de personas atendidas en la CHAT:**

Se atienden a un promedio de 600 pacientes por mes.

La siguiente tabla muestra la distribución de la atención médica en la CHAT <sup>10</sup>

<b>0-1</b>	<b>1-4</b>	<b>5-14</b>	<b>15 -49</b>	<b>&gt;50</b>	<b>TOTAL</b>
483	396	338	411	174	<b>1802</b>

##### **☞ Enfermedades por las que fueron atendidas:**

Infecciones respiratorias, Diarreas, Desnutrición grados I, II y III.

<sup>10</sup> Datos estadísticos recopilados para los meses de Junio a Agosto.

- ☞ **Centro de Salud más próximo:** Centro de Salud Cofradía
- ☞ **Hospital más próximo:** Hospital Mario Catarino Rivas.

- ☞ **Cantidad de remisiones:** 10 mensualmente.

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales, problemas durante embarazo y desnutrición.

☞ **Medicamentos suministrados:**

Antidiarréicos, expectorantes, analgésicos, antibióticos, vitaminas y desparasitantes.

☞ **Atención Psico-social:**

La clínica atiende un promedio de 2-3 personas por alcoholismo, consumo de resistol y drogas (marihuana, Diazepan), las cuales son remitidas a la Unidad de Alcoholismo en el Hospital de SPS.

**d) ALIMENTACIÓN**

☞ **Institución que suministra alimentos:**

Los alimentos para este CHAT son donados por CARE mediante un programa de Alimentos por Trabajo.

☞ **Alimentación suministrada:**

PRODUCTO	CANTIDAD	FRECUENCIA
Frijoles	150 quintales	Mensual
Arroz	300 quintales	Mensual
Harina de Maíz	381 bolsas	Mensual
Aceite	101 cajas	Mensual

☞ **Alimentación suplementaria:**

Children International proporciona una comida diaria (lunes a viernes) a los niños y niñas, la cual consiste en bebida de osmil, fritas de harina, avena y leche.

### e) EDUCACIÓN

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999 para la implementación de un programa de atención especial en educación se contrataron 3 maestros para primaria y 2 voluntarias para preescolar.

#### ∞ Escuela existente en la CHAT:

Escuela Renacer de Sula, construida por OIM (galera).

∞ **Número de niños y niñas que estudian:** 459

En curso regular: 371

Grado	Niños	Maestros
Preparatoria	36	1 <i>compartido con Kinder</i>
Kinder	48	Ver arriba
1ero	116	2
2do.	41	1
3ero.	40	1
4to.	32	1
5to.	28	1 <i>compartido con 6to</i>
6to.	30	Ver arriba
<b>TOTAL</b>	<b>371</b>	<b>7</b>

En Primaria Acelerada: 88

#### ∞ Atención Preescolar:

Se brindan clases preparatorias y de kinder para niños de 4-5 años.

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Comités Comunitarios:**

<b>COMITE</b>	<b>FUNCION</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPANTES</b>
Orden	Vigilancia general y velar por el cumplimiento de las normas de la comunidad	5
Coordinadores de Fila	Canalizar información a las familias que representan (15)	33

##### **☞ Capacitación:**

Los coordinadores de fila han recibido cuatro (4) capacitaciones.

Otras capacitaciones recibidas por la población en general incluyen: Manualidades, Salud y Saneamiento Básico (Secretaría de Salud), Escuela para Padres (IHNFA) y cuidado y nutrición para niños (Children International).

#### **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

##### **☞ Estado de avance en proyectos de vivienda:**

<b>ENTIDAD</b>	<b>NUMERO APROBADO</b>	<b>ESTADO DE AVANCE</b>	
		<b>Finalizadas</b>	<b>En Construcción</b>
Bolsa Samaritana	1000	0	608
Licitación Privada	1095	0	0
Gobierno de Cataluña	600	0	0
HABITAT	217	0	0
Club Rotario	50	0	0
Misión Bautista	38	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

☞ **Tipos de vivienda:**

Las casas serán construidas con paredes de bloque (6" exterior, 4" interior), láminas de zinc, piso de concreto y ventanas de celosía. El tamaño de la casa oscila entre 23.90 m<sup>2</sup> y 56.55 m<sup>2</sup>.

☞ **Metodología de construcción:** Mayoritariamente auto-construcción

☞ **Predio, ubicación y aspecto legales:**

Los terrenos en dónde se construyen las viviendas permanentes rodean la CHAT; fueron comprados por la Fundación Vida Nueva para ser cedidos a aproximadamente 4000 familias beneficiarias.


## **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

☞ **Tipos de empleo:** (por muestreo de 97 jefes de familia al azar)

Entre los hombres, se destaca el área de albañilería en la cual trabaja un 19% de las personas encuestadas, después Comerciantes (18%), Obreros (10%), Vigilantes (8%), operarios de maquilas, carpinteros, mecánicos forman un 8% de la población.

Para las mujeres, el aseo en casas y otros es la actividad económica en la que el mayor número de mujeres manifiesta laborar (12%), después lavado y planchado (8%) y finalmente trabajo en maquila (4%).

# ZONA SUR

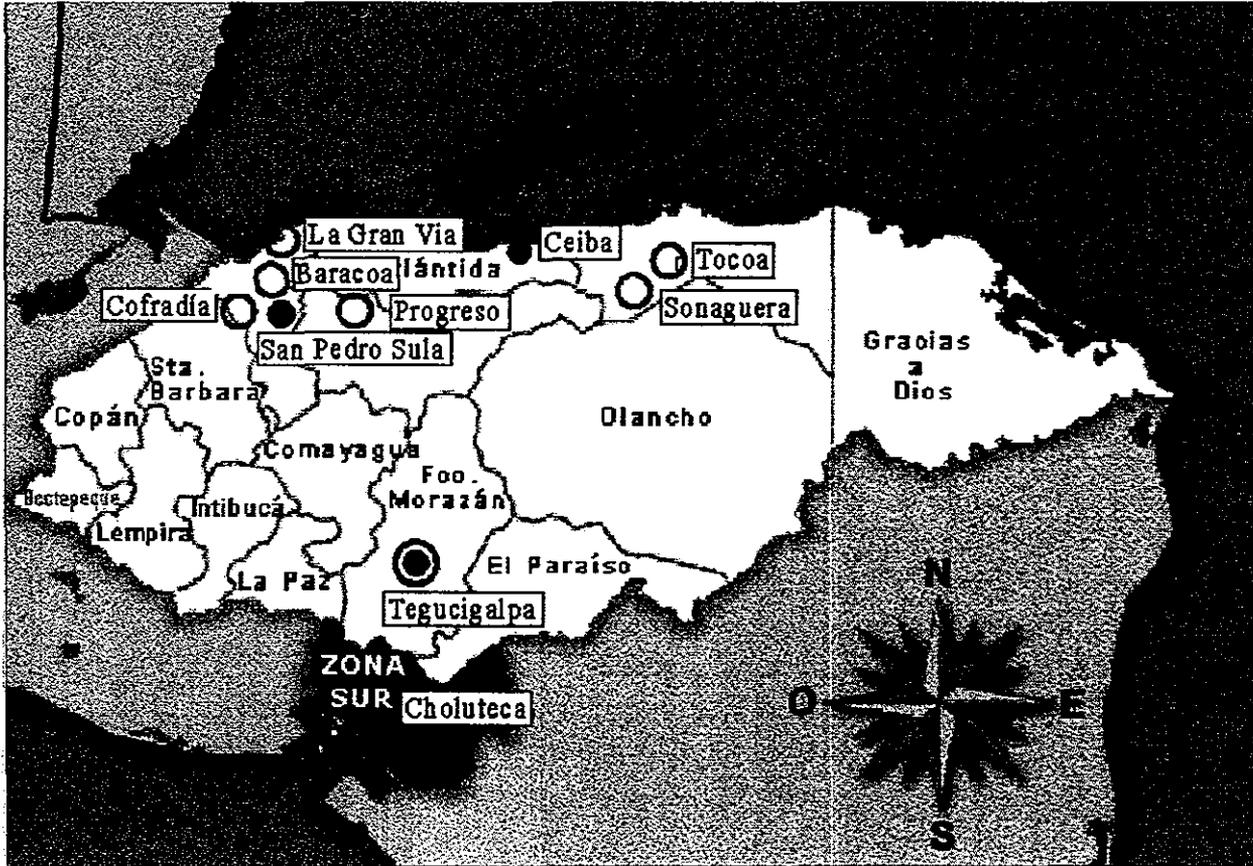

- OFICINA CENTRAL
- OFICINA DE CAMPO
- ⊙ SUB-OFFICINA DE CAMPO

## **I. NUEVA CHOLUTECA, LIMÓN DE LA CERCA, CHOLUTECA**



### **A. PRESENTACIÓN**

En Choluteca, dónde el Censo Nacional de Albergues relevó la permanencia de 1022 familias en albergues temporales en todo el departamento, la Alcaldía puso a disposición de las familias damnificadas una gran extensión de terreno, negociada con el Banco de Occidente, a unos 5 kilómetros de la Ciudad de Choluteca y aledaño a la Comunidad de Limón de la Cerca. Debido a que los lotes fueron asignados en forma permanente a las familias damnificadas beneficiadas por la construcción de la CHAT, se aplicó el modelo de módulos unifamiliares, que miden 4 x 4 metros.

La construcción de esta CHAT (la más grande del país) inició el 1 de marzo y finalizó el 8 de julio de 1999. El área total de construcción es de 19,940 metros cuadrados e incluye 1200 módulos familiares y 10 módulos sociales. La construcción fue financiada por USAID.

El programa de administración, implementado por OIM en coordinación estrecha con el Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI), y financiado por USAID, ha priorizado la atención en salud y educación: para mejorar servicios en dichas áreas, se realizó una convocatoria de las instancias gubernamentales, agencias del Sistema de las Naciones Unidas como UNICEF, OPS y FNUAP y otros actores claves en cada municipio, enfatizando la participación de las alcaldías y los beneficiarios mismos.

En Choluteca, el componente de educación incluye la construcción de una escuela dentro de la CHAT, la contratación de 5 maestros por OIM, y un estímulo para las 6 madres educadoras que atenderán a los niños de edad preescolar, así como la construcción (temporal) y equipamiento de varios hogares de cuidado infantil y centros escolares (CEPENFs). Hasta la fecha, están registrados 493 niños y niñas en la escuela primaria y 185 infantes para los centros preescolares. Actualmente, se está iniciando un componente de educación adulta por el Programa EDUCATODOS de la Secretaría de Educación.

En lo que respecta a Salud, a través del apoyo financiero de OPS, la CHAT cuenta con la presencia regular de un equipo médico de 5 personas, incluyendo un (1) médico, dos (2) enfermeras y dos (2) promotores, quienes brindan atención curativa y preventiva. Dentro de la CHAT, existe un Centro de Salud, construido por la ONG Maltessar y equipado por UNICEF.

En cuanto a la organización comunitaria, los beneficiarios han formado 8 colonias y han nombrado Juntas de Desarrollo para cada una de ellas. Las primeras comisiones específicas a formarse son los grupos de vigilancia; actualmente se están formando comisiones de mantenimiento.

### **Perspectivas Futuras**

Desde el mes de enero se formalizó la asignación de 2,100 lotes (10 x 15 mts) en el terreno mencionado, permitiendo desde esa fecha la construcción de viviendas permanentes por organizaciones, tales como: Atlas Logistique, CECI, CARE, la Bolsa Samaritana, Iglesia de Cristo, Cooperación Española, CARITAS, Iglesia Santidad, ADRA y la Iglesia Protestante. Las viviendas comprometidas por estas organizaciones suman a los 1200; 670 de éstas están finalizadas.

## **B. CONSTRUCCIÓN**

### **1. PROCESO CONSTRUCTIVO**

#### **a) Entidad Donante:**

**USAID:** Financiamiento en la construcción de la CHAT, Programa de Mantenimiento.

#### **b) Entidades Colaboradoras:**

**SETCO:** Enlace gubernamental y autoridad coordinadora.

**Alcaldía Municipal:** Ha sido el eje de la coordinación para el impulso del proyecto. Gestionó la adquisición del terreno y ha prestado apoyo con camiones y algunos materiales como grava y arena.

**ATLAS:** Construyó un pozo que suma a la disponibilidad de agua existente. Forma parte del grupo que atiende al abastecimiento provisional de agua en todo Limón de la Cerca.

**Acción contra el Hambre:** Igual que la anterior, ha perforado pozos y participa en el grupo de distribución de agua.

**Médicos sin Fronteras:** Construyó 2 baterías de letrinas para todo El Limón de la Cerca y apoyó con la base para la colocación de las vejigas de agua.

**Batallón de Artillería:** Colaboró con una planta de generación de energía eléctrica.

**FHIS:** Participa activamente en la solución de la problemática de saneamiento del proyecto y de infraestructura vial.

**ENEE:** Se encuentran trabajando en la instalación de la infraestructura eléctrica.

**SANAA:** Participa en la solución al problema de agua del proyecto.

**b) Trabajos Preparatorios:**


Se realizó una limpieza en cada lote (corte de maleza etc.), luego se procedió al levantamiento de plataforma, relleno y compactado con material selecto y la apertura de calles por parte del FHIS y la Alcaldía.



**c) Organización de OIM en el terreno:**

- œ Se designó un responsable regional que estuvo a cargo de la Coordinación General del Proyecto, así como la Coordinación Interinstitucional.
- œ Un arquitecto residente, supervisores de campo, bodeguero, vigilantes, y cuadrillas de operación carpinteros y albañiles.
- œ Un responsable logístico que se hizo cargo de los suministros necesarios, transporte y otro tipo de apoyo para el proyecto.

**d) Calidad del terreno:**



La Alcaldía de Choluteca gestionó ante el Banco de Occidente para que otorgara crédito a todos los damnificados para adjudicar sus lotes en condiciones blandas de interés y a largo plazo.

**e) Características del Proyecto:** Cubículos individuales.

**f) Características Técnicas:**

Construcción unimodular de 4x4 Mts (16 mts<sup>2</sup>), techado de zinc, piso de cemento, puertas de 33" x80" de panelit de 11 mm; cortina de plástico y una ventana con 3 metros de malla ciclón.

## **2. INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL**



El proyecto finalizado alcanzó los 1,200 cubículos, 2 escuelas y un módulo administrativo de 5 oficinas, para un total de 19,940 mts<sup>2</sup> de construcción.

## **3. INFRAESTRUCTURA SANITARIA**

Los 1200 cubículos son parte de una urbanización de más de 2,100 casas proyectada. Esto impuso la necesidad de realizar un proyecto integral de saneamiento por parte del FHIS y la Alcaldía, con financiamiento de AID. Este proyecto contempla la construcción de letrinas.

## **4. MANTENIMIENTO**

<b>Actividades Cumplidas y Programadas</b>	
☞	<b>Reparaciones generales a la estructura exterior de cubículos.</b>
☞	<b>Reparación de pisos dañados por la humedad.</b>
☞	<b>Reparación de techos dañados por el viento.</b>
☞	<b>Conformación de canales de drenajes.</b>
☞	<b>Limpieza y clausura de cubículos no habitados.</b>
☞	<b>Conformación de plataformas a los cubículos de zonas bajas.</b>
☞	<b>Gestión para la provisión de letrinas.</b>
☞	<b>Elaboración de la propuesta técnica para la limpieza de los micro albergues.</b>

## C. ADMINISTRACIÓN

### 1. POBLACIÓN

#### **Número de familias residentes en la CHAT (aprox)<sup>1</sup>:**

1128 en Limón de la Cerca, de las cuales 506 residen en los microalbergues. Hay 2100 lotes asignados en este terreno.

Sexo	0-5	6-12	13-17	18-50	>50	TOTAL
<b>Mujeres</b>	245	234	132	503	111	<b>1225</b>
<b>Hombres</b>	242	259	141	398	82	<b>1122</b>
<b>TOTAL</b>	<b>487</b>	<b>493</b>	<b>273</b>	<b>901</b>	<b>193</b>	<b>2347</b>

#### **Explicación de Faltantes:**

- ❖ Familias alojadas con familiares.
- ❖ Familias en espera de una vivienda permanente.
- ❖ Falta de infraestructura de saneamiento básico (letrinas).

### 2. MARCO INSTITUCIONAL

Está por suscribirse un convenio de cooperación entre la alcaldía de Choluteca, el Centro Canadiense de Estudio y Cooperación Institucional (CECI) para la administración de los microalbergues en Limón de la Cerca y la atención a sus residentes.

#### **Instituciones Administradoras:**

Alcaldía, CECI y OIM.

#### **Número de personal en la CHAT:**

OIM Dos promotores, un coordinador regional.

CECI Dos coordinadores (área social y área de construcción), dos promotores (área social y área de construcción), una secretaria/administradora y una persona que apoya en el área de capacitación.

<sup>1</sup> Los datos estadísticos contenidos en este informe son producto de un censo realizado en el mes de octubre y corresponden al número de familias censadas en micro albergues que es 506 familias. Esta información está en proceso de actualización.

### **Presencia de otras instituciones:**

CARITAS, ATLAS, Orden de Malta, Bolsa Samaritana, ADRA, Acción contra el Hambre, FINCA Honduras, Help Honduras, Vida Abundante, Cruz Roja de Austria, Médicos sin Fronteras, Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF, IHNFA, otras entidades estatales.

## **3. SERVICIOS ESENCIALES**

### **a) ELECTRICIDAD**

Externa (ENEE): Solo existe iluminación en el perímetro de la CHAT.

Interna (OIM): Instalada.

### **b) AGUA**

Sistema de provisión de agua: Pozos (4), se presume que el FHIS instalará bombas eléctricas de agua y la red de distribución en toda la comunidad, mientras tanto OIM suministra agua potable almacenada en vejigas.



### **c) SALUD**

Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Cruz Roja Hondureña y OIM, el cual contempla la atención en salud curativa y preventiva para de la población damnificada en Limón de la Cerca, OPS actualmente ha contratado un médico, un odontólogo, una enfermera y dos promotores, asegurando así la atención en la CHAT por profesionales a tiempo completo.

☞ **Institución a Cargo:**

Área Metropolitana de Salud con el apoyo de MALTESSAR.

PERSONAL DISPONIBLE	HORARIO	PERSONAS ATENDIDAS
2 médicos, 3 enfermeras, 3 promotores	8:00 a 3:00 PM Lunes a Viernes	98 (promedio semanal)

Existe un Centro de Salud en la CHAT, el cual fué construido por la ONG MALTESSAR y equipado por UNICEF.



☞ **Enfermedades por las que fueron atendidos:**

Enfermedades Respiratorias (gripe, asma bronquial, faringitis), malaria, dengue, diarrea (especialmente en niños), problemas en la piel.

☞ **Centro de Salud más próximo:**

Existen tres centros de salud: La Providencia, en el barrio del mismo nombre, otro en el barrio Las Colinas y el centro de salud San Pablo, manejado por la Iglesia Católica, en el barrio Las Colinas también.

☞ **Hospital más cercano:** Hospital del Sur de Choluteca aprox. 10 Km.

☞ **Problemas de salud más comunes en la CHAT:**

Enfermedades Gastrointestinales e Infecciones respiratorias.

☞ **Medicamentos suministrados:**

Acetaminofen, amoxicilina(antibiótico), sulbron, primaquina, cloroquina, clotrimazol, penicilina.

☞ **Atención Psico – social:**

Personal del Hospital Nacional y del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) trabajan con grupos vulnerables; cuentan con un equipo integrado por una psicóloga y dos promotores.

**d) ALIMENTACIÓN**

☞ **Institución que suministra alimentos:**

PMA (APT): Frijol, arroz, aceite y harina de forma semanal o quincenal dependiendo de la ONG que administra el programa de auto - construcción.

☞ **Alimentación suplementaria:**

UNICEF: desayuno escolar para los niños que asisten a la escuela en la CHAT.

**e) EDUCACIÓN**


Producto del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y OIM, con fecha 3 de Septiembre de 1999, para la implementación de un programa de atención especial en educación en las CHAT's, en Choluteca se contratarán 5 maestros de primaria y 6 voluntarias para el servicio preescolar. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha aportado materiales, mobiliario y capacitación a educadores.

☞ **Escuelas existentes en la CHAT:**

Escuela Lempira: construida por OIM (galera).

Escuela Ricardo Soriano: construida por la ONG Atlas Logistique.

*La Cooperación Española construirá una estructura definitiva.*

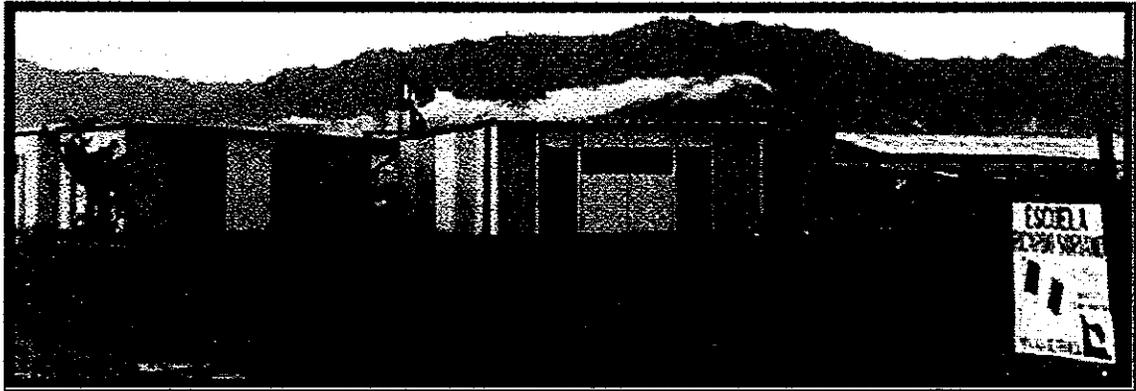

☞ **Escuela (otra) a las que asisten los niños:**

Escuela Francisco Morazán, ubicada en un pequeño predio aledaño a Limón de la Cerca.

☞ **Población escolar (total):** 577 niños.

☞ **Distribución de niños que asisten a la escuela:**

Grado	Escuela Lempira	Escuela Ricardo Soriano	Escuela Morazán
Preescolar	30	---	---
Primero	50	80	18
Segundo	45	65	8
Tercero	40	45	10
Cuarto	30	35	10
Quinto	25	38	10
Sexto	15	15	8
<b>TOTAL</b>	<b>235</b>	<b>278</b>	<b>64</b>
<b>Total Maestros</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

☞ **Guardería Infantil:**

Recientemente se inauguró el primer hogar infantil, administrado por el Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (IHNFA), con 30 niños registrados en la colonia Francesa de Limón de la Cerca.

Actualmente se encuentra en proceso de disertación un plan de acción para iniciar dos hogares de cuidado infantil adicionales en coordinación con IHNFA y UNICEF.

#### **4. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y CAPACITACIÓN**

##### **☞ Comités Comunitarios:**

Existe una Junta de Desarrollo Comunal con 8 a 10 miembros y un Comité de Vigilancia en cada una de las ocho colonias de Limón de la Cerca.

##### **☞ Capacitaciones:**

No.	Tema	Ejecutor	Estado/ N. Beneficiarios
1	Dieta Alimentaria y Nutrición	Area Metropolitana de Salud	En ejecución
2	Liderazgo, Organización y Desarrollo	CECI (con apoyo de OIM)	Iniciando (60 personas)
3	Corte y Confección	INFOP	En ejecución (35 personas)
4	Albañilería	INFOP	En diseño

## **5. REASENTAMIENTO PERMANENTE**

### **☞ Estado de avance en proyectos de vivienda:**

<b>Entidad</b>	<b>Número Aprobadas</b>
Iglesia Protestante	25
ADRA	25
Iglesia Santidad	50
CARITAS	50
Cooperación Española	50
Iglesia de Cristo	50
Bolsa Samaritana	700
ATLAS-CECI-CARE	250
<b>TOTAL</b>	<b>1200</b>

Viviendas Finalizadas: 670.

Viviendas en Construcción: 530.

Las viviendas que construye ATLAS-CECI-CARE, miden 6x6, son de bloque, techo de teja de barro, suelo de concreto de 40 centímetros, puertas y ventanas de madera.

☞ **Metodología de construcción:** Auto – construcción.

### **☞ Predio y Ubicación del Reasentamiento:**

Los 2,100 lotes están siendo donados por la Alcaldía Municipal de Choluteca, todos poseen las mismas dimensiones (10 x 15 mts), su ubicación es variada dentro del terreno.

☞ **Faltante de vivienda:** 900 viviendas.

## **6. REINSERCIÓN SOCIOECONÓMICA**

### **☞ Tipos de empleo:**

La mayoría subsiste a base de una economía informal, constituida por trabajos temporales.

### **☞ Fuentes próximas de empleo identificadas:**

Pesca y recolección de camarones, labores en meloneras, en el área de microempresa, se prevé potencial por parte de la mujer, sobre todo aquellas que tienen experiencia en el área comercial y artesanal, dado el enfoque que está observando por parte de las organizaciones no gubernamentales con proyectos de esta naturaleza.
