

SEPTEMBER 30, 2011

## **INTEGRATED COMMUNITY DEVELOPMENT FUND**

Quarterly Report to USAID/Bolivia  
Integrated Alternative Development Office  
July - September 2011

**Award N°: 511-A-00-05-00153-00**

**Contact information:**

Treena Bishop  
Team Leader, ICDF

Calle 11 # 480  
Esq. Sánchez Bustamante  
Calacoto  
La Paz, Bolivia  
Tel/Fax: (+591) 2 – 2793206  
E-mail: [tbishop@activoca.org.bo](mailto:tbishop@activoca.org.bo)

***Disclaimer***

*This Quarterly Progress Report is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of ACDI/VOCA and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.*

## TABLE OF CONTENTS

<b>I. EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>- 5 -</b>
<b>II. GENERAL INFORMATION .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>III. HIGHLIGHTED ACTIVITIES.....</b>	<b>- 10 -</b>
<b>IV. SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA .....</b>	<b>- 15 -</b>
<b>A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS.....</b>	<b>- 15 -</b>
<b>B. LA ASUNTA .....</b>	<b>- 20 -</b>
<b>C. TRADITIONAL ZONE.....</b>	<b>- 23 -</b>
<b>D. CROSS-CUTTING ACTIVITIES.....</b>	<b>- 27 -</b>
<b>V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS .....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>A. THE ICDF IN NUMBERS.....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>B. PERFORMANCE INDICATORS.....</b>	<b>- 34 -</b>
<b>VI. LOOKING BACK AND FORWARD.....</b>	<b>- 44 -</b>
<b>VII. FINANCIAL INFORMATION.....</b>	<b>- 45 -</b>
<b><i>ANNEX I BUDGET PIPELINE REPORT (EXPRESSED IN US\$ DOLLARS) .....</i></b>	<b><i>1</i></b>
<b><i>ANNEX II PROJECT MATRIX .....</i></b>	<b><i>- 3 -</i></b>

## ACROYNMS AND ABBREVIATIONS

CA	Cooperative Agreement
CAPYS	<i>Comité de Agua Potable y Saneamiento</i> (Potable Water and Sanitation Committee)
CC	Cross Cutting Indicator
CCVV	<i>Caminos Vecinales</i>
CENCAP-CP	<i>Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría General</i>
CT	Technical committee ( <i>Comité Técnico</i> in Spanish)
DRNMA	Department of Natural Resources and Environment
ICDF	Integrated Community Development Fund
IL	Implementation Letter
IR	Intermediate Result
JSI	John Snow International
LOP	Life of Project
M&E	Performance Monitoring and Evaluation
NBI	Unsatisfied Basic Needs Index (NBI in Spanish)
PMP	Performance Monitoring Plan
PSB	Plurinational State of Bolivia
RAI	Industrial Environmental Registry ( <i>Registro Ambiental Industrial</i> in Spanish)
RFRA	Request for Revised Application
SO	Strategic Objective
TC	Tropics of Cochabamba
UAC-CP	<i>Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa</i>
UCB	Catholic University of Bolivia
USAID	United States Agency for International Development
USG	United States Government
VCDI	Vice Ministry for Coca and Integrated Development
YCADF	Yungas Community Alternative Development Fund

## I. EXECUTIVE SUMMARY

This report details key activities carried out by the ICDF during the last quarter of fiscal year 2011. By September 30<sup>th</sup>, the ICDF had a total of 688 subaward projects in its portfolio, 647 of which were concluded. Of the total number of projects, 409 fall under the community development component while the remaining 279 fall under the economic development component. Forty-three projects were completed during the reporting period, leaving 43 projects in implementation. All activities carried out during the reporting period contributed to the ICDF's global objectives by stimulating progress in the areas of economic development, education, potable water and sanitation.

During the reporting period USAID informed ACDI/VOCA that the ICDF would only receive 92 percent of the total budget award due to an overall reduction in Integrated Development (ID) program funding. This resulted in an immediate downsizing of personnel as well as the presentation of a partial termination plan. While the conclusion of all ICDF projects is still foreseen by September 2012, the budget reduction forced the ICDF to curtail activity in 33 potable water, sanitation and education projects, reducing the scope from full implementation to the preparation of final construction design documents. During the reporting period, 28 of these final designs were handed over to the corresponding municipal governments.

The ICDF completed 37 community development projects during the reporting period. It also continued work on three large potable water projects. One is located in the Municipality of La Asunta and will serve the communities of San Jose, Los Olivos and 21 de Agosto. The other two potable water projects will serve the communities of San Miguel de Huachi and Alto Remolinos in the Municipality of Palos Blancos. Work on these projects focused on construction and community development training as well as environmental awareness and protection where important achievements were made in watershed and solid waste management.

Within the same component, construction began on the Sigvani Grande sanitary sewer system located in the Municipality of La Asunta. This project will benefit 180 families who will be able to access the service through household connections. The new system will feature an anaerobic wastewater treatment plant that will help solve a current environmental problem by preventing Sigvani Grande wastewater from contaminating the Boopi River.

The ICDF has also made important progress on projects within its education sub-component. In the Municipality of La Asunta, the ICDF continued work on the construction of twelve classrooms for the René Barrientos Ortuño School. Construction is progressing according to plan and is scheduled to be completed during the following reporting period. The ICDF concluded one multi-grade classroom in the community of Alto Lejna and continued with the construction of three multi-grade classrooms in the communities of Huiri Lanza, Llojeta and Churubamba all within the Municipality of Irupana. Construction of these three classrooms is scheduled for completion in the following quarter.

Another important project within the education sub-component, whose implementation continued throughout the reporting period, involves the construction of 10 classrooms and bathrooms for the San Antonio School in the Municipality of Alto Beni. Activities

for the advancement of this project focused on preparing the worksite terrain, organizing the community construction committee and general training for the community. Training included workshops that focused on environmental protection and solid waste management. A related activity included a litter collection campaign carried out by the school students. The campaign focused on collecting used batteries which were taken to the city of La Paz where they were properly disposed of at waste collection points for household hazardous waste.

During the reporting period significant progress was also made on the *Improving Quality of Family Life through the Kitchen* project in the municipalities of La Asunta, Palos Blancos and Alto Beni. Throughout the quarter a total of 520 ecological Malena stoves were built with the project participants. This brings the total number of stoves built to over 1,000. Related activity included the provision of training for project participants for the preparation of improved clay used to build the stoves, stove maintenance and proper hygiene techniques to be employed during food preparation, also took place.

In the *Zona Tradicional*, within the Municipality of Coroico, the ICDF concluded the San Joaquín potable water system. The system includes 60 household connections and now provides the community with a constant supply of safe drinking water. In the same municipality, the ICDF also finished refurbishment of the roof of the *Unidad Académica Campesina* – Carmen Pampa (UAC-CP) library and multi-purpose room.

As mentioned previously, 28 final construction design projects were completed during the reporting period. Of these, 24 correspond to specific infrastructure projects, while the remaining four are design funds.

These funds encompass an additional 16 designs for construction or refurbishment. All 40 completed final designs have been handed over to the corresponding municipal governments.

As part of this design development process, the ICDF provided technical assistance to municipal personnel in the review of designs. The final designs pertaining to potable water systems were presented by the corresponding municipal governments to the “*Evo Cumple*” program as a potential funding source. Although the ICDF will not be able to actually implement these projects, their final designs will provide an important tool for municipal governments. They will prove especially useful when the municipal governments formulate their annual operating plans (POAs for its acronym in Spanish) as they can only allocate funds to projects that already have final designs.

Of the 43 projects concluded during the reporting period, six fall under the economic development component. Among these, one that is particularly noteworthy for increasing the income of small-holder farmers is the organic amaranth production project. This project provided 229 farmers with assistance in cultivating and harvesting 116 hectares of amaranth. Thanks to improved production, project participants obtained outstanding prices of up to 450 bs (approximately US\$64) per *quintal* (46 kilos) of amaranth from local companies including Coraca Irupana and Bolivia Natural.

In addition to the amaranth project, three projects that provided support for agricultural production and training were concluded. Activities for these projects involved technical assistance in the form of marketing studies as well as other general aspects related to marketing and product sales. To finalize these projects 2,300 manuals for apiculture and

floriculture, as well as for the production of poultry, coffee, plantain and stevia were distributed to all productive-project participants and producer associations supported by the ICDF. Copies were also given to other institutions that work in these productive sectors, as well as to USAID and the Vice Ministry for Coca and Integrated Development (VCDI).

The ICDF also provided important support for micro-enterprise initiatives during the reporting period. One concluded project in this sub-component involved the construction of and provision of equipment for the Anacurí stone-cutting enterprise in the Municipality of Coripata. The ICDF also completed a project involving the expansion of and provision of equipment for the Mama Liu Bakery in the Municipality of Chulumani.

## II. GENERAL INFORMATION

ACDI/VOCA is a private, non-profit international development organization with over 38 consecutive years of experience working in Bolivia, and nearly 50 years implementing multifaceted development activities worldwide. Throughout this period, ACDI/VOCA has demonstrated its strong commitment to providing opportunities and improving the quality of life for the residents of the communities in which it works. Since the start of 2001, ACDI/VOCA has been a key partner of the Plurinational State of Bolivia (PSB) and USAID/Bolivia in its work with communities and municipal governments.

ACDI/VOCA has implemented the ICDF since August 2005, under which it currently manages 688 community and economic development subaward activities. The main goal of the ICDF is to support the joint efforts of the United States Government (USG) and PSB to establish a sustainable economy in Bolivia's coca-producing regions. The strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and economic conditions.

The objectives of the ICDF are to:


1. strengthen social capital and community development through increased access to public goods and services for communities and small-holder farmer organizations
2. increase participation of local leaders, local governments and citizen organizations in community development processes to strengthen ownership, sustainability and support for economic activities
3. improve the welfare of poor rural families in isolated areas, taking into consideration gender and the environment
4. support emergency and immediate-impact activities to mediate conflict, preserve social peace and respond to crises

ACDI/VOCA was awarded the ICDF program by USAID through cooperative agreement (CA) 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005. The original agreement stipulated that the project was to be implemented over a period of five years. Modification No. 7 of the CA called for significant adjustments to be made to the ICDF methodology to more directly support the PSB's coca rationalization policies within the terms outlined by Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also called for a restructuring of the project to include only two components: economic and community development.

Also noteworthy, Modification No. 14 of the CA allocated new resources for immediate impact projects in the Yungas region as a means of addressing urgent needs within the economic and community development components. Subsequently, through Modification No. 15, additional funds were provided to further expand ICDF activity in the Yungas region. Modification No. 15 also called for the CA's extension through September 30, 2010. Through Modification No. 16, the CA was amended to include funds to support new and existing activities and to further extend the life of project (LOP) through December 31, 2010. Via Modification No. 17, the CA was extended once again, this time through September 30, 2012 and additional funds were designated to support new activities designed to help the ICDF achieve its overall objectives. In

accordance with Modification No. 18, ACDIVOCA transferred its productive activities to the USAID-funded Rural Competitiveness Activity (ARCo) in order to make more resources available for community development activities. At the end of the current reporting period, the 19<sup>th</sup> modification of the ICDF's CA, which moderately increased the ICDF's availability of obligated funds, was approved.

Due to budget cuts within the ID program, USAID informed ACDI/VOCA of the need to adjust the ICDF's scope to respond to a significant reduction in the availability of funds for Fiscal Year 2012. Consequently, the ICDF prepared and submitted a partial termination plan. This plan proposed the curtailment of 33 projects, an immediate reduction of staff and the closure of two field offices in October of 2011. At the end of the quarter ACDI/VOCA submitted a revised program description in order to formalize the proposed adjustments. It is expected that USAID will review and approve the revised program description in the coming quarter.

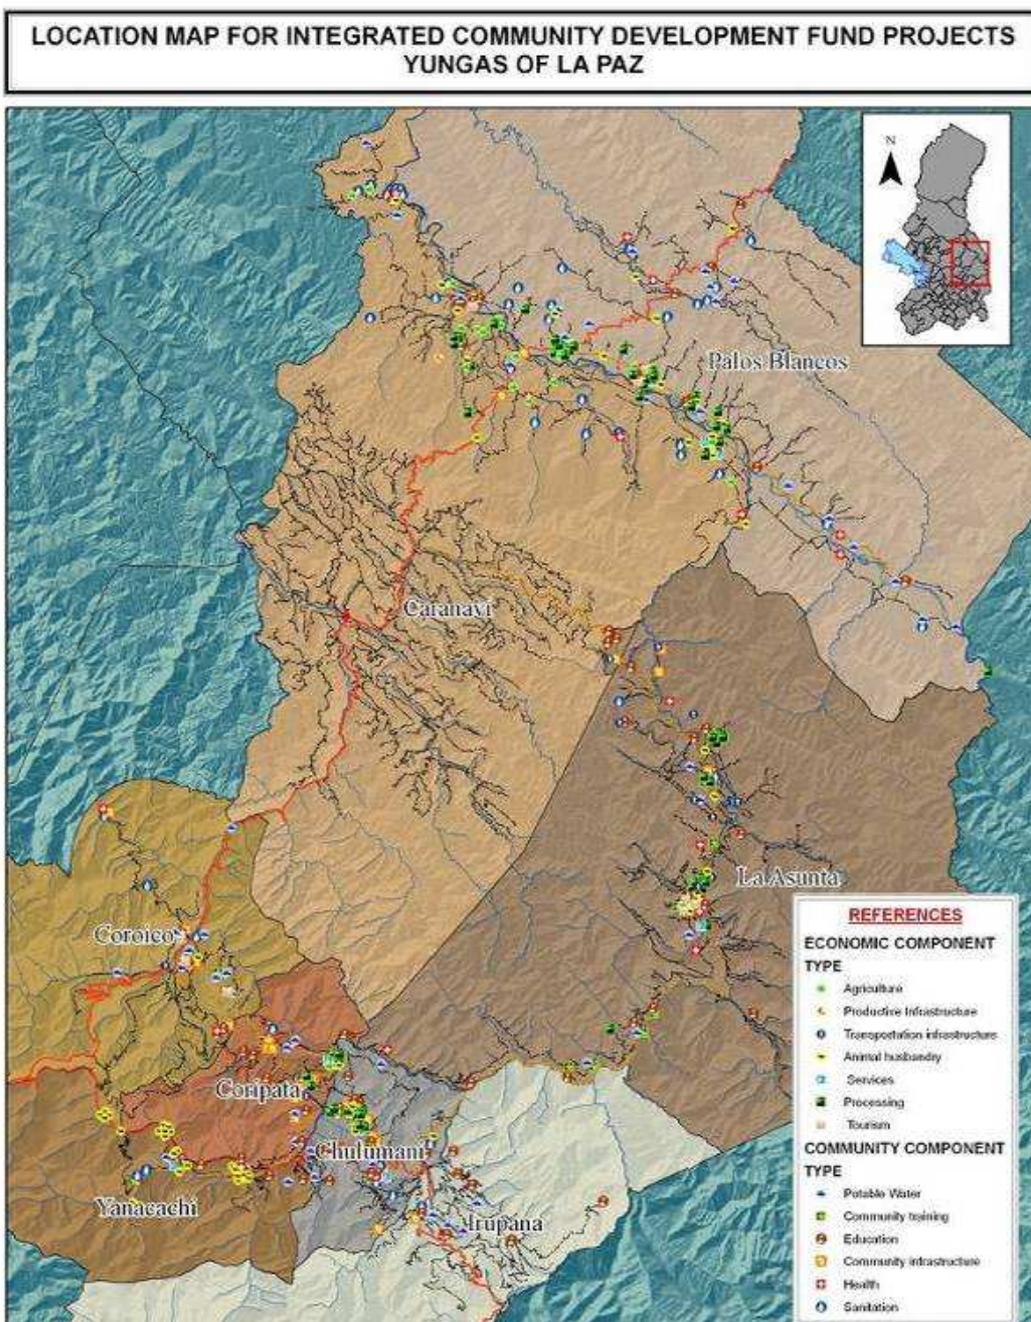

### III. HIGHLIGHTED ACTIVITIES

#### “Improving the Quality of Family Life through the Kitchen”

The ICDF’s overall objective is to improve the quality of life of families living in its project areas. It does so primarily by increasing access to potable water, sanitation, education and health services. Since 2010 the ICDF has implemented the project entitled *Improving Quality of Family Life through the Kitchen* across the Yungas region. Although it is not yet complete, the ICDF has chosen to highlight this project because of its high level of impact both in terms of results and process. By looking at the implementation of this activity through different lenses, we see that it addresses gender by working with both men and women in appropriate ways; it reduces negative environmental impacts including deforestation and generation of carbon dioxide; it improves the health of the whole family through reduction of respiratory and ocular illnesses; and it increases family income through the reduction of time spent collecting



A member of the Moseten community of Inicua Bajo works on her own Malena stove

firewood and cooking, and thus increases the availability of time for other activities. Project activity focuses on isolated communities where families have no access to cooking fuel, such as propane gas, and have no options for food preparation other than cooking over an open fire within or adjacent to their home. The initiative consists primarily of installing ecological Malena stoves. When properly used, these stoves contribute to a reduced risk of respiratory illness by eliminating the smoke caused by cooking over a traditional wood fire.

*"Now this kitchen is all I use to cook ever since they taught me how to use the stove, it is very comfortable. I have already had it for a year....I am no longer bothered by smoke when I cook. I have already become accustomed to this stove, the food stays hot and it requires less wood for fuel since we keep it in an enclosed space. We used to cook out in the open where the temperature would drop faster and it was more dangerous for the children. The children like the kitchen and they always come to have a look, now with the new stove, it is less dangerous for them."*

*Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta*

When cooking over an open fire, family members who are preparing food have to bend over an open flame on the floor or ground. The smoke from the fire poses serious risks to their respiratory health on a daily basis. Women, who in the Yungas region are traditionally in charge of food preparation, run the greatest risk of smoke inhalation. Children, whether playing in the kitchen or being carried on their mothers back are also at an increased risk.



**Introductory meeting being held in a community within the Alto Beni region**

To initiate the project and to gauge the level of interest among potential project participants, the ICDF technical team began by introducing the idea of the Malena stove and its related health benefits at a meeting which was attended by the leaders of several communities. The same information was later provided in meetings held within each individual community. After

learning more about the project, families interested in obtaining Malena stoves attended group training sessions where they learned about the proper methodology for constructing a Malena stove.

Initially the project focused on installing ecological Malena stoves in homes across the Municipality of La Asunta. The first phase involved the construction of 330 Malena stoves and was concluded at the end of 2010. Due to the success of the project's first phase and the subsequent demand for ecological stoves from more communities across the region, a second phase of the project was approved in mid 2011. The second phase, in addition to reaching out to more families in the Municipality of La Asunta, is benefiting families in the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni.

The project's Malena stoves are made from improved clay and are constructed alongside the project participants. Their ecological design includes a chimney and an adjustable grill. While the adjustable grill allows the cook to prepare food comfortably without having to stoop over, the chimney protects family health by ensuring that smoke does not contaminate the inside of the house. In addition to the contribution of

the participating families, the ICDF has received counterpart contribution from the GIZ, (former German Technical Cooperation, GTZ for its acronym in German) throughout the project's implementation. As part of the collaborative effort between these two institutions, the ICDF provides linseed oil for the preparation of the improved clay used for stove construction, while GIZ supplies the chimneys and steel grills.



Mrs. Palmira Ticona with one of her youngest children in the kitchen.

Mrs. Palmira wakes up every day at 4:00 AM and by 4:30 AM she is already in the kitchen. She says that the Malena stove has not only allowed her and her ten children to cook and eat in a smoke-free environment, but that it has also been an important source of income for her family. Every day she cooks for more than 20 workers from the electric company who come and pay for lunch. She is happy in the kitchen: "My stove works well, I use it all day and all afternoon to cook for my family and for others, and the stove cooks food well and does so quickly".

*Palmira Ticona, Cotapata, La Asunta*

In addition to providing labor and raw materials needed to make the clay mix, the project's participating families had to meet certain requirements within the home in order to qualify. Because most families traditionally cook over an open flame, it was a precondition for them to build a modest kitchen, consisting of, at a minimum, a covered cooking environment in order to receive a stove. By protecting the stoves from moisture during the rainy season, they can last up to ten years.



The community of Agua Dulce works together to prepare the clay needed for building Malena stoves, Palos Blancos



All the raw materials needed for the clay are mixed during a demonstration in the community of Israel, La Asunta

The ICDF provides technical assistance during each phase of the project's implementation as a means of ensuring the proper construction, use and maintenance of the stoves. To begin stove construction, the project participants are required to provide the necessary raw materials including clay, fine sand and straw. Once the materials have been provided ICD Ftechnicians demonstrate the correct way to prepare the clay and then proceed to prepare it together with the project participants. The clay then goes through a fermentation process for approximately two weeks after which the stoves are constructed with the families.

During the construction phase, the project participants receive group training and individual technical assistance. During training, they are provided with information regarding the proper use and maintenance of the stoves and information on family nutrition and basic hygiene in the kitchen. After receiving the training, beneficiary families not only know how to properly maintain their stoves, they also have the capacity to construct new ones in case a replacement is needed. ICDF technicians are confident in the success of their training as they have witnessed project participants successfully teaching other community or family members how to build their own ecological stoves.

*"You have to heat the stove up properly when it is newly constructed. Then it becomes as hard as brick and is easy to clean. Other stoves are impossible to wash, I can wash this one with a sponge and it cleans up nicely. We have to be careful with maintenance; that way it can last for ten years. Then we can build another one, I have seen how it is done. It is a lot of work but it can be done. My mother lives in another municipality and now wants the same stove, so we are going to build one for her".*

*Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta*

The GIZ conducts monitoring and technical evaluation through visits to the project sites every 15 days. According to the statistical data collected by their staff, about 80 percent of the project participants are putting the stoves to use. This figure surpasses that of similar projects where use rates are between 60 and 70 percent. The project's current success rate can be attributed to the thorough technical support and knowledge transfer provided by ICDF staff. Project field technicians have been able to verify that the majority of participant families have taken ownership of the project and that, due in large part to their positive attitude and to the quality of training received, the probability for long-term project sustainability is high. Regardless of these positive

results, in order to achieve even higher sustainability rates the ICDF will assign the field technicians the task of determining why 20 percent of participants are not using their stoves and propose solutions when possible.



The traditional way of cooking in the Yungas region



An example of a newly constructed Malena stove


The greatest challenge for the ICDF during the *Improving Quality of Family Life through the Kitchen* project has been to meet the demand for stoves as the number of people interested in the project has far surpassed original projections. During the reporting period, 520 ecological stoves were constructed in the Municipality of La Asunta under this second phase of the project. This brought the total number of stoves constructed in this municipality to 850. At the same time, the ICDF constructed 70 Malena stoves in Palos Blancos and Alto Beni where the project has also been well received. By the end of 2011 the ICDF estimates that 2,000 ecological stoves will have been constructed in the aforementioned municipalities.

## IV. SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA

### A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS

The Alto Beni region includes the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. The latter municipality was formally established in January 2010. The region is well suited for agriculture and can be described as a large valley divided by the Alto Beni River. Although a significant portion of the region's population is of Mosen ethnic origin, the majority of its inhabitants are migrants or the children of migrants from the Altiplano region (specifically from the departments of La Paz, Oruro and Potosí) who arrived in the region between 1952 and 1964.

The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) index for Palos Blancos has declined from 90.5 percent in 2001 to 57.1 percent in 2008. In spite of this, significant increases in the area's population over a short period of time have resulted in the continued high demand for basic services including housing, access to potable water, education and health facilities. It is estimated that more than half of the families in the area still live below the poverty line.

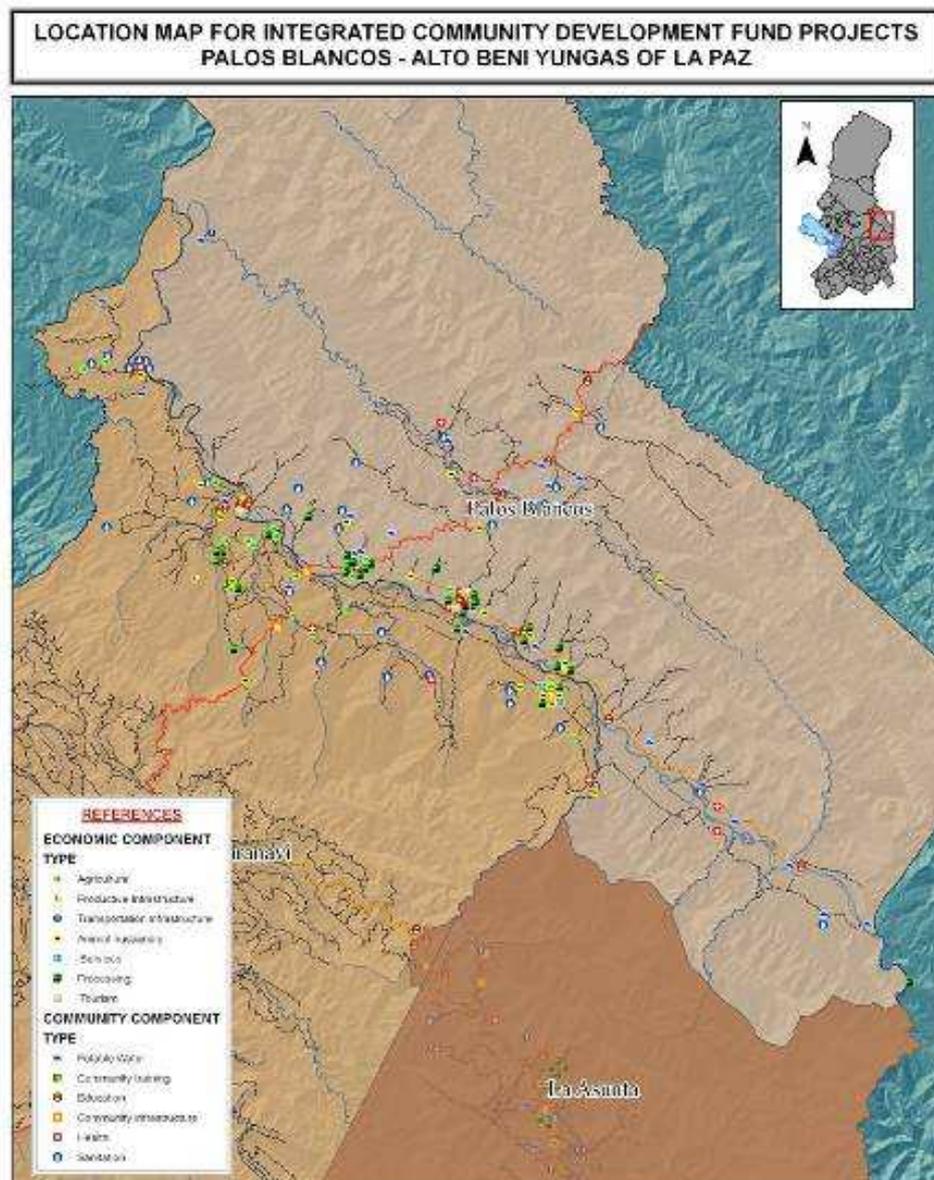

## 1. Completed projects

During the reporting period, the following eight project designs were completed for the municipalities of Alto Beni and Palos Blancos:

- Design of a classroom and teacher housing unit for the Muchane School, Palos Blancos
- A fund established for potable water project final designs for Alto Beni and Palos Blancos.
- Adjustments to the final design of the Brecha I (Luz, Porvenir y Calama) potable water system, Palos Blancos
- Design for refurbishing the Camacho potable water system, Alto Beni
- Design of the Nuevo Amanecer- Altamira potable water system, Alto Beni
- Design of a public bathroom at the main intersection in Sapecho, Palos Blancos
- Design of a public bathroom for the Palos Blancos market
- Design of a public bathroom for the Palos Blancos main plaza

As described in the list above, of the total number of projects concluded during the reporting period in the Palos Blancos/Alto Beni region, three are final construction designs for potable water systems, three are final designs for public bathrooms and one is a design for a school classroom and teacher housing.

One of the projects concluded during the reporting period is listed above as “A fund established for potable water project final designs for Alto Beni and Palos Blancos”. As the name implies, the project involves a specific fund for the design of potable water and sanitation projects for these municipalities. Two final designs for bathrooms for the community of Covendo were prepared under this subaward: one public bathroom for general community use and one for the local school.

In addition to the aforementioned projects, seven other designs have been completed for the region thanks to a separate general design fund. These include four final designs for potable water systems as well as three final designs that fall under the education sub-component. Within this group, one product of note is the final design for a group of classrooms and a teacher housing complex for the Martin Cardenas Vocational Agronomy School in Alto Beni. This school has previously benefited from ICDF support through the construction of a student-housing complex, a laboratory, a library and the provision of corresponding furniture and equipment. Another project that merits special recognition is the completed final design of the student-housing complex for the Agronomy Department of the *Universidad Mayor de San Andres* (UMSA) located in Sapecho within the Municipality of Palos Blancos.

The ICDF’s final designs for public bathrooms are of special interest to the municipal governments of the region. Because the final designs for such projects target areas frequented daily by a high volume of people, they have the potential to provide many families with access to basic sanitary services. When the municipal governments map out their POAs, only projects that have final designs are taken into consideration. In this sense, although the ICDF will not be involved in the construction of these projects, their final designs provide the municipal governments with an important tool for their implementation.

## 2. Summary of Activities by Sub-Component

### a. Potable Water

#### San Miguel de Huachi Potable Water System

During the reporting period the ICDF made significant progress on the San Miguel de Huachi potable water system. The project design consists of two subsystems that will supply the community's more than 1,500 inhabitants with water. During the current reporting period, community members dug pipe trenches as part of their agreed-upon counterpart contribution. In addition to training the community members of San Miguel de Huachi in themes related to the environment, the ICDF helped the community form an environmental committee. The committee's activities involve various environmental aspects of everyday life in the community including waste management and the organization of community members for clean-up activities.

During the previous reporting period, the community of San Miguel de Huachi decided to purchase approximately 100 hectares of land as a means of protecting the watershed that feeds their water supply. The community is currently working on obtaining the title of ownership for the land from the National Institute for Agrarian Reform (INRA for its acronym in Spanish). The community members have already taken certain measures to protect the watershed while they wait for the necessary paperwork to go through. For example, they have placed signs outside the area that read: "Protected Area, No Trespassing". Once all construction activities related to the potable water system are concluded, San Miguel de Huachi's new environmental committee will also organize reforestation activities within the watershed.



Forestry nursery in San Miguel de Huachi

## Alto Remolinos Potable Water System

In May, the ICDF began constructing the Alto Remolinos potable water system in accordance with the project's modified final design. During the reporting period important progress was made including the casting of water storage tanks and laying pipe for the system segments between the source and the storage tank. Once concluded, the system will distribute water to the communities of Alto Remolinos, Remolinos, Palmeras, Magdalena and Olivos. As specified in the project design, approximately 210 household connections will be installed.

In addition to construction activities, ICDF staff members held several meetings with leaders from the different communities. Community development and environmental training activities were also carried out. Training activities took place in all of the communities that will benefit from the potable water system as well as in other communities within the greater district. As a means of training more communities in important themes related to protecting the environment, the "training of trainers" methodology was applied. This involved training representatives from different communities to replicate their new knowledge by training other people from their home communities. The ICDF's community development specialist accompanied these representatives during several of the training sessions they carried out in their home communities.



Students from the Remolinos Elementary School show their drawings

During the reporting period the ICDF carried out other training sessions specifically for elementary school children in the communities of Alto Remolinos and Remolinos. After having taught the children the importance of using water wisely, ICDF staff organized a drawing activity with water as the main theme. Children received school materials as an incentive to participate.

### b. Education

#### Classrooms for the San Antonio School, Alto Beni

Currently the school in the community of San Antonio does not have the space it needs to provide its 220 elementary and middle school students with a quality education. The number of students who want to attend the school is also increasing, which exacerbates the problem. For this reason, the community prioritized the construction of new classrooms for the school. The approved subaward consists of the construction of 10 classrooms and new school bathrooms. In addition to San Antonio, the school also serves the children of five neighboring communities. In this sense the school's benefits will extend beyond San Antonio as families from nearby communities continue to send their children to San Antonio to learn.

During the reporting period, in preparation to begin construction of the new classrooms, the ICDF conducted a community-wide environmental campaign that involved the


participation of the entire student body. In addition to clearing the streets of litter, during the campaign special attention was paid to the collection of used batteries and other potentially hazardous waste; these materials were taken to the city of La Paz for proper disposal.



Students from the San Antonio Middle School participate in a group training session

## B. LA ASUNTA

The Municipality of La Asunta has the highest rate of population growth in the Yungas region with a current population estimated at more than 24,000. The majority of communities in La Asunta are new settlements whose inhabitants migrated from the Altiplano (from the departments of La Paz, Oruro and Potosí). La Asunta's NBI index is the highest of all municipalities in the Yungas region, with 70.7 percent of the population living without access to basic services such as water and sanitation, education and/or health.

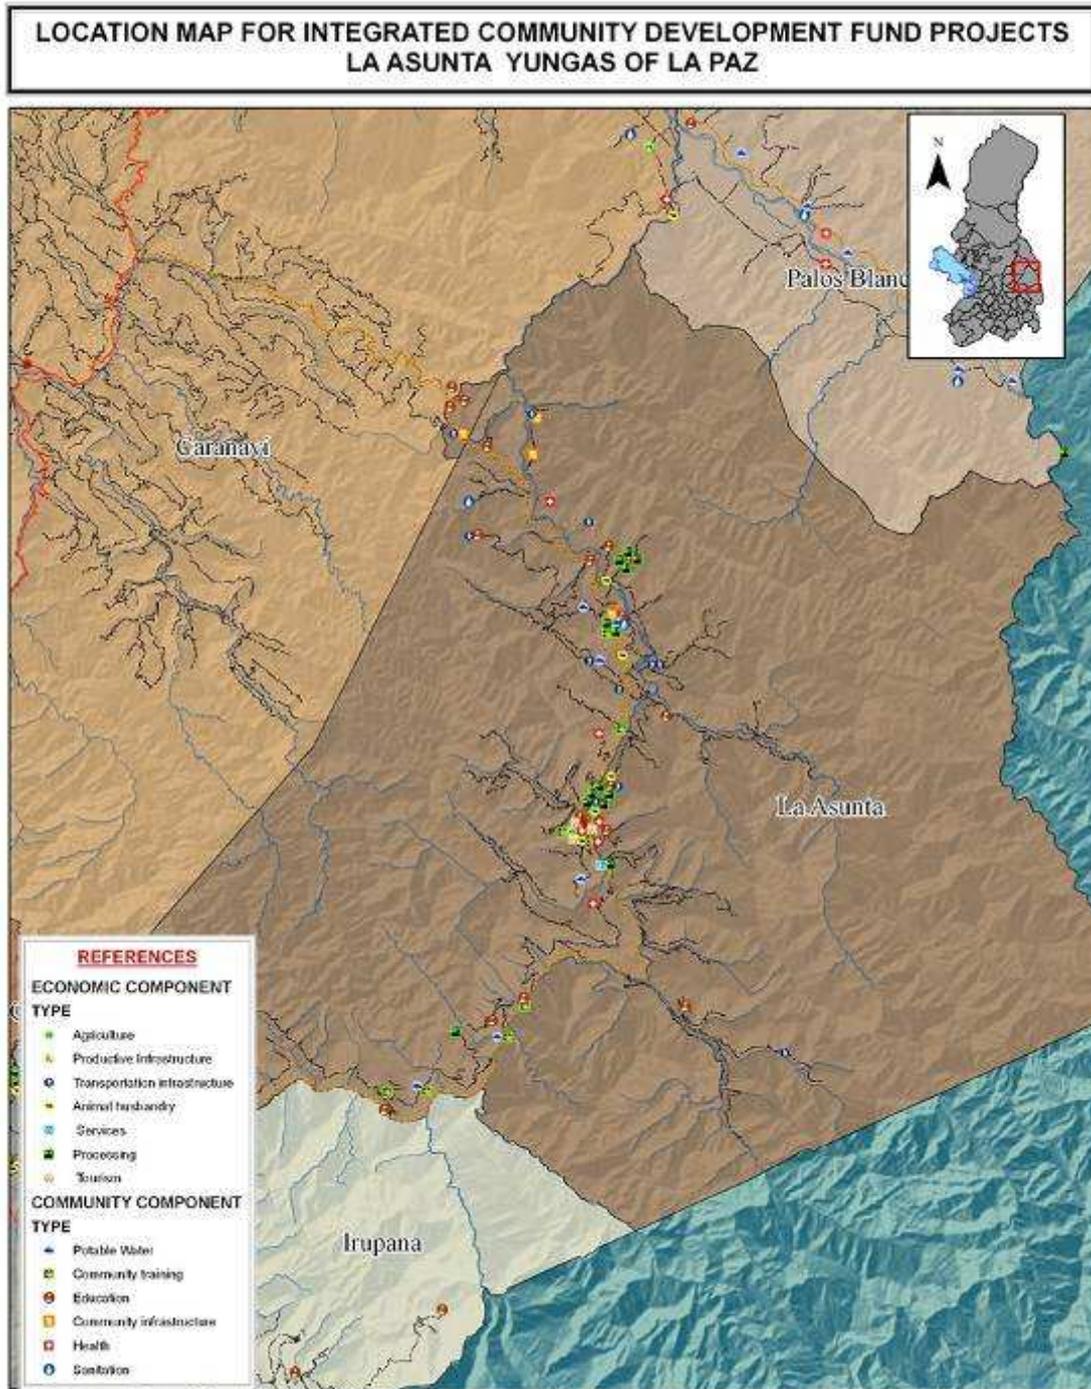

## **1. Completed Projects**

Thirteen projects were concluded for the Municipality of La Asunta. Of these, 12 were final construction designs, none of which was part of the previously mentioned final design fund projects:

- Design of public bathrooms and showers for La Asunta's main plaza
- Design for the refurbishment of the San Fernando School
- Design for the refurbishment of the San Martin School
- Design for the refurbishment of the San Juan Unidos School
- Design for the refurbishment of the Puerto Aroma School
- Design for the refurbishment of the Nueva Unión School
- Design of bathrooms for the Siguani Grande School
- Design of bathrooms for the Santa Rosa de Quinuni School
- Design of bathrooms for the Nueva Potosí School
- Design of bathrooms for the Los Olivos School
- Design of bathrooms for the Pichari School
- Design of a teacher housing unit and bathrooms for the Nuevos Horizontes School
- Technical assistance in marketing for the participants of ICDF productive projects

Home to 13 of the 43 projects concluded during the last quarter of FY 2011, the Municipality of La Asunta saw the greatest amount of ICDF activity during the current reporting period. Twelve final designs completed during the reporting period in this region correspond to the refurbishment of nine schools. Three of these designs pertain to the construction and/or improvement of classrooms and teacher housing while nine correspond to the construction and/or expansion of school bathrooms. These projects, if implemented, are expected to have a significant impact on public health within the school community over the short-term. The last final design is for a public bathroom for the community of Siguani Grande.

## **2. Summary of Activities by Sub-Component: La Asunta**

### **a. Potable Water and Basic Sanitation**

#### **San Jose Potable Water System**

During the reporting period, among other DESCOM activities, the ICDF carried out a base line study for the San Jose potable water system. Prior to ICDF intervention, the municipal government of La Asunta, with counterpart from FONADAL, initiated construction of the system's water intake works. The municipal government had also commenced with the construction of the system's water storage tanks. In September, after the ICDF's initial intervention had been delayed pending changes made to the original project design, the ICDF began work on pipe installation connecting the intake works and water storage tanks. Design changes involved the inclusion of 20 additional families from the community of Villa Camacho who own the land where the water source is located.

During the reporting period, the ICDF carried out several meetings with San Jose's leaders in order to form a construction committee. This committee is involved in the construction of the potable water system and, together with the ICDF team, conducts meetings to inform all participating families as to how and when they will fulfill the portion of their counterpart to be provided through manual labor. The final design for the San Jose potable water system includes more than 300 home connections. Once completed, the system will provide families from the communities of San Jose, Los Olivos, 21 de Agosto and Villa Camacho with a constant supply of clean water.


### **Siguani Grande Sanitary Sewer System**

During the reporting period the ICDF began construction on the Siguani Grande sanitary sewer system. Once completed, the system will have approximately 180 household connections. In the DESCOM area, ICDF project staff organized the community work schedule for counterpart activity. Planned counterpart activities consist mainly in the manual excavation of sewer pipe trenches. In addition to in-kind contributions, the municipal government provided a cash counterpart amounting to 16 percent of the total project cost. During the following quarter the ICDF will provide training in several areas including conflict management and prevention, public health, hygiene, capacity building and sewer system maintenance.

#### **b. Education**

### **Classrooms for the René Barrientos Ortuño School**


During the reporting period the ICDF made important progress on the construction of 12 classrooms for the Rene Barrientos Ortuño School located in La Asunta's town center. Construction is scheduled to be completed in October 2011. Also during the reporting period the ICDF coordinated initial training that will be offered to teachers, parents and students in the areas of maintenance and correct use of the infrastructure.

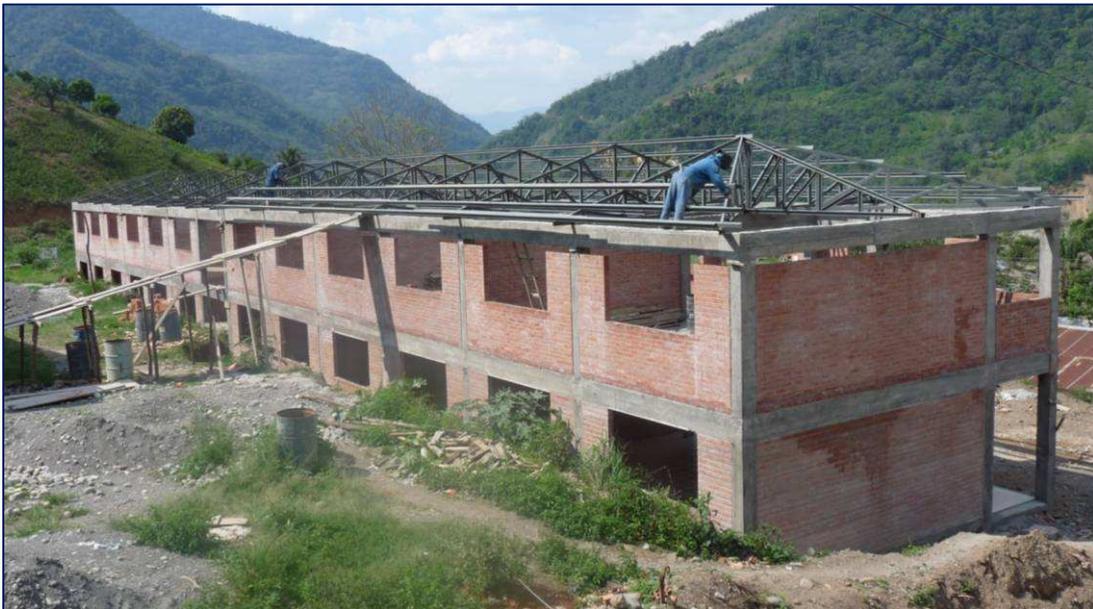

Construction work on the René Barrientos Ortuño School in La Asunta

### C. TRADITIONAL ZONE

The *Zona Tradicional* of the Yungas comprises the municipalities of Coroico, Chulumani, Coripata, Irupana and Yanacachi. Together, these municipalities have an estimated population of more than 56,000. Over the last few years, significant progress has been made in reducing NBI indices in the Traditional Zone. The municipality with the lowest rate is Chulumani, with an NBI of 44 percent, while the regional average in the Traditional Zone is 48 percent. The communities' main needs are in the areas of access to potable water and sanitation, education and health.

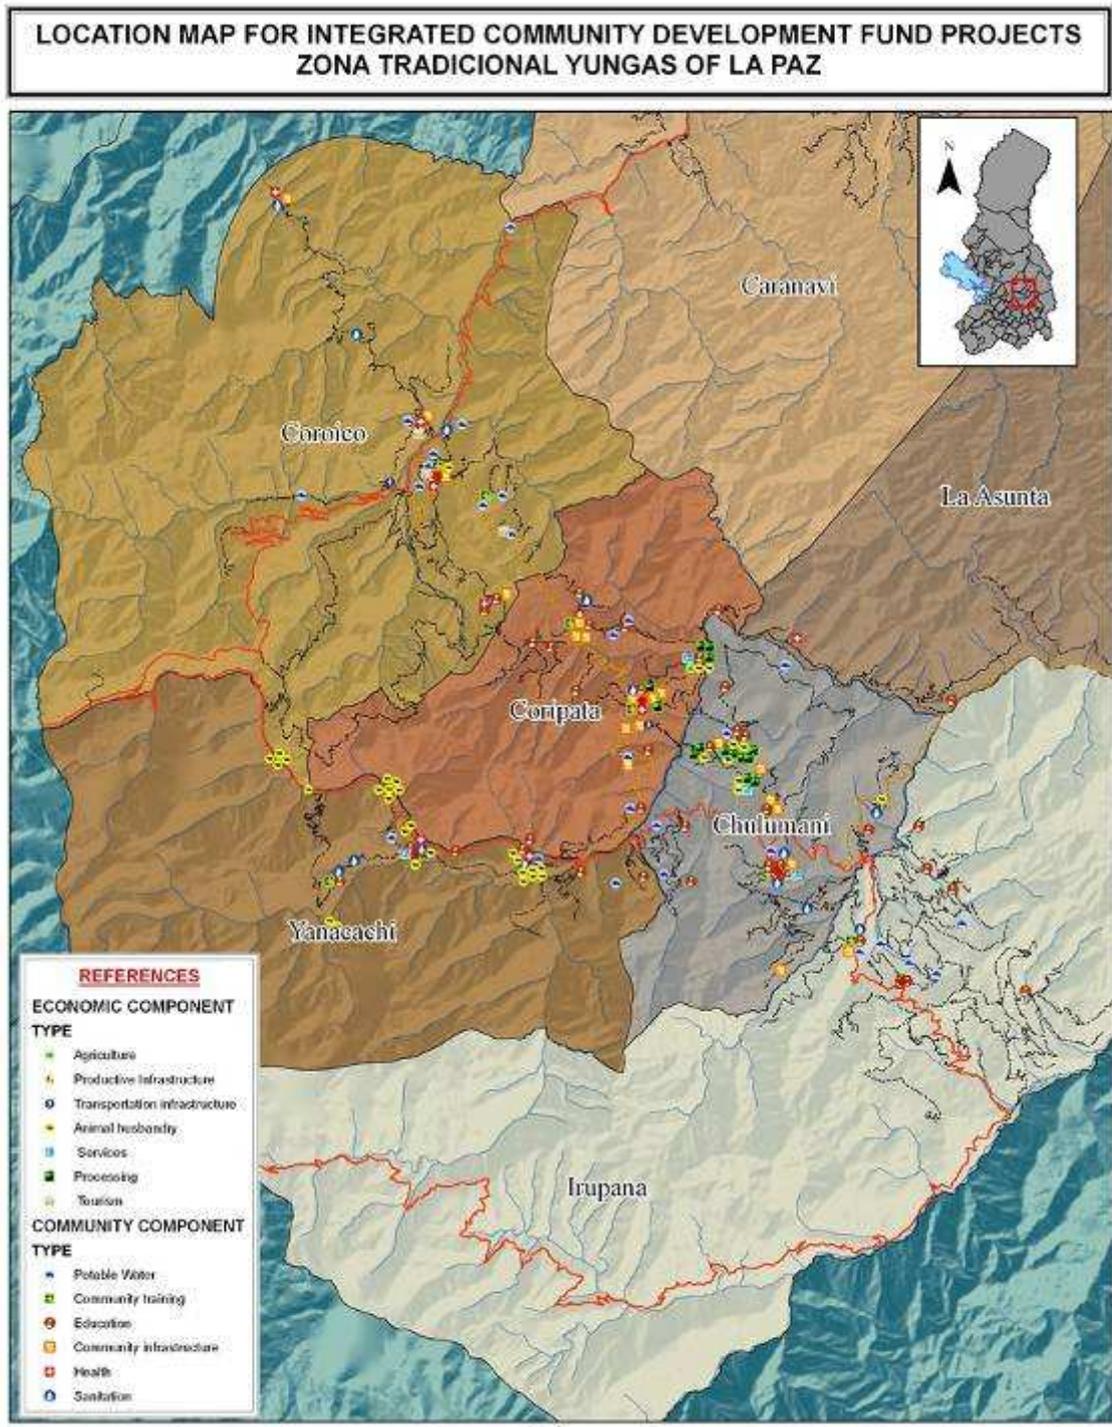

## 1. Completed projects

The following 14 projects were concluded for the Traditional Zone during the current reporting period:

- Support for the Anacurí stone-cutting enterprise, Coripata
- Final design for the Arapata and Coripata potable water system pipeline from source to storage tank (provision of piping and strengthening of the CAPYS)
- Design and construction of the San Joaquín potable water system (Municipality of Coroico)
- Rehabilitation of the Cochuna potable water system, (Municipality of Coroico)
- Design and refurbishment of the UAC-CP library and study hall roof
- Construction of a multi-grade classroom for the Alto Lejna School (Municipality of Irupana)
- Equipment and training for the Mama Lui Bakery (Municipality of Chulumani)
- Support for organic amaranth producers in the Yungas region of La Paz
- Design of a public bathroom to be constructed near the main plaza in Coripata
- Design of public bathrooms to be constructed near the main plaza in Coroico
- Design of public bathrooms to be constructed on Sucre Street in Chulumani
- Design of a public bathroom in the community of Puente Villa, Yanacachi
- A fund established for project designs for the Municipality of Cajuata
- A fund established for project designs for the Zona Tradicional

Of the 14 completed projects for the Traditional Zone, six were concluded in the final design phase. Of these six, two are for the establishment of general project design funds while four were for the design of public bathrooms to be constructed in the populated centers of different municipalities across the region. The projects identified under the two general design funds involve the technical review of the final designs for six potable water projects and subsequent technical assistance in making any necessary adjustments. These six potable water system designs are for the Traditional Zone; three of these being for the Municipality of Cajuata. In their search for financing for project implementation, the corresponding municipal governments have presented the revised final designs of the first three potable water projects to the *Evo Cumple* program.

## 2. Summary of Activities by Sub-Component

### a. Potable Water & Sanitation

#### **San Joaquín Potable Water System (Municipality of Coroico)**

During the reporting period the ICDF completed construction work on the San Joaquín potable water system. The families of San Joaquín played an important role in completing the project through the manual labor they provided as part of their counterpart. The system now provides 60 families with 24-hour access to potable water.

## b. Education

### Construction of Four Multi-Grade Classrooms, Irupana



Multi-grade classroom concluded during the quarter for the community of Alto Lejna, Irupana,

remaining classrooms has been delayed for reasons beyond the control of the contractor. Nevertheless construction of these classrooms is scheduled to be completed during the following reporting period. The municipal government is providing cash counterpart for this project. Furthermore, through the efforts of the Irupana mayor's office, they have ensured that SEDUCA will provide salaries for the teachers who will occupy the new classrooms.

In May, the ICDF initiated construction of four multi-grade classrooms in the communities of San Jose de Llojeta, Churubamba, Alto Lejna and Huirí Lanza. During the reporting period, the Alto Lejna classroom was completed. In addition to benefitting from the new infrastructure, the teacher and 15 elementary school students registered at the school will also have access to school furniture, including tables and chairs, provided by the ICDF.

The conclusion of the three

## c. Economic Development

### Promotion for the Production of Amaranth

During the reporting period the project entitled "Promotion for the Production of Amaranth" was concluded. The first phase of this project began in 2009 with the participation of 190 families in the municipalities of Coroico and Irupana. In 2010 an additional 30 producers from the Municipality of Coripata expressed interest in participating in the project. Due to the additional demand and as a means of consolidating production systems as well as the harvest and post-harvest management of amaranth, the ICDF extended the project into a second phase. The second phase of the project began in 2010 with 220 producers from 18 communities in the municipalities of Irupana, Coroico and Coripata.



Amaranth grains

Participants in the organic amaranth project come from communities that grow the crop on a small scale with the use of traditional production techniques. In this sense the project's participating families all have a high level of cultural familiarity with amaranth and often refer to the crop as *Kullmi*, its ancestral name in the region. Despite their prior experience with the crop,

through training and technical assistance provided by the ICDF, participant families have managed to build on their prior experience with the crop and improve the level and quality of amaranth production on their land.



**Amaranth parcels just before harvest in Vila Vila, Irupana**

project participants the knowledge they need to put the tools and seeds they acquired during the project to the best possible use.

During the reporting period, to bring the project to a close, ICDF staff visited each one of the project participants to offer a last round of technical assistance. In addition to benefiting from personalized visits, all producers attended group-training sessions that were conducted using the farmer field school methodology (ECAs for its acronym in Spanish). Topics covered during these training sessions included post-harvest management, crop

storage, and soil management and land conservation. Such training has given

As a complement to materials and technical assistance received as part of the project, on August 11 producers from Irupana participated in an experiential exchange trip to Cochabamba. The producers were selected based on production output and on their level of participation and commitment to the project. The objective of the trip was for the producers to see different production systems and for them to become familiar with other amaranth varieties that render higher yields. Their trip to Cochabamba included visits to AGRUCO, CIISE and several hectares under production.

ICDF project staff reported that the project's 220 participant families harvested an approximate total of 1,200 kilos per hectare of amaranth from the 116 hectares under cultivation during the reporting period. Although the price of amaranth recently dropped on a global scale, mainly due to an oversupply in India, the price of Bolivian amaranth held steady at \$57.50 to \$64.50 USD per *quintal* (101 lbs). The ICDF expects that all material and technical assistance provided as part of an effort to promote amaranth production will contribute to the project's sustainability by allowing farmers to maintain improved levels of production.



**Amaranth harvest in Coroico**

## D. CROSS-CUTTING ACTIVITIES

### 1. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP)

The UAC-CP is a non-profit university located 111 km northeast of La Paz, in the North Yungas Province of the department of La Paz. The university is located in the community of Carmen Pampa, at a distance of 13 km from Coroico, the capital of the province. It primarily offers higher education to students from the Yungas region and northern areas of the Department of La Paz and to the youth from marginalized areas in the city of La Paz. The UAC-CP was created by an inter-institutional agreement between the Catholic University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the Franciscan Missionary Sisters and the local governing body of the Villa Nilo Sub Central, on October 4, 1993. The institution offers bachelor degrees to a student body of approximately 700 students in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal husbandry and primary education. It also offers an associate degree in tourism. Each program includes academic coursework as well as opportunities for hands-on practice in the respective career tracks.

During the reporting period, with the objective of strengthening UAC-CP administration and management, the ICDF also helped the institution develop its 2011-2016 strategic plan. The ICDF used participatory training methodologies during three capacity-building sessions aimed at key players within the institution's management and administration. During these sessions the ICDF provided the tools necessary for developing a strategic plan. The meetings and workshops involved the participation of key UAC-CP management staff where the objective was to redefine the UAC-CP's mission, vision, institutional policies and strategic objectives for the next five years. During the sessions, goals for the strategic plan were identified as well as indicators that will allow the UAC-CP to measure related progress. The concept of a balance score card was also introduced during these capacity building sessions. Workshop participants were taught how to use the balance score card as a monitoring and evaluation method for following up on progress within the strategic plan.



One of the UAC-C- scholarship students

In addition to providing the institution with assistance on its five-year strategic plan, the ICDF continued to support UAC-CP students this quarter by funding 50 scholarships. During the reporting period an ICDF consultant worked with UAC-CP management on

a marketing plan whose objective is to guarantee the sustainability of the UAC-CP scholarship program. Toward this end the first steps were taken toward fund-raising through cooperative agreements made with businesses and local organizations. The group also worked on a new logo and printed communications material developed as a means of advertising the program. Visits were also made to private companies including SOBOCE, a Bolivian cement company; the *Banco Ganadero* and *Banco Bisa* to talk about the possibility of entering into additional cooperative agreements that would further support the scholarship program. During the following reporting period the ICDF will learn what gains were made from these visits with respect to financial assistance.

## **2. Strengthening of Community Roads**

One project concluded during the reporting period in coordination with the Vice-ministry of Coca and Integrated Development (VCDI) and USAID/Bolivia, involved capacity building for *Caminos Vecinales* (CCVV for its acronym in Spanish). CCVV has worked to build and maintain roads and bridges in the Yungas region and other regions since 1978. The project objective was to strengthen and build CCVV's capacity to implement social infrastructure projects, such as potable water systems, basic sanitation and school infrastructure, in addition to their core capacity of road maintenance and improvements. Through this capacity-building exercise, CCVV will become another option for local governments and external financiers as they seek out entities who can implement community development projects involving the expansion of basic services for communities in the Yungas region.

One of the capacity building activities carried out by the ICDF during the current reporting period involved extending an invitation to CCVV staff to accompany and evaluate ICDF community infrastructure projects. During these visits the ICDF provided CCVV staff with key information in three different areas: construction techniques, administration and in the social aspects of project implementation. During the reporting period the ICDF also worked to synthesize, adjust and update all documentation describing the administrative, technical and social processes involved in implementing each type of project. In addition to providing implementation protocols tailor made for CCVV, the ICDF carried out training workshops related to each area. Other project activities included updating a database reflecting unit prices for construction materials as well as the development of a system for project monitoring and evaluation (PMP).

## **3. Environment**

In order to generate awareness related to solid waste management and complement the Coroico landfill project, the ICDF sponsored an environmental awareness and solid waste collection campaign in the Yungas region of La Paz. The campaign carried out in the Municipality of Coroico entitled "Yo limpio mi Coroico" (I Clean-up my Coroico)" achieved several noteworthy results as evidenced by the visible reduction of trash in and around the town and in the number of municipal government staff members trained in themes related to the environment. The culminating activity closing out the project involved training of health care staff responsible for managing hospital waste generated by health-care facilities in various Yungas municipalities. The ICDF also signed an agreement with Swisscontact to strengthen the municipal administration of the landfill.

## V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS

### A. THE ICDF IN NUMBERS

The ICDF has a total of 688 projects in its project portfolio; 409 of these fall within the community development component, and the remaining 279 fall within the economic development component. Currently, 41 projects are in the implementation phase. Due to budget reductions, two will end in the final design phase. Forty-three (43) projects were concluded during the reporting period bringing the total number of completed projects to 647. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status and component and Table 2 breaks down the ICDF projects by status and region.

**Table 1. Number of projects by implementation status and component**


Project Status	Community Development	Economic Development	Total
Final Design			
Procurement/Acquisitions			
Implementation	35	6	41
Completed	374	273	647
<b>TOTAL</b>	<b>409</b>	<b>279</b>	<b>688</b>

**Table 2. Number of projects by implementation status and region**

Estado del Proyecto	TC	Yungas	Total
Final Design			
Procurement/Acquisitions			
Implementation		41	41
Completed	100	547	647
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>588</b>	<b>688</b>

At the end of the July- September quarter, there were no projects in the design or acquisition phase. Due to severe budget cuts within the IDP, the ICDF prepared and submitted a partial termination plan. This plan proposed the curtailment of 33 projects and recommended that no new projects be added to the ICDF project pipeline unless new resources become available. In order to accommodate the severe reduction in the ICDF budget, the scope of 33 projects originally slated for implementation and construction will be reduced to design only. However, these final designs will be useful tools for the community and municipal governments as the latter needs well-prepared designs to use in the municipal planning and budgeting process.

**Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status**

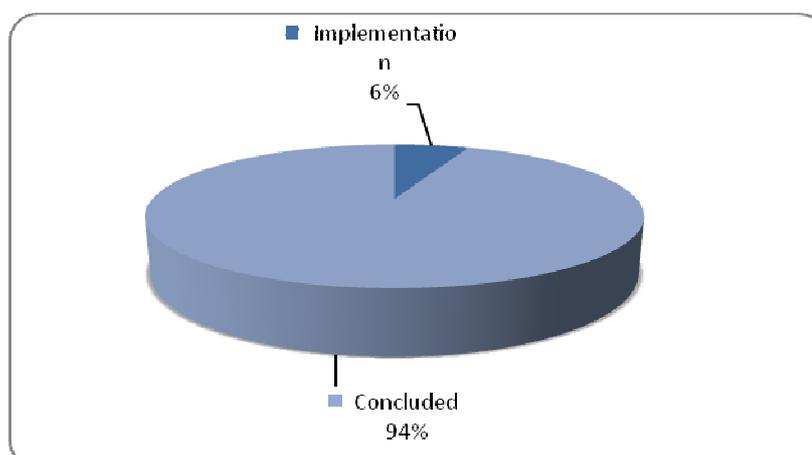

Of the 43 projects completed this quarter, 37 are within the community development component and six within the economic development component. Table 3 lists all projects concluded during this quarter.

**Table 3. Projects concluded during the July - September 2011 Quarter**

MUNICIPALITY	PROJECT	COMPONENT	SUB - COMPONENT
Alto Beni	Final design of the Central Nuevo Amanecer potable water system– Altamira	Community Development	Potable Water
	Refurbishment of the Camacho potable water system	Community Development	Potable Water
Cajuata	Project design fund for the Municipality of Cajuata	Community Development	Potable Water
Chulumani	Final design for the Sucre Street public bathroom	Community Development	Sanitation
	Support for the MAMA-LUI Bakery	Economic Development	Services
Coripata	Final design for a public bathroom near the Coripata town square	Community Development	Sanitation
	Final design for the Arapata potable water system pipeline (source to tank), provision of piping and strengthening of the CAPYS	Community Development	Potable Water
	Support for the Anacurí stone-cutting enterprise	Economic Development	Processing
Coroico	Final design and construction of the San Joaquín potable water system	Community Development	Potable Water
	Refurbishing of the Cochuna potable water system	Community Development	Potable Water
	Design and refurbishment of the UAC-CP roof	Community Development	Education
	Final design of public bathrooms near the town square	Community Development	Sanitation
Irupana	Construction of a multi-grade classroom for the Alto Lejna School	Community Development	Education
La Asunta	Final design for refurbishing the Nueva Unión school	Community Development	Education
	Final design for a teacher housing unit and bathrooms for the Nuevos Horizontes School	Community Development	Education
	Final design for refurbishment of the Puerto Aroma School	Community Development	Education
	Final design for refurbishment of the San Juan Unidos School	Community Development	Education
	Final design for refurbishment of the San Martín School	Community Development	Education
	Final design for refurbishment of the San Fernando School	Community Development	Education
	Final design for bathrooms for the Pichari school	Community Development	Sanitation
	Final design for bathrooms for the Los Olivos School	Community Development	Sanitation
	Final design for bathrooms for Nueva Villa Potosí	Community Development	Sanitation
	Final design for bathrooms for the Santa Rosa de Quinuni School	Community Development	Sanitation
Final design for bathrooms for the Siguaní Grande School	Community Development	Sanitation	

MUNICIPALITY	PROJECT	COMPONENT	SUB - COMPONENT
	Final design for a public bathroom and showers for La Asunta's town plaza	Community Development	Sanitation
	Technical assistance in marketing within ICDF productive initiatives	Economic Development	Productive Trainings
Palos Blancos	Final design fund for Alto Beni - Palos Blancos Potable Water Projects	Community Development	Potable Water
	Final design for the Brecha I (Luz, Porvenir and Calama) potable water system	Community Development	Potable Water
	Final design for a classroom and teacher housing unit for the Muchane School	Community Development	Education
	Final design for a public bathroom for the Palos Blancos main square	Community Development	Sanitation
	Final design for a public bathroom for the Palos Blancos market	Community Development	Sanitation
	Final design for a public bathroom at the principal intersection in Sapecho	Community Development	Sanitation
Yanacachi	Final design for a public bathroom for the community of Puente Villa	Community Development	Sanitation
Varios YUN	Final design fund for Traditional Zone potable water projects	Community Development	Potable Water
	Final design fund for projects	Community Development	Various
	Market studies and training related to pricing and marketing	Economic Development	Productive Trainings
	Young business entrepreneurs	Economic Development	Productive Trainings
	Institutional strengthening of the Vice-ministry of Coca and Integrated Development (VCDI)	Community Development	Institutional Strengthening
	Knowledge transfer for the CCVV	Community Development	Institutional Strengthening
	Institutional strengthening for the VCDI for generating integrated development project proposals	Community Development	Institutional Strengthening
	Final designs for preparatory technical workshops for vocational students	Community Development	Education
	Environmental awareness campaign for solid waste management	Community Development	Environment
	Assistance for producers of high-quality organic amaranth	Economic Development	Agriculture

Chart 2 shows the number of subawards that were added to the ICDF portfolio each quarter since the beginning of the project and the number of subawards completed over the same period. A total of 43 projects were completed during the reporting period. The ICDF portfolio now has 647 concluded projects and 41 active projects in its portfolio; these are scheduled to be completed over the next 12 months.


**Chart 2. Cumulative number of ICDF subaward projects in the portfolio and number of completed projects**


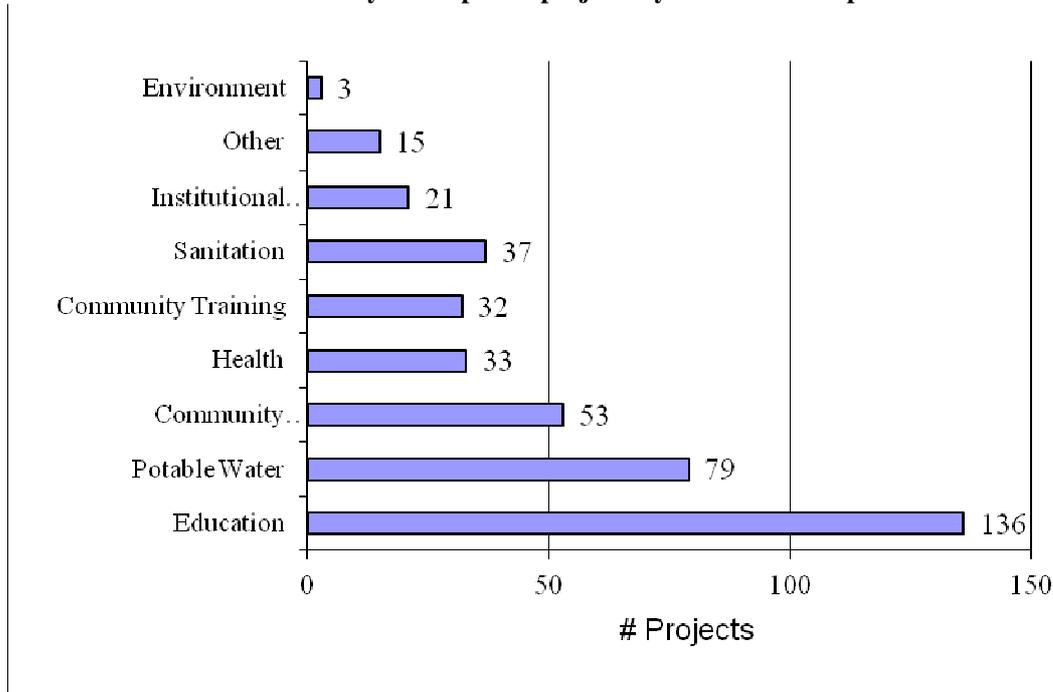
Table 4 shows a breakdown of project distribution by region, municipality and component. The Municipality of La Asunta has the most projects, followed by the Municipality of Palos Blancos. Approximately 10 percent of projects within both the community development and economic development components benefit more than one municipality.

**Table 4. Distribution of projects by region, municipality and component**


Region	Municipality	Community Development	Economic Development	Total	
Yungas	Alto Beni	27	43	70	
	Chulumani	32	16	48	
	Cajuata	1	0	1	
	Coripata	38	15	53	
	Coroico	38	7	45	
	Irupana	21	2	23	
	La Asunta	80	58	138	
	Palos Blancos	61	42	103	
	Yanacachi	22	31	53	
	Various – Yungas	37	17	54	
	<b>Subtotal</b>	<b>357</b>	<b>231</b>	<b>588</b>	
TC	Chimoré	8	6	14	
	Entre Ríos	5	6	11	
	Puerto Villarroel	18	13	31	
	Shinahota	12	10	22	
	Villa Tunari	5	7	12	
	Various – TC	3	6	9	
	Omereque	0	0	0	
	Yapacaní	1	0	1	
		<b>Subtotal</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>100</b>
	<b>Total</b>		<b>409</b>	<b>279</b>	<b>688</b>

Chart 3 shows the breakdown of community development projects by sector. A significant number of these projects fall under the education and potable water sub-components. The increase in the amount of projects in these areas is due to the demand for high-impact activities, such as the provision of infrastructure and/or equipment, as a means of improving access to health, potable water and education. Chart 4 shows the breakdown of economic development projects by sector.

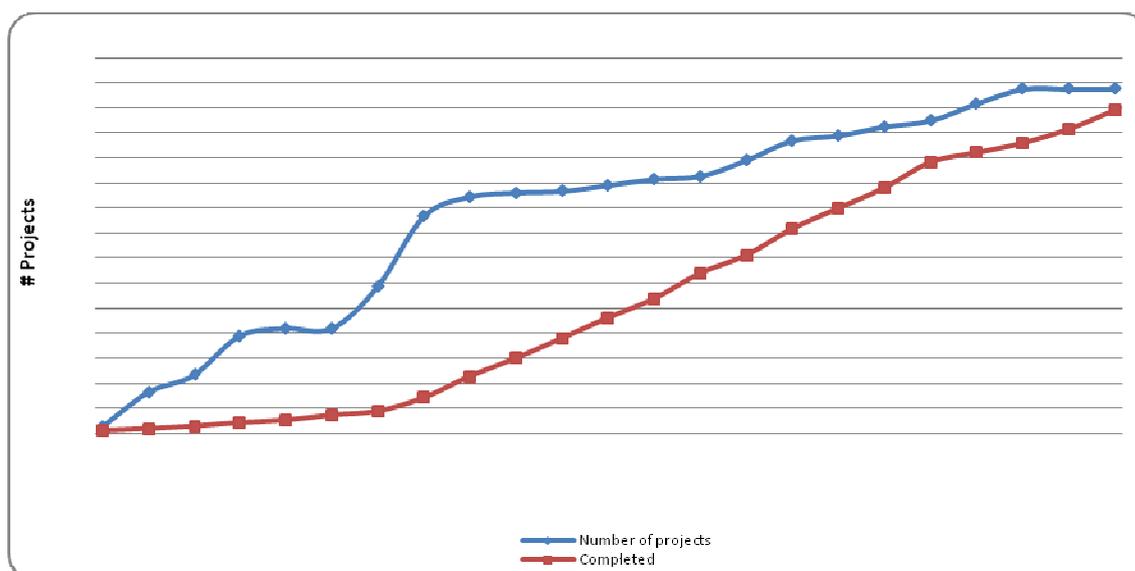**Chart 3 – Number of community development projects by sector sub-component**



**Chart 4 – Number of economic development projects by sector sub-component**

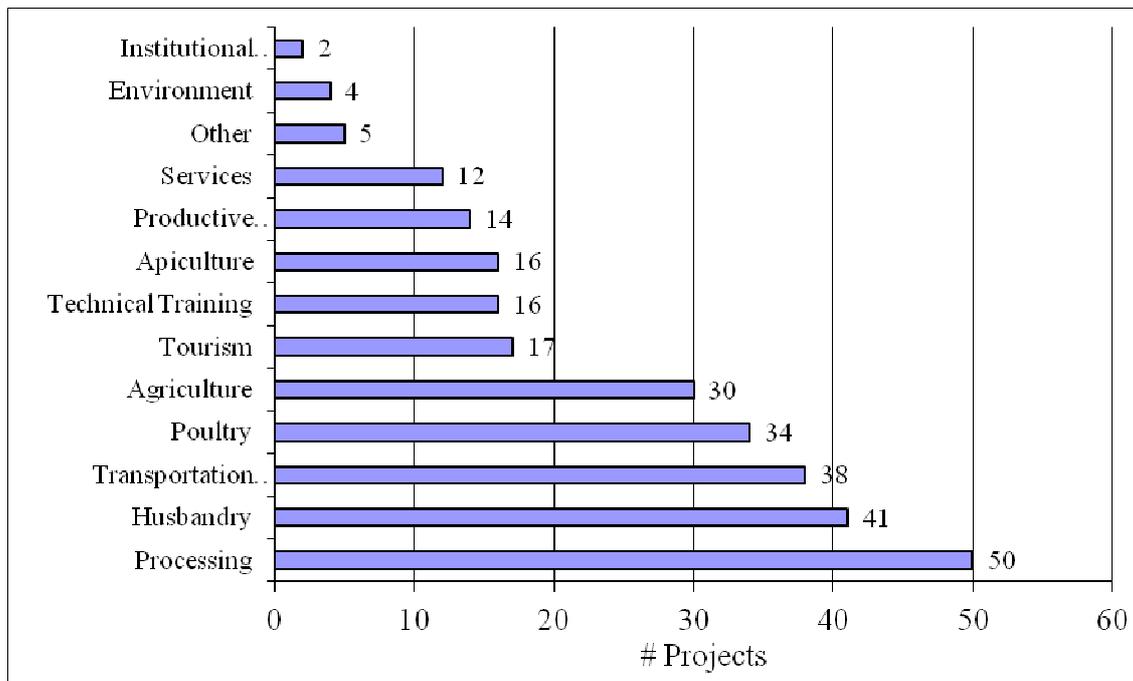

## B. PERFORMANCE INDICATORS

All ICDF activities are divided into two components: economic development and community development. These two programmatic areas support the USG and PSB's policies and provide the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable development in the Yungas and previously in the Tropics of Cochabamba. The table below summarizes the ICDF's performance indicator targets by programmatic component as set out in Modification 18.

**Table 5. ICDF performance indicators and calendar year targets<sup>1</sup>**

Indicator	Unit	Targets									Total LOP	
		06	07	08	09	Adjustment (*)	10 (**)	11 (***)	12 (***)			
<b>Overall Indicators</b>												
SO 1.1	Unsatisfied Basic Needs Index (NBI) – Yungas	Percentage	70%		65%							<b>60%</b>
SO 1.2	Total number of families with increased access to goods and services.	Number of families	3,499	5,000	6,000	5,000	10,587	3,448	3,800	3,922		<b>41,256</b>
<b>Community Development</b>												
IR 1,1	Number of social and productive infrastructure and related works completed	Number of works of infrastructure	13	120	150	130	-35	110	90	98		<b>676</b>
IR 1,2	Number of trainees completing any type of training	Number of trainees	2,582	6,000	5,000	3,500	19,751	3,075	5,399	6,238		<b>51,545</b>
<b>Economic Development</b>												
IR 2,1	Value of incremental sales generated by economic initiatives supported by the ICDF	US\$ thousands			650	1,800	1,032	609	250	50		<b>4,391</b>
IR 2,2	Number of equivalent jobs attributable to ICDF-supported activities	Equivalent jobs	219	1,000	1,500	1,500	-1,260	979	603	887		<b>5,428</b>
IR 2,3	Number of hectares of crops supported by the ICDF	Number of hectares	0	250	1,000	1,500	-1,324	160				<b>1,586</b>
<b>Cross-cutting Indicators</b>												
CC1, 1	Percentage of the total cost of implemented projects covered	Percentage	C 10	10%	10%	10%		10%	10%	10%		<b>10%</b>
			D 20		20%	20%	20%		20%	20%	20%	<b>20%</b>

<sup>1</sup> The reformulated targets were approved via Modification 18

Indicator	Unit	Targets								Total LOP
		06	07	08	09	Adjustment (*)	10 (**)	11 (***)	12 (***)	
CC1.2	Percentage	n/a	95%	95%	95%		95%	95%	95%	<b>95%</b>
Note (*)	This adjustment reconciles the sum of the calendar year targets with the Life of Project targets. In 2009 the Cooperative Agreement was amended and the Life of Project targets were altered, partly in order to reflect the results achieved.									
(**)	The targets for 2010 are consistent with the targets approved in modifications 14, 15 and 16.									
(***)	The targets for 2011 and 2012 are consistent with the targets approved in Modification 17 and 18.									

The main objective of the ICDF is to support the joint PSB-USG efforts to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions by addressing basic human needs, alleviating poverty and by improving social and economic conditions where the demand for doing so is greatest. All ICDF activities are carried out by the implementation of sub-grants for projects identified through participatory methodologies. This objective primarily responds to USAID/Bolivia’s Intermediate Result (IR) 5:

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of Cochabamba and in the Yungas region of La Paz, Bolivia.

Two indicators are used to monitor progress towards this IR: 1) the index of unsatisfied basic needs (NBI in Spanish) and 2) the number of families benefited. Due to the departure of IAD programs from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI indicator in this region, nor does it plan to do so in the future. Also, given that the PSB plans to conduct a national census in 2011 that will again measure the NBI, it was decided that the next NBI indicator measurement will be done by using figures from the upcoming national census. For this reason the NBI indicator was measured on only one occasion during the LOP of the ICDF.

The table below shows the results achieved through September 2011 and the corresponding percentage of progress for each indicator as approved in modification 18.

**Table 6. Summary of results achieved by calendar year (August 2005-September 2011)**

Indicator	Results						LOP		
	Sept 05 – Dec 06	Jan – Dec 2007	Jan – Dec 2008	Jan – dec 2009	Jan - Dec 2010	Jan - Dec 2011	Goal	Total to Date	Percent of Progress
NBI Value				52%			60%	52%	
# of Families	3.499	15.204	7.229	4.161	3.344	2.176	41.256	35.613	86%
# of Infrastructures	14	23	201	141	129	44	676	552	82%
# of Trainees	2.582	21.514	9.249	4.049	3.081	3.671	51.545	44.146	86%
Sales	-	-	902	2.603	589	448	4.391	4.542	103%
# of Jobs	40	94	1.550	1.277	773	560	5.428	4.294	79%
# Hectares	0	0	175	1.256	192	435	1.586	2.058	130%

During the reporting period the ICDF made greatest progress towards the employment, sales and hectare indicators. The ICDF reported results of 116 hectares, 187 equivalent jobs and US\$194,266 in sales. The high rate of success within these indicators is mainly due to the conclusion of the organic amaranth project in the municipalities of Irupana, Coroico and Coripata. Throughout this project the ICDF assisted 220 farmers with the cultivation of 116 hectares of amaranth. The project participants achieved outputs of up to 920 kilos of amaranth per hectare. Thanks to the high quality of their product the farmers obtained prices of up to \$64.50 USD per *quintal* (101 lbs) of amaranth from the local companies Coraca Irupana and Bolivia Natural.

The table below highlights the results obtained for each indicator during the fourth quarter of the 2011 fiscal year. During the last reporting period the ICDF transferred its productive activities to the ARCo project in accordance with Modification 18. In addition to fourth quarter 2011 highlights, the table shows the results and goals for the entire 2011 fiscal year, including results achieved by the ICDF for crops such as stevia, amaranth, coffee and plantain prior to the recent transfer of productive projects to ARCo.

**Table 7. Summary of results achieved to date for fiscal year 2011 and the targets for the quarter covered by this report (July - September 2011)**

Indicator	FY 2011		Percent Progress	4th Quarter FY 2011		1 <sup>st</sup> Quarter FY 2012 Target
	Target	Result		Target	Result	
NBI Rate						
No. of Families	3.474	3.055	88%	1.202	386	1.080
No, infrastructures	76	58	76%	24	7	28
No. of trainees	5.100	4.569	90%	1.654	844	1.637
Value of sales	318	448	141%	168	194	170
No. of jobs	650	757	116%	185	223	233
No. of hectares		435			116	

### SO 1.2 Indicator: Number of Families

**Title of the performance indicator:** Total number of families (and their communities) with increased access to public goods, services or jobs.

**Measurement unit:** Number of families benefited by ICDF supported activities

To date, the total number of families benefited by the ICDF is 35,613. Adjusting for the LOP target approved in Modification 18, this means that 86 percent of the new 41,256 LOP target has been achieved. Once modification 19 is approved, the targets for this indicator will be adjusted downward in order to accommodate the project's reduced scope.

During this reporting period, 5,386 families benefited from ICDF initiatives, mainly from economic development projects. Among these, 220 were producer families that benefited from a project that supported the organic amaranth production chain in Irupana, Coroico and Coripata.

**Table 8. Number of families benefiting from projects completed in the July - September 2011 quarter, by component and municipality**

Municipality	Community Development	Economic Development	Total
Chulumani		1	1
Coripata	13	28	41
Coroico	84		84
Irupana	13	220	233
Varios YUN		27	27
<b>Total general</b>	<b>110</b>	<b>276</b>	<b>386</b>

In the Municipality of Coroico one project worthy of special mention for its level of impact is the San Joaquin potable water system. The system will provide clean water to 60 families through individual household connections. Another noteworthy project was the refurbishment of the roof over the library and multi-purpose room at the *Unidad Académica Campesina-Carmen Pampa* (UAC-CP). Thanks to this project, activities in the library and multi-purpose study room can continue uninterrupted through the rainy season. The refurbishment of the roof has the added benefit of protecting library materials from the elements.

Another project that concluded this quarter was the completion of an upgraded design for the Arapata potable water system as well as the provision of piping for the project's implementation. The new design calls for an expansion of the current potable water system by allowing it to access an additional water source. The system's expansion is expected to vastly improve the distribution of potable water to the growing community of Arapata.

During the reporting period the ICDF also concluded a project for the construction and furnishing of equipment for a stone-cutting enterprise in the community of Anacurí within the Municipality of Coripata. This project will benefit the Anacurí stone-cutters association whose membership is expected to increase to 80 families in the near future. As part of the ICDF's cross-cutting activities, 27 families benefitted from the young entrepreneurs training program. To date, four of the project participants have used their training in the preparation of business plans. By turning these business plans in as their final thesis projects, these young entrepreneurs put the business plans to use towards earning their college degrees.

The following table shows the targets and results achieved for each subcomponent, measuring the families benefited indicator.

**Table 9. Number of families benefiting from projects completed in the July - September 2011 quarter, by component and sub-component**

SUB COMPONENT	July - September 2011			Goal October - December
	Goal	Result	% Progress	
Potable Water	350	75	21%	530
Education/ Health	642	35	5%	300
Other	210	276	131%	250
<b>Total</b>	<b>1.202</b>	<b>386</b>	<b>32%</b>	<b>1.080</b>

During the reporting period, the ICDF surpassed its goal for the number of families that benefitted from the “other projects” indicator. This result is mainly due to the conclusion of the economic development project that provided support for the production of organic amaranth. The project benefitted 220 amaranth-producing families from Irupana, Coroico and Coripata.

The ICDF missed its targets for this indicator within the potable water and education sub-components. This shortcoming resulted from the ICDF’s budget cuts that reduced the scope of ICDF projects within these sub-components. To accommodate the reduction in resources, many projects that were originally planned to run through the implementation phase will now conclude in the final design phase before tangible benefits can be measured at the community level.

### C. Intermediate Result 1

The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1):

**Community development in the Yungas and in the TC is strengthened.**

#### IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects

**Title of the performance indicator:** infrastructures and related projects completed.

**Measurement Unit:** Number of complementary infrastructures and other projects concluded by the ICDF.

During the current reporting period the ICDF concluded seven (7) infrastructure and other related projects. This included completing roof repair at the Unidad *Academica Campesina* – Carmen Pampa (UAC-CP) library and multi-purpose room thereby allowing the studies of the university’s students to proceed uninterrupted through the rainy season. In the Municipality of Coroico the ICDF completed and handed over the San Joaquin potable water system that now provides 60 families with access to clean water. ICDF trainers also assisted in establishing and training the San Joaquin potable water committee. The committee members will be responsible for operating and maintaining the new potable water system.

The ICDF also made significant progress towards finishing several potable water projects in the Traditional Zone. For example, the ICDF provided piping and other materials to the community of Cochuna for the rehabilitation of their potable water

system. Similarly, the piping required for implementing the final design for an upgraded potable water system was delivered to the community of Arapata.

Within the education sub-component, during the reporting period the ICDF concluded the construction of a multi-grade classroom in Alto Lejna in the Municipality of Irupana. With the new infrastructure, the Alto Lejna School can now offer a learning environment with proper light, adequate space and ventilation for its students in grades one through five. The ICDF also furnished tables and chairs for the newly-constructed classroom. Currently there are 15 students registered at the school who will make use of the new classroom. The new infrastructure has given these students a chance to receive a proper elementary school education by providing them with a learning environment that will allow them to excel academically.

Projects involving the construction of bathrooms and the refurbishment of schools within the municipalities of Alto Beni, Palos Blancos, La Asunta and the Traditional Zone are among those that were curtailed as a result of budget cuts. Due to this reduction in the scope of ICDF activity, the targets for this indicator established in Modification 18 were not met. The following chart summarized the results achieved during the reporting period:

**Table 10. Number of infrastructures and related projects completed in the July - September 2011 quarter, by component and municipality**

Municipality	Community Development	Economic Development	TOTAL
Chulumani		1	1
Coripata	1	1	2
Coroico	3		3
Irupana	1		1
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>

Eighty two (82) percent of the adjusted LOP target for this performance indicator as approved in Modification 18 has been achieved with 552 concluded infrastructures and related projects.

**RI 1.2 Indicator: Trainees**

**Title of the performance indicator:** People who received training within the framework of ICDF activity.

**Unit of Measure:** Number of trainees

The ICDF considers training to be the most important pillar in the implementation of its projects. Training is given an equal level of importance in both the community and economic development components. For community development projects, where basic infrastructures are concerned, local capacity is generated in the areas of administration, operation and maintenance. For projects within the economic development component training involves the transfer of technology to farmers and entrepreneurs. In both cases training empowers project participants by giving them confidence during important decision-making processes and is thus paramount to project sustainability.

An example of the benefits of thorough training can be seen in the community of Covendo in the Municipality of Palos Blancos. In 2008, the ICDF implemented a potable water system for the community that benefited 89 families through household

connections. Unfortunately, during the last rainy season, part of the system's piping network was destroyed due to a mudslide. The mudslide resulted in the destruction of nearly 200 meters of piping and other system accessories located between the source and water storage tank. Some pieces of pipe were buried deep into the mud on the eroded hillside, while others were dragged by the landslide all the way to the river at the bottom of the slope.

After assessing the extent of the damage, the president of the potable water committee in Covendo demonstrated an impressive level of capacity through his leadership and informed decision making. He began by convening a meeting where community members determined that each water system user would provide two days of labor to help recover piping material that had been scattered and lost during the landslide. Each community member honored their commitments and dedicated the allotted time to retrieving parts of the water system that were buried in the mud and even submerged in the river. The committee also accumulated the equivalent of \$934.00 USD in Bolivian pesos from the community in the form of cash contributions. This fund was used to replace materials that could not be recovered or that were too deteriorated to be reinstalled.

The potable water committee was able to organize the entire community to accomplish the task of repairing the system without the need for outside assistance. After 35 days of community effort that was guided and supervised by the Covendo water committee, the people of Covendo were able to restore their potable water system to full functionality. It is thanks to the problem solving skills provided through ICDF training offered during the system's construction in 2008 and to the quick thinking of the committee leadership that water is once again flowing normally to the homes of the community members of Covendo.

As an aspect of project of implementation that has proven fundamental for sustainability, the ICDF continues with the important work of training and capacity-building of its project participants. During the reporting period, the ICDF registered 844 trainees who took part in various training events offered as part of project implementation. Within its community development component, the ICDF trained 410 individuals while 434 people were trained within the economic development component.

Among the training activities carried out during the reporting period, those that stand out in particular were conducted during the "I Clean-up my Coroico" environmental awareness campaign carried out in the Municipality of Coroico. The campaign targeted solid waste management awareness and benefitted from the participation of a cross-section of people and entrepreneurs from different demographics and business sectors. Participants included sales women, transport workers, teachers, students and hotel owners among others. In addition to organizing similar campaigns outside of the town center, the campaign participants promoted a positive attitude with regard to trash management in the municipality. Similar activities were undertaken in the municipalities of Coripata, Chulumani and Irupana.

A related activity that deserves recognition is the training offered to amaranth producers from the Municipality of Irupana by using the farmer field school methodology (ECA for its acronym in Spanish). The training was provided to a select group of farmers who demonstrated their commitment to improving their livelihoods through amaranth

production. The ICDF used the field schools as a platform to train 220 such farmers in cultivation, crop care and harvesting techniques. During this project the ECAs once again proved to be a useful teaching mechanism that yields tangible results. By helping farmers produce high quality amaranth, ICDF training helped them to obtain the highest market price for their product.

Due to a reduction in the scope of the ICDF, the scope of many projects will be reduced from full implementation to just the preparation of a final design document. As part of the reduction in scope, training activities will be minimized or eliminated, as well. For this reason, the ICDF anticipates a commensurate decrease in the targets for this indicator. Throughout the LOP the ICDF has registered a total of 44,146 trainees. This figure indicates that, to date, the ICDF has reached 86 percent of the goal for this indicator as outlined in Modification 18.

## **b. Intermediate Result 2**

The ICDF's intermediate result 2 (IR.2):

**Economic Development is encouraged in the TC and the Yungas of La Paz**

### **IR 2.1 Indicator: Incremental sales**

**Title of the performance indicator:** Increases in sales generated by economic initiatives supported by the ICDF.

**Unit of Measure:** U.S. Dollars x 1,000

Between July and September of 2011, the ICDF verified the incremental sales generated by the amaranth production project within its agriculture sub-component. The project benefitted amaranth producers from the Municipality of Irupana who, thanks to ICDF support, obtained a productive output of up to 1,200 kilos per hectare. The project participants sold their product to the local companies Coraca Irupana and Bolivia Natural for 450 Bs. per *quintal* (46 kilos). The resulting sales amounted to more than US \$194,000.

### **IR 2.2 Indicator: Equivalent Employment**

**Title of the performance indicator:** Equivalent employment directly attributable to initiatives supported by the ICDF.

**Unit of Measure:** Equivalent employment

During the reporting period the ICDF recorded the creation of 223 equivalent jobs. The project that provided support for organic amaranth production generated a significant portion of the results for this indicator. Throughout the amaranth project a total of 187 equivalent jobs were created. This number of jobs was calculated based on the time dedicated by each producer in relation to the area under cultivation as well as by the amount of work days dedicated to amaranth production activities.

Other equivalent jobs resulted from the implementation of potable water projects, mainly in the municipalities of Coripata and Coroico. During the reporting period the ICDF generated 175 equivalent jobs as shown in the following table:

**Table 11. Creation of equivalent jobs by component and sub-component, July - September 2011**

Component	Subcomponent	Number of equivalent jobs
Community Development	Potable Water	21
	Education	6
<b>Total Community Development</b>		<b>27</b>
Economic Development	Agriculture	187
	Services	2
	Processing	7
<b>Total Economic Development</b>		<b>196</b>
<b>Total general</b>		<b>223</b>

### **IR 2.3 Indicator: Number of Hectares of Agricultural Crops**

**Title of the performance indicator:** Hectares of alternative crops or hectares under forest management plans targeted by IAD programs.

**Unit of Measure:** Hectares

The ICDF did not anticipate reporting new values for the hectares indicator as per the proposal outlined in Modification 18 which called for the transfer of productive activities to the ARCo project. Nevertheless, given that the implementation of the stevia, plantain, horticulture and amaranth projects were implemented before the transfer process, the ICDF considers it appropriate to report on the achieved results.

For the current quarter the ICDF reported 116 hectares of amaranth cultivated by 220 farmers from the Municipality of Irupana who participated in the amaranth production project. These hectares were established prior to the process of transferring productive projects to ARCo. The ICDF then properly closed-out the projects by conducting corresponding follow up work in marketing and sales, which led to project participants being able to sell their product to the local companies Coraca Irupana and Bolivia Natural.

The amaranth project was the final activity for which the ICDF will report hectares cultivated under ICDF initiatives. The final figure for this indicator is 2,058 hectares and corresponds to the cultivation of different crops in the TC (until 2009) and the YLP. This figure is equivalent to 130 percent of the original target established for the LOP. The overall number of hectares established exceeded initial estimates as a result of support provided for nine crops in particular, such as stevia, plantain and amaranth in the Yungas that contributed to the outstanding results that were achieved for this indicator.

#### **c. Cross-Cutting Indicators**

The ICDF implements projects where measurable progress contributes to both IRs. These results are reported on through the filter of two transversal indicators: counterpart

and to projects that are working well after one year. In accordance with the ICDF PMP, counterpart is measured annually; as such this indicator was reported on in the January-March reporting period. With regard to the projects that are working well after one year of implementation, during the reporting period field visits were conducted to monitor the progress of 36 projects.

During field visits ICDF staff members verified that all 36 projects are operating under normal conditions and are functioning well. Where community development projects are concerned, the project participants are making use of any infrastructure constructed and of any equipment and materials provided by the ICDF. Project participants are also taking the necessary measures to care for the infrastructures received as part of ICDF initiatives. For example, where basic services are involved, ICDF-supported organizations or committees are using economic revenue obtained from service charges towards maintenance and repair.

The ICDF contributes the success of such projects to the capacity building offered throughout the implementation process. This is especially the case for specialized training offered to project participants selected to occupy positions for the administration, operation and maintenance of ICDF-constructed infrastructures. Whether such project participants hold positions on CAPYSs or school boards that were formed or strengthened by the ICDF, their sense of ownership over new infrastructures and their commitment to progress offers a high probability for the long-term sustainability of young ICDF projects.

## **VI. LOOKING BACK AND FORWARD**

In this quarterly report, the following subawards were reported as concluded on schedule:

- San Joaquin Potable Water System, Coroico
- Final designs of school bathrooms and public bathrooms for different municipalities.
- The conclusion of one of the four multi-grade classrooms in Irupana, Alto Lejna.

In accordance with the previously proposed timetable, the ICDF began construction on the Alto Remolinos potable water system in the Municipality of Palos Blancos. Construction also began on the construction of classrooms for the San Antonio School in the same municipality. Construction was delayed on three of the four multi-grade classrooms in Irupana due to reasons beyond the control of the contractor.

Next quarter, the ICDF plans to conclude the following projects:

- Three multi-grade classrooms for the municipality of Irupana, in the communities of Llojeta, Churubamba and Huirí Lanza. The three infrastructures are in the final phase of construction; the project will be handed over once the furniture that has been ordered for the classrooms is ready and has been delivered. The target date for project hand over is the last week of October. Together the three schools will benefit approximately 70 students from the Municipality of Irupana.
- Twelve classrooms for the René Barrientos Ortuño School in the town of La Asunta. This project is 80% complete. Construction is scheduled for conclusion by mid November; the provision of school furniture and equipment is also scheduled for this time. The project will directly benefit 220 students.
- A public bathroom in the Churiaca neighborhood in the municipality of Irupana. This project is 70% complete. Activities involving community organization as well as training in hygiene and sanitary education are underway as is the formation of the community potable water and sanitation committee who will be responsible for administration, operation and maintenance of the bathroom once construction is finished.

In November 2011 the ICDF will proceed with delivery of much-needed furniture for schools throughout the municipalities of Alto Beni, Coripata, Coroico, Chulumani, Irupana, Palos Blancos, Yanacachi and La Asunta. More than 9,000 pieces of school furniture, including chairs, tables, bench seats, desks, tripods and shelves among others, will be provided.

To date, 10 of the 15 child playgrounds designed by the ICDF have been concluded in the municipalities of Chulumani, Coroico, Coripata, Irupana and La Asunta. During the following quarter the parks being constructed in the Municipality of La Asunta and in municipalities within the Traditional Zone are scheduled for completion.

ANNEXES

ANNEX II. Project Matrix

**ANNEX II Project Matrix**

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
1	YC0008A	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Alto Beni	Boopi Sararia	Implementación de UHF's (201 UHF's)	CONCLUIDO	458.700
2	YC0134	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Ampliación Colegio Martín Cárdenas	CONCLUIDO	182.403
3	YC0146	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Conclusión sede social Piquendo	CONCLUIDO	22.491
4	YC0152	Economico	Fortalecimiento institucional	Yungas	Alto Beni	Nueva Kollasuyo, San Antonio, Sararia	Reforzamiento al Funcionamiento del Modelo de Gestión y Productivo de los Internados de San Antonio, Sararia y Nueva Kollasuyo	CONCLUIDO	17.930
5	YC0670	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Varios	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Alto Beni	EJECUCION	30.000
6	YC0695	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Varios	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Alto Beni	EJECUCION	54.000
7	YC0703	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Construcción de aulas y batería de baños del Colegio Técnico Humanístico Agroforestal San Antonio.	EJECUCION	180.700
8	YC0715	Comunitario	Agua potable	Yungas	Alto Beni	Union Camacho	Refacción sistema de agua potable Camacho	CONCLUIDO	36.855
9	YC0717	Comunitario	Agua potable	Yungas	Alto Beni	Varios	Construcción del SAP de la Central Nuevo Amanecer - Altamira	CONCLUIDO	225.000
10	YE0012A	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Sector Yolosa - Caranavi	Apoyo a Actividades de Rescate (Municipio)	CONCLUIDO	557
11	YE0012B	Comunitario	Otros	Yungas	Alto Beni	Sector Yolosa - Caranavi	Apoyo a Actividades de Rescate (FEJUVE)	CONCLUIDO	10.842
12	YE0021	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Cont. bloque de talleres UE Martín Cárdenas	CONCLUIDO	45.454
13	YE0081	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Villa Unificada	Const. aulas, viviendas y bat. baños	CONCLUIDO	52.446

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
14	YE0157	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Santa Rosa	Transformación y comer. Curcuma	CONCLUIDO	6.095
15	YE0158	Economico	Agricola	Yungas	Alto Beni	Piquendo, Bella Vista	Producción y comercialización de frejol negro	CONCLUIDO	8.929
16	YE0231	Economico	Apicola	Yungas	Alto Beni	Bella Vista	Apicultura "APAAB"	CONCLUIDO	9.403
17	YE0234	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Colonia Belén	Elaboración y Comercialización de derivados Citricolas "ASOPROCID"	CONCLUIDO	47.000
18	YE0235	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Bella Vista	Planta Procesadora de Derivados Lácteos "APROLAB"	CONCLUIDO	24.000
19	YE0237	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Crianza de Ovinos de Pelo	CONCLUIDO	9.352
20	YE0238	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Illimani - San Antonio	Pollos Parrilleros Illimani San Antonio	CONCLUIDO	23.067
21	YE0240	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Colonia Ingavi Cobija - Santa Rosa	Elaboración de Derivados Lácteos "TICOLAC"	CONCLUIDO	24.946
22	YE0242	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Apóstol Santiago - Sapecho	Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL SANTIAGO"	CONCLUIDO	18.773
23	YE0249	Economico	Servicios	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Implementación de Microempresa Metalmecánica	CONCLUIDO	10.661
24	YE0250	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia La Forestal - Bella Vista	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "INGAVI - COBIJA"	CONCLUIDO	12.031
25	YE0251	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Ingavi Cobija - Santa Rosa	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "LA FORESTAL"	CONCLUIDO	12.031
26	YE0255	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA NINA"	CONCLUIDO	2.000
27	YE0256	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Santa Rosa	Comercialización de Carne y Piel de Cuye	CONCLUIDO	1.571
28	YE0257	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Los Tigres	Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El Pahuichi - "CEINAP"	CONCLUIDO	18.432
29	YE0260	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Illimani	Porcinocultura - "FLORES"	CONCLUIDO	2.000
30	YE0265	Economico	Servicios	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Materiales Didácticos - "JULI"	CONCLUIDO	8.773

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
31	YE0269	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Villa El Porvenir	Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP"	CONCLUIDO	8.000
32	YE0270	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Espontánea Illimani	Implementación de una Planta Procesadora de Alimentos Km. 52	CONCLUIDO	9.000
33	YE0272	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Espontánea San Antonio de Boopi	Producción de Huevos - "SAN ANTONIO"	CONCLUIDO	4.000
34	YE0275	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Carpintería Industrial "Callisaya"	CONCLUIDO	15.100
35	YE0276	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Carpintería Industrial "Ramos"	CONCLUIDO	15.100
36	YE0277	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Suapi Km73	Agropecuaria "Martin Cardenas"	CONCLUIDO	5.000
37	YE0280	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO"	CONCLUIDO	18.000
38	YE0283	Economico	Pecuario	Yungas	Alto Beni	Colonia Villa Prado - Pista Soapi	Agropecuaria "ALBORTA"	CONCLUIDO	18.000
39	YE0424	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Santa Elena	Provision de motodeshierbadoras	CONCLUIDO	4.588
40	YR0016	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Varias	Megaproyecto Agua Potable (Fase II)	CONCLUIDO	447.277
41	YR0062	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Km 73 - Poblacion Suapi	Const. Unidad Educativa Palmar Suapi	CONCLUIDO	52.488
42	YR0063	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Sararia - Area Urbana	Construcción complejo educativo Sararia	CONCLUIDO	169.983
43	YR0064	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Sararia - Area Urbana	Construcción centro de salud	CONCLUIDO	50.442
44	YR0065	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Puente Alto Beni	Construcción de sala de reuniones	CONCLUIDO	36.023
45	YR0066	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Mercedes	Construcción posta sanitaria	CONCLUIDO	48.023
46	YR0067	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Kollasuyo	Conclusión posta sanitaria	CONCLUIDO	2.164
47	YR0068	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Alto Beni	Central San Antonio	Sala de reunión central San Antonio	CONCLUIDO	80.731
48	YR0075	Comunitario	Educación	Yungas	Alto Beni	Belen	Diseño: Construcción escuela y batería de baños	CONCLUIDO	119
49	YR0080	Comunitario	Salud	Yungas	Alto Beni	Puerto Carmen	Equipamiento mini hospital	CONCLUIDO	24.700

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
50	YR0093	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Brecha T	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	57.755
51	YR0094	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	San Luis 2da.	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	88.428
52	YR0095	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Nueva California	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	29.442
53	YR0096	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Alto Beni	Pista Suapi	Imp. beneficiadoras de cacao	CONCLUIDO	24.723
54	YR0097	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Villa Santiago	Complementación Agua Potable	CONCLUIDO	31.775
55	YR0098	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Nuevo Amanecer	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	26.539
56	YR0099	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Colke Alta,22 de Julio	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	191.302
57	YR0100	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	Porvenir,Paraiso, Chichas,Villa Litoral	Sistema de Agua Potable - Central Porvenir	CONCLUIDO	10.750
58	YR0108	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Apóstol Santiago	Provisión Motodeshierbadoras (20)	CONCLUIDO	5.880
59	YR0109	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Entre Rios - Playa Azul	Provisión Motodeshierbadoras (16)	CONCLUIDO	4.704
60	YR0110	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Expontánea Illimani	Provisión Motodeshierbadoras (11)	CONCLUIDO	3.234
61	YR0111	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Ingavi - Cobija	Provisión Motodeshierbadoras (20)	CONCLUIDO	5.880
62	YR0112	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Nueva Collasuyo	Provisión Motodeshierbadoras (26)	CONCLUIDO	7.644
63	YR0113	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Nueva Esperanza	Provisión Motodeshierbadoras (22)	CONCLUIDO	6.468
64	YR0114	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Ocampo	Provisión Motodeshierbadoras (32)	CONCLUIDO	9.408
65	YR0115	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Pajonal I	Provisión Motodeshierbadoras (21)	CONCLUIDO	6.174
66	YR0116	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Villa Camacho	Provisión Motodeshierbadoras (38)	CONCLUIDO	11.172
67	YR0117	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Provisión Motodeshierbadoras (22)	CONCLUIDO	6.468
68	YR0118	Economico	Agrícola	Yungas	Alto Beni	San Antonio	Provisión Motodeshierbadoras (146)	CONCLUIDO	42.924
69	YR0131	Economico	Transformacion	Yungas	Alto Beni	Piquendo	Implementación planta procesadora de frutas	CONCLUIDO	3.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
70	YR0143	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Alto Beni	San Juan Suapi, Villa El Prado	Sistema de Agua Potable (11 comunidades)	CONCLUIDO	21.986
71	YC0707	Comunitario	Agua potable	Yungas	Cajuata	Varios	Fondo de diseños de proyectos para el Municipio de Cajuata	CONCLUIDO	25.000
72	TC0003	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Chimore	Senda D, Puerto Aurora, Cesarzama, San Andres, Tacuaral Entre Rios, 6 de Agosto, Senda B	Iluminación 7 Canchas Polifuncionales	CONCLUIDO	18.291
73	TC0148	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Chimore (Convenio TAC)	Mejoramiento infraestructura TAC	CONCLUIDO	108.890
74	TC0294	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Estaño Palmito	Dotación de mobiliario escolar - Unidad Educativa Estaño Palmito	CONCLUIDO	1.344
75	TC0425	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Vida	Equipamiento del Internado Unidad Educativa comunidad indígena Nueva Vida	CONCLUIDO	43.425
76	TE0222	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Esperanza	Centro de Acopio de Flores y Capacitación para Mujeres	CONCLUIDO	14.700
77	TE0293	Economico	Capacitación productiva	Tropico Cbba	Chimore	NA	Capacitación en administración, contabilidad básica y elaboración de perfil de proyectos- Federaciones de varones y de Mujeres, Trópico de Cochabamba	CONCLUIDO	6.000
78	TE0315	Economico	Transformación	Tropico Cbba	Chimore	Nueva Vida	Construcción de Cartonera para Empacadora de Banano	CONCLUIDO	6.000
79	TE0420	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Senda 2	Mejoramiento y conclusión ambientes de UNABANA	CONCLUIDO	9.000
80	TE0443	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Chimore	Varias	Apoyo campaña de vacunación contra Fiebre Aftosa - Chimore	CONCLUIDO	2.500
81	TR0121	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Chimore	Trinidadcito (# 1)	Diseño: Construcción posta salud y equipamiento	CONCLUIDO	44.925
82	TR0122	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Betania	Construcción 2 aulas, baños y mobiliario	CONCLUIDO	7.564

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
83	TR0123	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Monte Sinai	Construcción 2 aulas, baños y mobiliario	CONCLUIDO	7.564
84	TR0124	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Chimore	Puerto Victoria	Construcción aula multigrado y batería baños	CONCLUIDO	5.197
85	TR0171	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Chimore	Chimore	Diseño Construcción y equip. taller artesanal	CONCLUIDO	6.680
86	YC0015	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Chulumani - Chulumani	Equipamiento Mob. Municipio Chulumani	CONCLUIDO	20.000
87	YC0022	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Refacción Colegio Miguel Mercado	CONCLUIDO	43.265
88	YC0023	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Ocobaya - Ocobaya	Conclusión Colegio de Ocobaya	CONCLUIDO	18.564
89	YC0024	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Tajma - Tajma	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	74.935
90	YC0036	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Cutusuma - Montequilla	Centro de Capacitación Productiva Montequilla	CONCLUIDO	20.696
91	YC0037	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Huancane - Huancane	Empedrado calle al Colegio Huancane	CONCLUIDO	17.083
92	YC0038	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Ocobaya - Ocobaya	Mejoramiento Mingitorio Ocobaya	CONCLUIDO	13.676
93	YC0039	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Tajma - Villa Remedios	Const. Baño para la Escuela Villa Remedios	CONCLUIDO	12.678
94	YC0040	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani - Zona Cancha	Mejoramiento Mingitorio cerca cancha Chulumani	CONCLUIDO	10.695
95	YC0041	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani - Zona Junin	Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin	CONCLUIDO	46.114
96	YC0042	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Rio Blanco - Rio Blanco	Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa Río Blanco	CONCLUIDO	24.998
97	YC0043	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani - Chulumani	Refacción UE Kinder Chulumani	CONCLUIDO	37.155
98	YC0048	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Huancane - Tongobaya	Centro de Capacitación	CONCLUIDO	15.320
99	YC0058	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Huancane -	Obra Fina Aulas (10) - Colegio S.	CONCLUIDO	48.417

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
						Huancane	Cristóbal		
100	YC0303	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Río Blanco	Sistema de Agua Potable Rio Blanco	CONCLUIDO	126.239
101	YC0305	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Conclusión Obra fina 1er piso Colegio Bartolina Sisa de Rio Blanco (Fase 2)	CONCLUIDO	50.292
102	YC0306	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	El Colpar	Construcción Plaza Principal - El Colpar	CONCLUIDO	38.858
103	YC0307	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Conclusión Centro de Capacitación-Palma Pampa	CONCLUIDO	1.250
104	YC0308	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chorrillo	Construcción Polifuncional, y .Vivienda para un maestro	CONCLUIDO	500
105	YC0467	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Chulumani	Chulumani	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Miguel Mercado - Chulumani	CONCLUIDO	9.764
106	YC0468	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Chulumani	Huancane	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E San Cristobal Huancane - Chulumani	CONCLUIDO	9.764
107	YC0511	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar Chulumani.	CONCLUIDO	8.000
108	YC0536	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Bajo Loa	Refacción Sistema de agua potable Bajo Loa	CONCLUIDO	6.200
109	YC0537	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Quilasa	Refacción Sistema de agua potable - Quilasi	CONCLUIDO	2.800
110	YC0538	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Cuchumpaya	Refacción Sistema de agua potable - Cuchumpaya	CONCLUIDO	9.500
111	YC0549	Comunitario	Salud	Yungas	Chulumani	Chulumani	Equipamiento de mobiliario clínico para 3 establecimientos de salud.	CONCLUIDO	10.000
112	YC0557	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Varios	Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos educativos - Chulumani	CONCLUIDO	10.000
113	YC0647	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Chulumani.	CONCLUIDO	17.000
114	YC0664F	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Chulumani	Chulumani	Construcción de baños publicos en la Calle Sucre - Chulumani	CONCLUIDO	22.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
115	YC0671	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	Chulumani	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Chulumani	EJECUCION	30.000
116	YE0082	Economico	Servicios	Yungas	Chulumani	Chulumani	Apoyo a las empresas constructoras que se adjudicaron proyectos en la Feria a la Inversa del Municipio de Chulumani	CONCLUIDO	58.653
117	YE0333	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Carnicería "GUTIERREZ"	CONCLUIDO	6.495
118	YE0334	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Cerdos "Torrez"	CONCLUIDO	9.500
119	YE0339	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Heladería "Los Manzanales"	CONCLUIDO	11.000
120	YE0340	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Colpar	Avícola Loza-Navia - Pollos Parrileros	CONCLUIDO	17.000
121	YE0342	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Venta de Pollos Broaster y Salchipapería "Angélica"	CONCLUIDO	2.500
122	YE0347	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Cerdos "Flores"	CONCLUIDO	18.000
123	YE0348	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Palma Pampa	Producción de gallinas de postura "LAYDI"	CONCLUIDO	15.000
124	YE0349	Economico	Apicola	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de miel y jalea "ESCOBAR"	CONCLUIDO	7.139
125	YE0350	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Panadería "JHONNY"	CONCLUIDO	10.000
126	YE0351	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Pasto Pata	Producción de Pollos "AVERANGA"	CONCLUIDO	14.681
127	YE0353	Economico	Apicola	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Miel de Abejas "RIO BLANCO"	CONCLUIDO	2.400
128	YE0354	Economico	Transformacion	Yungas	Chulumani	Colpar	Panadería Umalinda	CONCLUIDO	4.000
129	YE0356	Economico	Pecuario	Yungas	Chulumani	Rio Blanco	Producción de Pollos Parrileros "Nido"	CONCLUIDO	14.200
130	YE0378	Economico	Medio ambiente	Yungas	Chulumani	Varias	Recuperación de suelos (40 has) de ex coteles en la Zona Tradicional	CONCLUIDO	98.500
131	YE0682	Economico	Servicios	Yungas	Chulumani	Chulumani	Panadería MAMA-LUI	CONCLUIDO	4.500
132	YR0087	Comunitario	Educación	Yungas	Chulumani	El Colpar	Conclusión Vivienda Maestros y batería baños	CONCLUIDO	41.615
133	YR0144	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Chulumani	Colopampa	Agua potable	CONCLUIDO	70.597
134	YC0011	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	Arapata	Ampliación Centro de Salud - Arapata	CONCLUIDO	18.585

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
135	YC0017	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio Coripata	CONCLUIDO	25.428
136	YC0028	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	San Juan	Centro de Salud - San Juan	CONCLUIDO	36.767
137	YC0029	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Huayrapata	Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata	CONCLUIDO	3.575
138	YC0030	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	San Agustin	UE San Agustín	CONCLUIDO	85.654
139	YC0044	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Santa Getrudis	Construcción aulas UE Santa Gertrudis	CONCLUIDO	17.950
140	YC0045	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Dorado Grande	Construcción aulas UE Dorado Grande	CONCLUIDO	32.550
141	YC0083	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coripata	Coripata	Apoyo al interyungueño de fútbol 2006	CONCLUIDO	2.680
142	YC0309	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Anacurí	Construcción complejo deportivo turistico	CONCLUIDO	185.592
143	YC0310	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	San José de Peri	Conclusión Centro de Capacitación - San José de Peri - 1ra fase	CONCLUIDO	106.530
144	YC0311	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Huaycuni	Conclusión Centro de Capacitación - Huaycuni	CONCLUIDO	107.644
145	YC0426	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Auquisamana	Conclusion Obra Fina Iglesia Auquisamaña	CONCLUIDO	26.135
146	YC0427	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Marquiviri	Construccion de 2 Viviendas y Bateria de Baños Marquiviri	CONCLUIDO	22.175
147	YC0471	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Eduardo Abaroa-Coripata	CONCLUIDO	9.764
148	YC0472	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coripata	Arapata	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Rosemary Barrientos-Arapata- Coripata	CONCLUIDO	9.764
149	YC0484	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Arapata	Conclusión de la Unidad Educativa Franz Tamayo	CONCLUIDO	75.600
150	YC0507	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Milluguaya	Construcción del sistema de agua potable en Milluguaya	CONCLUIDO	109.300
151	YC0515	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Dotacion mobiliario ADEPCOCA	CONCLUIDO	10.300
152	YC0539	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Comunidad San Felix	Construcción sistema de agua potable San Félix – Dorado Chico – Dorado Grande.	CONCLUIDO	20.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
153	YC0540	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Dorado Grande	Construcción sistema de agua potable Dorado Chico – Dorado Grande.	CONCLUIDO	18.000
154	YC0546	Comunitario	Salud	Yungas	Coripata	Coripata	Equipamiento clínico complejo para el hospital básico de Coripata	CONCLUIDO	25.000
155	YC0554	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Varios	Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos educativos. Coripata	CONCLUIDO	25.000
156	YC0614	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	El Choro, Milliguaya	Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El Choro Grande – Milliguaya).	CONCLUIDO	3.500
157	YC0615	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Charobamba, Nogalani	Equipamiento mobiliario para 2 U.E. Charobamba y Huri Nogalani	CONCLUIDO	5.500
158	YC0616	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Nogalani	Diseño y construcción obra fina 8 aulas en la U.E. de la comunidad de Nogalani	CONCLUIDO	69.000
159	YC0635	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coripata	San Agustín	Diseño final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de San Agustín	CONCLUIDO	8.000
160	YC0648	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Coripata	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Coripata	CONCLUIDO	17.000
161	YC0664	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coripata	Coripata	Construcción de un baño público en el sector de la Plaza - Coripata	CONCLUIDO	180.000
162	YC0672	Comunitario	Educación	Yungas	Coripata	Coripata	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Coripata	EJECUCION	30.000
163	YC0689	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Arapata	Diseño final de la línea de la aducción del sistema de agua potable de Arapata, dotación de tubería y fortalecimiento de su CAPYS	CONCLUIDO	18.000
164	YE0010	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Coripata	Sede Social - Sindical (ADEPCOCA)	CONCLUIDO	66.949
165	YE0335	Economico	Pecuario	Yungas	Coripata	San José de Peri	Producción de Pollos Parrileros "Doña Martha"	CONCLUIDO	15.500
166	YE0336	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Snack "DONA LUPE"	CONCLUIDO	2.000
167	YE0337	Economico	Pecuario	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Producción de Cerdos "Choque"	CONCLUIDO	20.000
168	YE0338	Economico	Transformación	Yungas	Coripata	San José de Peri	Carpintería "Juan de la Cruz"	CONCLUIDO	4.052

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
169	YE0341	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	San José de Peri	Pollereria Alberta	CONCLUIDO	2.290
170	YE0343	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	San José de Peri	Comidería "DONA JUAQUINA	CONCLUIDO	7.000
171	YE0344	Economico	Agrícola	Yungas	Coripata	San José de Peri	Produccion de mangos san Rafael	CONCLUIDO	4.018
172	YE0345	Economico	Apicola	Yungas	Coripata	San José de Peri	Miel de abejas "NINA"	CONCLUIDO	4.668
173	YE0346	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	San José de Peri	Panadería "San José"	CONCLUIDO	7.882
174	YE0352	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	Palma Pampa	Panadería "Julia"	CONCLUIDO	10.000
175	YE0355	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	El Colpar	Carnicería "Santa Rita"	CONCLUIDO	4.000
176	YE0497	Economico	Turismo	Yungas	Coripata	Coripata	Diseño final terminal de buses Coripata	CONCLUIDO	10.000
177	YE0599	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Coripata	Comunidad Anacuri, Comunidad Auquisamaña	Construcción de alcantarillas: Tramo Coripata – Pte Chacon y Anaruri - Auquisanana	CONCLUIDO	10.800
178	YR0077	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Arapata	Construcción Mercado Central	CONCLUIDO	116.098
179	YR0103	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Anacuri	Obra fina iglesia	CONCLUIDO	44.303
180	YR0139	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Machacamarca	Obra fina sede social	CONCLUIDO	78.633
181	YR0140	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coripata	Machacamarca	Agua potable	CONCLUIDO	95.628
182	YR0141	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Tabacal	Refacción casa de hacienda para albergue	CONCLUIDO	121.298
183	YR0142	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Santa Rosa (Arapata)	Polifuncional Santa Rosa de Lima	CONCLUIDO	25.640
184	YR0145	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coripata	Santa Rosa	Obra fina iglesia	CONCLUIDO	41.386
185	YR0174	Economico	Servicios	Yungas	Coripata	Anacuri	Clasificadora de áridos	EJECUCION	65.428
186	YR0175	Economico	Transformacion	Yungas	Coripata	Anacuri	Cortadora piedra laja	CONCLUIDO	26.845
187	YC0034	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Chiquina	Diseño: Escuela Multigrado Chiquina	CONCLUIDO	75
188	YC0104	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Reposición obras piscina y fortalec. municipal	CONCLUIDO	51.373

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
189	YC0137	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Tocaña	Construcción obras complem. centro cultural	CONCLUIDO	60.333
190	YC0147	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Canalización río Nilo - Carmen Pampa	CONCLUIDO	81.638
191	YC0162	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coroico	Varios	Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico)	CONCLUIDO	15.725
192	YC0168	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Intervención en UAC-CP	CONCLUIDO	280.000
193	YC0169	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Tocaña	Conclusión obra fina posta de salud	CONCLUIDO	20.875
194	YC0172	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Tocaña	Desarrollo turístico comunitario	CONCLUIDO	14.000
195	YC0192	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo Festival Folklórico Internacional Coroico 2007	CONCLUIDO	5.000
196	YC0460	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Varios	Capacitación en Enfermería - Becas Magister UAC-CP	CONCLUIDO	7.280
197	YC0465	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Cruz Loma	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Téc. Humanístico Cruz Loma- Coroico	CONCLUIDO	9.764
198	YC0466	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Reyes Ortíz - Coroico	CONCLUIDO	9.764
199	YC0485	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	San Joaquin	Relleno Sanitario - Coroico	CONCLUIDO	200.000
200	YC0516	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Provisión de materiales para la construcción de comedor de la UAC-CP	CONCLUIDO	28.000
201	YC0541	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Coroico	Equipamiento complementario del hospital básico de Coroico	CONCLUIDO	30.000
202	YC0550	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Varios	Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos educativos - Coroico	CONCLUIDO	32.000
203	YC0583	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Chicaparque	Ampliación del Sistema de agua potable Chicaparque - Yolosita	CONCLUIDO	3.600
204	YC0584	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Calabatea	Ampliación del Sistema de agua potable Calabatea de Ayacucho.	CONCLUIDO	3.200
205	YC0585	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Chiquiña	Construcción aducción sistema de agua potable de Chiquiña	CONCLUIDO	2.700
206	YC0586	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Santa Ana	Refacción del Sistema de Agua Potable Santa Ana	CONCLUIDO	6.200

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
207	YC0587	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Geronimo	Ampliación del Sistema de agua potable San Gerónimo	CONCLUIDO	5.200
208	YC0588	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Cochuma	Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna - Coroico	CONCLUIDO	8.000
209	YC0589	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Coroico	Refacción una sección de la red de agua potable - Coroico Urbano	CONCLUIDO	3.600
210	YC0590	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Marca	Ampliación Sistema de agua potable Marca	CONCLUIDO	1.200
211	YC0591	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y comedor para maestros en la U.E. San Pedro de Coroico	CONCLUIDO	6.000
212	YC0593	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Santiago Grande	Diseño sistema de agua potable Santiago Grande	CONCLUIDO	62.000
213	YC0594	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Cristobal	Diseño y construcción del Sistema de agua potable San Cristóbal.	CONCLUIDO	30.000
214	YC0623	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad San Joaquín	Diseño y construcción del sistema de agua potable San Joaquín.	CONCLUIDO	78.500
215	YC0643	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Comunidad Tocaña	Dotación de Tubería para la extensión de la línea de aducción del sistema de agua de la comunidad de Tocaña.	CONCLUIDO	6.500
216	YC0649	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Coroico	CONCLUIDO	25.000
217	YC0673	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Coroico	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Coroico	EJECUCION	30.000
218	YC0681	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Comunidad Carmen Pampa	Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del puesto de salud de Carmen Pampa.	EJECUCION	90.000
219	YC0697	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Coroico	Coroico	Refacción de la toma de agua del SAP del centro poblado de Coroico	EJECUCION	23.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
220	YC0699	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Comunidad San Joaquin	Conclusión de la UE de San Joaquin	CONCLUIDO	8.700
221	YC0704	Comunitario	Educación	Yungas	Coroico	Carmen Pampa	Diseño y construcción de la cubierta de techo en la UAC- CP	CONCLUIDO	33.500
222	YE0199	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Coroico	Charobamba	Diseño acceso al Puente vehicular colgante	CONCLUIDO	20.168
223	YE0514	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo al sector turístico: Festival Cultural Coroico 2009	CONCLUIDO	5.000
224	YE0592	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Comunidad San Félix	Mejoramiento del sitio turístico de la comunidad de San Félix	CONCLUIDO	21.000
225	YE0634	Economico	Pecuario	Yungas	Coroico	Varias	Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de Avicultores de La Paz- Coroico	CONCLUIDO	2.200
226	YE0644	Economico	Turismo	Yungas	Coroico	Coroico	Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 2010	CONCLUIDO	3.000
227	YR0054	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	76.981
228	YR0055	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Plaza	CONCLUIDO	50.592
229	YR0056	Comunitario	Salud	Yungas	Coroico	Santa Rosa de Quilo Quilo	Construcción Centro de Salud Santa Rosa Quilo	CONCLUIDO	106.585
230	YR0057	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Coroico	Suapi	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	92.074
231	YR0101	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Coroico	Coroico	Polifuncional deportivo de Coroico	CONCLUIDO	99.960
232	TC0005	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Entre Rios	Centro Poblado Bulu Bulu	Conclusión Plaza Principal - Bulu Bulu	CONCLUIDO	19.778
233	TC0211	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Entre Rios	Entre Ríos	Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - Fase 1	CONCLUIDO	37.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
234	TE0298	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Entre Ríos,Isarzama,Manco Kapac	Apoyo a la Producción Apícola	CONCLUIDO	20.000
235	TE0299	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Machu Pijchu	Apoyo a la producción de Banano	CONCLUIDO	4.000
236	TE0300	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Entre Rios	Los Amigos,Palmar,San Miguel	Apoyo a la producción de Piña	CONCLUIDO	20.000
237	TE0301	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Entre Rios	Entre Ríos,Manco Kapac,Río Blanco	Apoyo a laproducción pecuaria	CONCLUIDO	6.000
238	TE0302	Economico	Transformacion	Tropico Cbba	Entre Rios	Ivirgarzama	Apoyo a AUPAII VII	CONCLUIDO	6.500
239	TE0446	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Entre Rios	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Entre Ríos	CONCLUIDO	33.000
240	TR0170	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Entre Rios	Barrio Imperial	Cubierta e iluminación UE Octavio Pastrana	CONCLUIDO	64.655
241	TR0178	Comunitario	Agua Potable	Tropico Cbba	Entre Rios	23 comunidades,2 urb. (# 2)	Construcción Sistema Agua Potable 4 centrales	CONCLUIDO	82.000
242	TR0198	Comunitario	Agua Potable	Tropico Cbba	Entre Rios	Sindicato Ira Volcan	Conclusión sistema de agua potable	CONCLUIDO	21.500
243	YC0463	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Irupana	Chicaloma	Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Chicaloma-Irupana	CONCLUIDO	9.764
244	YC0464	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Irupana	Irupana	Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E 5 de Mayo-Irupana	CONCLUIDO	9.764
245	YC0502	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Chicaloma	Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua de la Población de Chicaloma.	CONCLUIDO	24.000
246	YC0506	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Paraiso	Construcción del sistema de alcantarillado de Paraíso	CONCLUIDO	110.000
247	YC0524	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Santa Ana	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable Santa Ana	CONCLUIDO	5.600
248	YC0525	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Yuni Grande	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable – Yuni Grande	CONCLUIDO	2.480

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
249	YC0526	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Uquina	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Uquina	CONCLUIDO	2.100
250	YC0527	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Irupana	Comunidad Silala	Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Silala	CONCLUIDO	1.900
251	YC0547	Comunitario	Salud	Yungas	Irupana	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y administrativo para cuatro establecimientos de salud de Irupana	CONCLUIDO	20.000
252	YC0555	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Varios	Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos educativos. Irupana	CONCLUIDO	15.000
253	YC0645	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Irupana	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Irupana	CONCLUIDO	17.000
254	YC0664A	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Irupana	Construcción de un Baño público para la población de Irupana en el barrio de Churiaca.	EJECUCION	32.000
255	YC0664G	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Irupana	Construcción de baños públicos en el sector de la plaza Coroico	CONCLUIDO	15.000
256	YC0666	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Sindicato San Jose de Llojeta	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Llojeta	EJECUCION	18.000
257	YC0667	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Churubamba	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Churubamba	EJECUCION	18.000
258	YC0668	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Lejna	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Alto Lejna	CONCLUIDO	18.000
259	YC0669	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Comunidad Huirí Lanza	Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad Educativa de Huirí Lanza	EJECUCION	18.000
260	YC0676	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Irupana	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Irupana	EJECUCION	30.000
261	YE0598	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Irupana	Irupana, Varios	Construcción de alcantarillas en caminos comunales de Irupana	CONCLUIDO	14.600
262	YE0658	Economico	Agrícola	Yungas	Irupana	Irupana	Desarrollo de proveedores en la cadena de amaranto orgánico de alta calidad en los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	98.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
263	YR0059	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Irupana	Chicaloma	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	257.396
264	YR0061	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Irupana	Chicaloma	Plaza Población Chicaloma	CONCLUIDO	77.884
265	YR0078	Comunitario	Educación	Yungas	Irupana	Chicaloma	Refacción Unidad Educativa Chicaloma	CONCLUIDO	151.701
266	YC0189	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación bachilleres	CONCLUIDO	2.400
267	YC0287	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	La Asunta	Varias	Procesos de priorización de proyectos en de la IL-43	CONCLUIDO	5.000
268	YC0327	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Villa El Porvenir	Construcción Aula Multigrado Villa El Porvenir- Central Pto.Unido	CONCLUIDO	21.204
269	YC0328	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Antonio	Construcción Aula Multigrado San Antonio- Central Pto.Unido	CONCLUIDO	21.204
270	YC0329	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Pablo	Construcción Multifuncional San Pablo - Central Cotapata	CONCLUIDO	19.525
271	YC0330	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Cotapata	Dotación 7 Computadoras para Colegio y Generador E.Eléctrica - Central Cotapata	CONCLUIDO	18.500
272	YC0331	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto Rico Histórico	CONCLUIDO	44.228
273	YC0457	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Yanamayu	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Yanamuyu I-II - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
274	YC0458	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a Jóvenes de Fed. La Asunta-La Asunta	CONCLUIDO	9.764
275	YC0459	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Chamaca	Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a Jóvenes de Fed. Chamaca-La Asunta	CONCLUIDO	9.764
276	YC0473	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Cotapata	Capacitación a Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Cotapata - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
277	YC0474	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capac. a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E René Barrientos Ortuño - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
278	YC0475	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Adventista - La Asunta	CONCLUIDO	9.764

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
279	YC0476	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Charia	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Charia - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
280	YC0477	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	La Calzada	Capacitación a Jóvenes en D.Humano y Liderazgo - U.E Mercedes- La Calzada - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
281	YC0478	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Santa Rosa - La Asunta	CONCLUIDO	9.764
282	YC0479	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	La Asunta	Estrategia de Comunicación La Asunta	CONCLUIDO	150.000
283	YC0482	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Iro de Julio	Construcción Unidad Educativa y Vivienda para Maestro	CONCLUIDO	36.000
284	YC0483	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Incahuara	Construcción Unidad Educativa y Vivienda para Maestro	CONCLUIDO	36.000
285	YC0492	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	La Asunta	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina	CONCLUIDO	22.000
286	YC0493	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Puerto Rico	Sistema de agua potable - Puerto Rico	CONCLUIDO	94.103
287	YC0494	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Cotapata	Sistema de agua potable - Cotapata	CONCLUIDO	107.958
288	YC0508	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolivar II	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar II	CONCLUIDO	12.445
289	YC0509	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolivar III	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III	CONCLUIDO	13.640
290	YC0510	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Bolivar IV	Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV	CONCLUIDO	27.268
291	YC0512	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	Bolivar	Rehabilitación de la hidroeléctrica de Chamaca	CONCLUIDO	5.000
292	YC0513	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Bolivar	Diseño del sistema de agua potable para la Central Bolívar	CONCLUIDO	10.000
293	YC0528	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Yanamayu	Refacción del Sistema de agua potable Yanamayo	CONCLUIDO	7.300
294	YC0529	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Comunidad Cajones	Refacción del Sistema de agua potable Cajones	CONCLUIDO	4.600
295	YC0530	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	San Felipe	Refacción del Sistema de agua potable San Felipe	CONCLUIDO	9.800
296	YC0531	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de	Complementación del Sistema de Agua	CONCLUIDO	12.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
						Agosto	Potable 21 de Agosto		
297	YC0532	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Refacción del Sistema de agua potable Santa Rosa	CONCLUIDO	10.500
298	YC0543	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario clínico y complementario del Centro de Salud de La Asunta	CONCLUIDO	80.000
299	YC0544	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. Chamacas)	CONCLUIDO	20.000
300	YC0545	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. La Asunta)	CONCLUIDO	30.000
301	YC0552	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varias	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos. Fed. La Asunta	CONCLUIDO	38.000
302	YC0553	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varios	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos. Fed. Chamaca	CONCLUIDO	46.000
303	YC0558	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Comunidad San Pedro Zona "C"	Construcción de alcantarillas tramo San Pedro C - La Florida	CONCLUIDO	9.000
304	YC0559	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Comunidad Pichari	Construcción de alcantarillas tramo Pichari - Nogalani - 10 de Febrero	CONCLUIDO	22.500
305	YC0578	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Campana de salud dental en niños y jóvenes.	CONCLUIDO	15.800
306	YC0579	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios	Campana de detección de Cáncer en mujeres.	CONCLUIDO	5.000
307	YC0605A	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Calzada	Mejoramiento de baños en colegios y escuelas en La Asunta - La Calzada	CONCLUIDO	22.000
308	YC0605B	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Santa Rosa	Construcción batería de baños en la U. E. de Santa Rosa	CONCLUIDO	23.500
309	YC0605C	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Yanamayu	Construcción batería de baños en la U. E. de Yanamayu	CONCLUIDO	25.500
310	YC0605D	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Bolivar II	Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar II	CONCLUIDO	9.500
311	YC0605E	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Bolivar III	Construcción batería de baños en la U.	CONCLUIDO	9.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
							E. de Bolivar III		
312	YC0605F	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Rene Barrientos Ortuno	Construcción batería de baños en la U. E. de Rene Barrientos Ortuno	CONCLUIDO	30.000
313	YC0611	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	Varios YUN	Campaña de prevención de leishmaniasis	EJECUCION	20.000
314	YC0617	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de la obra fina de 16 viviendas y batería de baños UE de La Asunta.	CONCLUIDO	24.000
315	YC0618	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diseño final del Centro de Salud de La Asunta	CONCLUIDO	14.000
316	YC0619	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Construcción de un bote con motor fuera de borda	CONCLUIDO	6.000
317	YC0620	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Diseño puente peatonal en San Gabriel	CONCLUIDO	8.000
318	YC0626	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diseño de 12 aulas para la Unidad Educativa René Barrientos Ortuño de La Asunta	EJECUCION	247.400
319	YC0627	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Cotapata	Elaboración del Diseño final del sistema de alcantarillado sanitario para el centro poblado de Cotapata.	CONCLUIDO	10.000
320	YC0629A	Comunitario	Salud	Yungas	La Asunta	La Asunta	Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en La Asunta	CONCLUIDO	5.000
321	YC0633	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	Cotapata	Diseño y construcción de la Plaza Central en la Comunidad de Cotapata	CONCLUIDO	27.500
322	YC0640	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	La Asunta	La Asunta	Diagnóstico integral de saneamiento básico en el Municipio de La Asunta	CONCLUIDO	8.800
323	YC0642	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de los centros de capacitación de las Centrales de La Asunta y El Progreso en el Municipio de La Asunta	CONCLUIDO	3.500
324	YC0650	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos del Centro poblado de La Asunta	CONCLUIDO	25.000
325	YC0651	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Chamaca	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos Federación	CONCLUIDO	25.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
							Chamaca		
326	YC0652	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos Federación La Asunta	CONCLUIDO	25.000
327	YC0664B	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	La Asunta	Construcción de un baño público y duchas en la plaza principal de la Población de La Asunta	CONCLUIDO	30.000
328	YC0674	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Chamaca	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Federación Chamaca	EJECUCION	30.000
329	YC0675	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Federación La Asunta	EJECUCION	30.000
330	YC0679	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de La Asunta – Centro poblado La Asunta	EJECUCION	30.000
331	YC0685	Comunitario	Otros	Yungas	La Asunta	Varios	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina – Fase II	EJECUCION	65.000
332	YC0692	Comunitario	Agua Potable	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de Agosto, San Jose	Construcción del sistema de agua potable de San José, Los Olivos y 21 de Agosto	EJECUCION	432.000
333	YC0700	Comunitario	Agua potable	Yungas	La Asunta	La Asunta	Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La Asunta	EJECUCION	30.000
334	YC0702	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	San Fernando	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Fernando.	CONCLUIDO	40.000
335	YC0708	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción de una batería de baños en la UE de Sigvani Grande	CONCLUIDO	40.000
336	YC0709	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Quinuni	Construcción de batería de baños en la UE de Santa Rosa de Quinuni	CONCLUIDO	45.000
337	YC0710	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	La Asunta	Mejoramiento integral de la UE de San Martín	CONCLUIDO	66.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
338	YC0711	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Colonia San Juan Unidos	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Juan Unidos	CONCLUIDO	52.000
339	YC0712	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Puerto Aroma	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Puerto Aroma	CONCLUIDO	55.000
340	YC0713	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Colonia Nuevos Horizontes	Construcción de vivienda de maestros y batería de baños en la UE de Nuevos Horizontes	CONCLUIDO	90.000
341	YC0714	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Nueva Union	Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Nueva Unión	CONCLUIDO	46.000
342	YC0718	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la población de Siguaní Grande	EJECUCION	250.000
343	YC0719	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Colonia Villa Potosí	Construcción de los servicios higiénicos en la UE Villa Nueva Potosí.	CONCLUIDO	18.000
344	YC0720	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	Los Olivos	Construcción de los servicios higiénicos de la UE Los Olivos	CONCLUIDO	18.000
345	YC0721	Comunitario	Saneamiento	Yungas	La Asunta	San Jose	Construcción de una batería de baños en la UE de Pichari	CONCLUIDO	24.000
346	YE0085	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Porvenir - 20 de Mayo	Puente Peatonal Colgante	CONCLUIDO	26.644
347	YE0227	Economico	Medio ambiente	Yungas	La Asunta	Varias	100 Ha de parcelas agroforestales familiares en sustitución de coteles	CONCLUIDO	42.500
348	YE0229	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	La Asunta	Produccion de pollos Donato	CONCLUIDO	550
349	YE0284	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	Varias	Formacion tecnica de jovenes en La Asunta	EJECUCION	120.000
350	YE0295	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	La Asunta	Intercambio de Productores Lideres - La Asunta	CONCLUIDO	35.700
351	YE0332A	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL ERIKA"	CONCLUIDO	15.000
352	YE0332B	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL 20 DE SEPTIEMBRE"	CONCLUIDO	15.000
353	YE0332C	Economico	Turismo	Yungas	La Asunta	La Asunta	Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta "HOTEL BELLA VISTA"	CONCLUIDO	15.000
354	YE0358	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Panaderia "ESTHER"	CONCLUIDO	4.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
355	YE0359	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura "Meza"	CONCLUIDO	4.000
356	YE0360	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Puerto Unido - Santa Teresita	Granja gallinas ponedoras "Río Seco"	CONCLUIDO	14.300
357	YE0361	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Taller de Confecciones de ropa de vestir "Yola"	CONCLUIDO	4.650
358	YE0362	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Cotapata	Taller de Carpintería "Quispe"	CONCLUIDO	16.950
359	YE0363	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura "Cuba"	CONCLUIDO	3.900
360	YE0364	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Porvenir 20 de Mayo, Progreso - San San Unido	Corte y Confección "Gloria"	CONCLUIDO	5.800
361	YE0365	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	La Asunta	Producción de pollos parrilleros "Roco"	CONCLUIDO	9.600
362	YE0366	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Puerto Unido - San Antonio	Taller de Carpintería CORFAB	CONCLUIDO	10.650
363	YE0367	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	Cotapata	Panadería "Integral"	CONCLUIDO	5.900
364	YE0368	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Taller de Carpintería "Alex"	CONCLUIDO	20.280
365	YE0369	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Porvenir 20 de Mayo, Progreso - San San Unido	Pollos parrilleros "Doña Isabel"	CONCLUIDO	16.450
366	YE0370	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Jugos naturales "Silvia"	CONCLUIDO	5.300
367	YE0371	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	San Pablo	Pollos parrilleros FICO	CONCLUIDO	13.750
368	YE0372	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cuchumpaya	Apicultura "Mamani"	CONCLUIDO	4.150
369	YE0373	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Jugos Naturales "Erika"	CONCLUIDO	6.150
370	YE0374	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Heladería "Jeremy"	CONCLUIDO	15.000
371	YE0375	Economico	Servicios	Yungas	La Asunta	Puerto Rico	Transporte en bote de Carga y Pasajeros "Titanic"	CONCLUIDO	7.402
372	YE0376	Economico	Servicios	Yungas	La Asunta	La Asunta	Salon de Peinados y Peluquería "Chura"	CONCLUIDO	6.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
373	YE0377	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	Cotapata	Apicultura San Gabriel	CONCLUIDO	4.400
374	YE0486	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	La Asunta	La Asunta	Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta	CONCLUIDO	30.000
375	YE0487	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Cafe	CONCLUIDO	105.000
376	YE0488	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Estevia	CONCLUIDO	220.000
377	YE0489	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Platano	CONCLUIDO	98.000
378	YE0490	Economico	Pecuario	Yungas	La Asunta	Brecha J	Plan Avicola	CONCLUIDO	15.000
379	YE0491	Economico	Apicola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Plan Apicola	CONCLUIDO	40.000
380	YE0495	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	San Gabriel	Puente del Desarrollo	EJECUCION	89.725
381	YE0560	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Puerto Rico - San Fernando - Cuarta Bolívar	CONCLUIDO	20.340
382	YE0561	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Central Simon Bolivar	Construcción de alcantarillas en los caminos de la Central Bolívar	CONCLUIDO	22.500
383	YE0562	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Santa Lucia	Construcción de alcantarillas tramo Santa Lucia - Chispanito	CONCLUIDO	21.420
384	YE0563	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Colonia Incahuara	Construcción de alcantarillas tramo 10 de Febrero - Churubamba - Incahuara de Canaan	CONCLUIDO	22.500
385	YE0564	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Construcción de alcantarillas tramo Sigvani Grande - Quillabamba	CONCLUIDO	22.500
386	YE0565	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Colonia 21 de Agosto	Construcción de alcantarillas tramo Nogalani - 21 de Agosto	CONCLUIDO	20.340
387	YE0566	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Cotapata - San Felipe - 10 de febrero	CONCLUIDO	22.500
388	YE0567	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Chamaca - Tunquini - Alto Charobamba	CONCLUIDO	22.500
389	YE0568	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Alto Charobamba, Chamaca, Tunquini	Construcción de alcantarillas tramo Villa Victoria - Palmeras	CONCLUIDO	22.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
390	YE0569	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Varios	Construcción de alcantarillas tramo Chorrillo - San Lorenzo	CONCLUIDO	18.000
391	YE0570	Economico	Apícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Implementación/equipamiento de centros de acopio y procesamiento apícola	CONCLUIDO	45.000
392	YE0571	Economico	Transformacion	Yungas	La Asunta	La Asunta	Consolidar la calidad del café a través del co-financiamiento de despulpadoras individuales	CONCLUIDO	56.000
393	YE0573	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Incremento de la base productiva del cultivo de Stevia en el municipio de La Asunta	CONCLUIDO	50.000
394	YE0575	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	Varias	Creación de una base productiva hortícola en Yungas de La Paz	CONCLUIDO	15.000
395	YE0600	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta, Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar II	CONCLUIDO	9.000
396	YE0601	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta, Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar III	CONCLUIDO	9.000
397	YE0602	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	La Asunta, Varios	Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales de la Bolívar IV	CONCLUIDO	9.540
398	YE0624	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	La Asunta	La Asunta	Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas del FCDI	CONCLUIDO	53.000
399	YE0639	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Siguani Grande	Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguaní Chico	EJECUCION	31.000
400	YE0641	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Puerto Aroma	Diseño y provisión de materiales para la construcción del puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto Aroma.	CONCLUIDO	25.000
401	YE0684	Economico	Agrícola	Yungas	La Asunta	La Asunta	Apoyo, a los asociados de APEPLA, en los procesos/fase de cosecha, pos cosecha, negociación y comercialización.	CONCLUIDO	85.000
402	YR0084	Economico	Infraestructura vial	Yungas	La Asunta	Cuchumpaya	Puente Peatonal Colgante	CONCLUIDO	79.274
403	YR0086	Comunitario	Educación	Yungas	La Asunta	Porvenir - 20 de Mayo	Construcción Unidad Educativa El Porvenir	CONCLUIDO	31.439
404	YC0008B	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Sector Boopi / Sapecho	Implementación de UHF's (259/97 UHF's)	CONCLUIDO	527.400

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
405	YC0013	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos	CONCLUIDO	70.307
406	YC0163	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varios	Fort. institucional (PDM Alcaldía P. Blancos)	CONCLUIDO	21.580
407	YC0166	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varias	Apoyo a interinstitucional Alto Beni "IIAB"	CONCLUIDO	27.000
408	YC0181	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Computadora Braile UE para no videntes)	CONCLUIDO	16.538
409	YC0182	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Alto Beni	Fortalecimiento estra. comunicación Alto Beni	CONCLUIDO	25.000
410	YC0186	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Brecha H	Dotación Escuela Técnica Sup.	CONCLUIDO	1.765
411	YC0288	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Enlosetado Av. Principal de Palos Blancos	CONCLUIDO	3.471
412	YC0461	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Sapecho B- Alto Beni	CONCLUIDO	9.764
413	YC0462	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - U.E Palos Blancos B- Alto Beni	CONCLUIDO	9.764
414	YC0519	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia San Pedro	Construcción de la red de distribución de agua Potable y conexiones domiciliarias de la comunidad de San Pedro	CONCLUIDO	28.000
415	YC0520	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Villa El Carmen	Construcción de la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la comunidad de Villa El Carmen	CONCLUIDO	24.000
416	YC0521	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Tupiza A	Construcción de la red de distribución de agua Potable y conexiones domiciliarias de la población de Tupiza A	CONCLUIDO	21.000
417	YC0522	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Tupiza B	Diseño Final y construcción del la red de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias de la Población de Tupiza B.	CONCLUIDO	19.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
418	YC0523	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Batallas	"Construcción de obra de toma y aducción para el sistema de agua potable de la comunidad de Batallas"	EJECUCION	18.000
419	YC0533	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Los Olivos	Refacción Sistema de agua potable Los Olivos	CONCLUIDO	1.800
420	YC0534	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Refacción sistema de agua potable Palos Blancos	CONCLUIDO	8.500
421	YC0542	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento complementario hospital básico de Palos Blancos	CONCLUIDO	30.000
422	YC0551	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Varios	Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos educativos – Palos Blancos	CONCLUIDO	30.000
423	YC0582	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Palos Blancos	Varios	Equipamiento al Proyecto OSCAR	CONCLUIDO	28.500
424	YC0607	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Comunidad Inicua Bajo	Diseño y construcción del sistema de agua potable de Inicua Bajo	CONCLUIDO	120.000
425	YC0621	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Charcas I	Diseño y construcción de vivienda para médico y enfermera C. Charcas	CONCLUIDO	14.000
426	YC0629B	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Campaña de capacitación y prevención de cáncer uterino en La Asunta y Palos Blancos	CONCLUIDO	5.000
427	YC0631	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Muchane	Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la Unidad Educativa Muchane	CONCLUIDO	12.500
428	YC0632	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Comunidad La Cascada	Construcción de 16 viviendas para maestros distrito educativo La Cascada	CONCLUIDO	64.000
429	YC0637	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Alto Remolinos	Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Alto Remolinos	CONCLUIDO	6.000
430	YC0653	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos Blancos	CONCLUIDO	25.000
431	YC0654	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Área II del Municipio de Palos Blancos	CONCLUIDO	19.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
432	YC0661	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana Moseten	Diseño final de construcción de una cubierta para la cancha polifuncional de la Unidad Educativa de Santa Ana de Mosetenes	EJECUCION	35.000
433	YC0662	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Brecha I	Ajuste del diseño final y construcción del sistema de agua potable en la Comunidad de Brecha I (Luz, Porvenir y Calama)	CONCLUIDO	85.000
434	YC0664C	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Construcción de un baño publico en cruce de Sapecho	CONCLUIDO	22.000
435	YC0664D	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Construcción de un baño publico en el Mercado de Palos Blancos	CONCLUIDO	20.000
436	YC0677	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Palos Blancos	EJECUCION	30.000
437	YC0678	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Palos Blancos – Área V y VI	EJECUCION	30.000
438	YC0687	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	San Miguel de Huachi	Construcción del Sistema de Agua Potable de San Miguel de Huachi.	EJECUCION	352.400
439	YC0690	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Colonia Remolinos	Construcción del Sistema de Agua Potable para el Distrito Remolinos	EJECUCION	278.500
440	YC0696	Comunitario	Otros	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Mejorando la calidad de vida de la familia desde la cocina - Municipio de Palos Blancos	EJECUCION	76.000
441	YC0701	Comunitario	Agua potable	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Fondo de Diseños de proyectos de agua potable Alto Beni - Palos Blancos	CONCLUIDO	30.000
442	YC0716	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Equipamiento y dotación de materiales para la enseñanza a niños con capacidades especiales	CONCLUIDO	13.500
443	YC0722	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Construcción de un Baño Público en la Plaza Central de Palos Blancos	CONCLUIDO	18.000
444	YE0154	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Varios	Apoyo implementación 3 pastelerías	CONCLUIDO	31.574

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
445	YE0155	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Varios	Apoyo en Iniciativas de Negocio en la implementación de 4 Inict. de Neg. en transformación y comercialización, en la región de los Yungas	CONCLUIDO	26.569
446	YE0156	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Producción pollos parrilleros - Granja Adriana	CONCLUIDO	4.703
447	YE0159	Economico	Servicios	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Tarjetas artesanales	CONCLUIDO	2.637
448	YE0160	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Brecha J	Implementación de colmenas ADAEPAB	CONCLUIDO	7.287
449	YE0161	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Carpintería industrial	CONCLUIDO	12.751
450	YE0230	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Modernización de la Planta Industrial de Derivados Lácteos "CACIQUE"	CONCLUIDO	47.000
451	YE0232	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Brecha H - Palos Blancos	Producción de Jugo y Concentrados de Cítricos	CONCLUIDO	47.000
452	YE0233	Economico	Servicios	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Acopio y Venta de Áridos	CONCLUIDO	5.224
453	YE0236	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Transformación y Comercialización de Productos Medicinales Naturales	CONCLUIDO	11.596
454	YE0239	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Complementación del Hotel Magdalena	CONCLUIDO	13.999
455	YE0239B	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Complementación del Hotel Rigman	CONCLUIDO	15.220
456	YE0241	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha J - Popoy	Producción y Comercialización de Cerdos	CONCLUIDO	17.139
457	YE0243	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Popoy	Implementación de una Planta Procesadora de Embutidos	CONCLUIDO	18.827
458	YE0244	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Elaboración de Derivados de Estevia - "IPAN"	CONCLUIDO	500
459	YE0245	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	El Sillar	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero "ILLAMPU"	CONCLUIDO	12.031
460	YE0246	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Puerto Santa Ana	Circuito Etnoecoturismo en el río La Paz y Beni	CONCLUIDO	16.382
461	YE0247	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha B - Sapecho	Mejoramiento del Hato y Comercialización de Leche "DELGADILLO"	CONCLUIDO	20.229
462	YE0248	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Peladora de Arroz y Silos	CONCLUIDO	8.773

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
463	YE0252	Economico	Agrícola	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Semilla Hibrida de Caco y Cítricos	CONCLUIDO	10.900
464	YE0253	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Implementación de Colmenas - "ECOTOP"	CONCLUIDO	6.000
465	YE0254	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha H - Palos Blancos	Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA PATI"	CONCLUIDO	16.000
466	YE0258	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Wiñay Marca	Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "WIÑAY MARCA"	CONCLUIDO	16.266
467	YE0259	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Popoy	Carpintería Industrial "Inicua"	CONCLUIDO	12.000
468	YE0261	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Colorado	Implementación de Colmenas - San Martín de Agua Rica	CONCLUIDO	5.000
469	YE0262	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Colonia Villazón	Implementación de Apiarios - "DORADO"	CONCLUIDO	4.000
470	YE0263	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Planta Procesadora de Jugos Naturales - "EL PARAISO"	CONCLUIDO	47.000
471	YE0264	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Charcas I	Porcinocultura - "VILLEGAS"	CONCLUIDO	18.773
472	YE0266	Economico	Turismo	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Circuitos Turísticos guiados por Mocetenes	CONCLUIDO	14.382
473	YE0267	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU"	CONCLUIDO	18.264
474	YE0268	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Artesanías - "ARTMOS"	CONCLUIDO	7.122
475	YE0271	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Brecha F - Palos Blancos	Granja de Producción de Huevos - "TORRICO"	CONCLUIDO	14.000
476	YE0273	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Sapecho	Deshidratado Frutas Tropicales	CONCLUIDO	9.000
477	YE0274	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Colonia Tarapacá	Agropecuaria "ICHUTA"	CONCLUIDO	18.772
478	YE0278	Economico	Pecuario	Yungas	Palos Blancos	Concesión Illimani	Mejoramiento del Hato Lechero - "ILLIMANI"	CONCLUIDO	9.000
479	YE0279	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	Brecha C - Palos Blancos	Artesanías Inicua	CONCLUIDO	5.000
480	YE0281	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	San Pedro - Sapecho	Implementación de Apiario - "SAN PEDRO"	CONCLUIDO	5.500

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
481	YE0282	Economico	Apicola	Yungas	Palos Blancos	Mejillones Brecha H - Palos Blancos	Implementación de Colmenas - "LUCANA"	CONCLUIDO	9.496
482	YE0286	Economico	Medio ambiente	Yungas	Palos Blancos	Varias	Parcelas agroforestales en Alto Beni	CONCLUIDO	35.000
483	YE0423	Economico	Agrícola	Yungas	Palos Blancos	Brecha D	Provision de motodeshierbadoras	CONCLUIDO	3.670
484	YE0572	Economico	Transformacion	Yungas	Palos Blancos	La Asunta	Equipamiento y complementación de tres plantas procesadoras de cítricos	CONCLUIDO	40.000
485	YE0603	Economico	Infraestructura vial	Yungas	Palos Blancos	Comunidad Inicua Bajo	Construcción de alcantarillas en los caminos de las comunidades Liquimuni y Bajo Inicua	CONCLUIDO	22.500
486	YR0052	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Tucupi	Construcción 8 aulas UE 13 de mayo	CONCLUIDO	87.503
487	YR0053	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Tucupi	Const. 4 viviendas y amp. centro salud	CONCLUIDO	66.462
488	YR0069	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Area Urbana Popoy	Sede Social Múltiple	CONCLUIDO	57.135
489	YR0070	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Brecha H	Construcción viviendas y bat.baños UE Mejillones	CONCLUIDO	26.542
490	YR0071	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana - urbano	Construcción Casa de Gobierno	CONCLUIDO	34.034
491	YR0072	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana de Mosetenes	Construcción viviendas de maestros	CONCLUIDO	8.467
492	YR0073	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Santa Ana - urbano	Const. baterías de baños - UE Santa Ana	CONCLUIDO	12.532
493	YR0074	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Delicias	Const. aulas, viviendas y bat. baños UE	CONCLUIDO	1.000
494	YR0076	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	San Miguel de Huachi	Complejo Educativo Fase II	CONCLUIDO	152.697
495	YR0079	Comunitario	Salud	Yungas	Palos Blancos	Cocochi	Equipamiento mini hospital	CONCLUIDO	25.400
496	YR0088	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Simay	Mejoramiento Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	52.572
497	YR0089	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Simayuni, Los Andes	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	151.338
498	YR0090	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	V. Concepcion, S. Covendo	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	137.342

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
499	YR0091	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	San Pedro de Cogotay	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	50.203
500	YR0092	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Covendo y alrededores	Sistema de Agua Potable (Megaproyecto)	CONCLUIDO	159.081
501	YR0106	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Bolognia, Belen	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	88.747
502	YR0119	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Varias (6 comunidades)	Megaproyecto Agua Potable - Sapecho	CONCLUIDO	439.915
503	YR0120	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Delicias,J. Bapt	Sistema de Agua Potable	CONCLUIDO	50.225
504	YR0135	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Varias (10 comunidades)	Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua	CONCLUIDO	377.644
505	YR0136	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Palos Blancos	Palos Blancos	Sistema de Agua Potable Hoyada Kollasuyo (17 Colonias)	CONCLUIDO	61.074
506	YR0153	Comunitario	Educación	Yungas	Palos Blancos	Inicua	Construcción 20 viviendas	CONCLUIDO	199.953
507	TC0004	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado de Ivirgarzama	Diseño: Construcción Parque Infantil	CONCLUIDO	282
508	TC0202	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Dotación de mobiliario y equipamiento - Central de Comunidades de Ivirgarzama	CONCLUIDO	4.475
509	TC0203	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirza	Dotación de mobiliario - Central Valle Ivirza	CONCLUIDO	2.486
510	TC0204	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de mobiliario y equipamiento - FSCCT	CONCLUIDO	10.009
511	TC0208	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Refacción y Ampliación Sede Central 1° de Mayo en Valle Tunari	CONCLUIDO	4.500
512	TC0209	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Israel	Dotación de mobiliario escolar para 6 aulas "Unidad Educativa Israel"	CONCLUIDO	3.783
513	TC0217	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Senda 6	Construcción viviendas para maestros Unidad Educativa Hernán Siles de Senda 6	CONCLUIDO	14.000
514	TC0218	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Construcción oficinas y escenario en la Sede de la Central Puerto Villarroel	CONCLUIDO	5.850

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
515	TC0430	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Vía Recuate, Islas - Solteritas, Capernahu, Nueva Capernahu, Santa Isabel, Puerto las Flores, Tres Bocas	Dotación de menaje de cocina y víveres – Comunidades indígenas	CONCLUIDO	12.000
516	TC0431	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Belén, Capinotas, Lagunillas, Pampa Grande, 2 de Agosto A, 1° de Mayo, Ana Rancho, Palmeras, Estibadores, 2° Ana Rancho, Indígenas Yuracaré, Norte Islas	Dotación de víveres – Central Puerto Villarroel	CONCLUIDO	20.000
517	TC0432	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Construcción defensiva para inundaciones y drenaje en el Centro Poblado de Puerto Villarroel	CONCLUIDO	30.000
518	TC0440	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de mobiliario, equipamiento, menaje cocina y capacitación a educadoras	CONCLUIDO	15.900
519	TE0206	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel	Dotación de máquinas industriales de coser y mobiliario- (FSMCT)	CONCLUIDO	10.000
520	TE0213	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Carrasco Tropical	Construcción Empacadora de Banano y Piña en Tamborada A-3 (Tipo B)	CONCLUIDO	7.500
521	TE0214	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Carrasco Tropical	Dotación de máquinas de coser, mobiliario y curso de capacitación - Central de Mujeres Valle Ivirza	CONCLUIDO	2.851
522	TE0215	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Tamborada A-3	Instalación de 700 m de cable vía y una Compuerta "Tamborada A-3"	CONCLUIDO	6.533

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
523	TE0219	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Mariposas	Contrucción Mercado de Frutas en Centro Poblado de Mariposas	CONCLUIDO	14.000
524	TE0224	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Santa Fe	Construcción del Puente sobre el río Chua Mayu (San Isidro) en Santa Fe	CONCLUIDO	18.500
525	TE0226	Economico	Transformacion	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Jugos La Esperanza UNAGRUP II	CONCLUIDO	10.000
526	TE0316	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Nueva Estrella	Actividades Complementarias de Potenciamiento a proyectos Piscícolas	CONCLUIDO	10.000
527	TE0422	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Ivirgarzama	Generación de empleos y venta en la cadena productiva de Palmito UNAGRUP II	CONCLUIDO	50.000
528	TE0434	Economico	Varios	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Capernau,Nueva Capernau,Puerto Las Flores,Santa Isabel,Tres Bocas,Tres Islas,Vía Recuate	Generación de ingresos para familias afectadas por inundaciones y establecimiento de plantaciones forestales y prácticas de agroforesteria	CONCLUIDO	11.000
529	TE0445	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Puerto Villarroel	CONCLUIDO	29.000
530	TE0452	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente 6)	CONCLUIDO	21.000
531	TE0453	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	1° de Mayo	Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano (Puente Argentino)	CONCLUIDO	20.200
532	TR0125	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado Valle Sacta (# 1)	Mobiliario Colegio Juan Pablo II	CONCLUIDO	8.260
533	TR0126	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Senda 5 (# 1)	Mobiliario UE San Francisco de Asis	CONCLUIDO	3.004
534	TR0127	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Calle peatonal	CONCLUIDO	12.500
535	TR0128	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Mercado Municipal	CONCLUIDO	59.240
536	TR0129	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Puerto Villarroel (# 1)	Complejo deportivo recreacional	CONCLUIDO	66.250

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
537	TR0132	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Puerto Villarroel	Poblado de Ivirgarzama (# 1)	Construcción Guardería	CONCLUIDO	49.508
538	TC0006	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	4 de Abril, Monte Rico, San Luis	Provisión Mobiliario Unidades Educativas (3)	CONCLUIDO	4.922
539	TC0007	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Majo Pampa e Ibiruzu Bajo	Construcción Defensivos de Oroyas	CONCLUIDO	12.743
540	TC0205	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Chimore	Dotación de mobiliario y equipamiento - Federación única de Centrales Unidas	CONCLUIDO	10.903
541	TC0415	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Lauca N	Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas	CONCLUIDO	2.940
542	TC0417	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Poblado Shinahota	Mobiliario Escolar, UE G. Busch A	CONCLUIDO	3.290
543	TC0419	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Villa Barrientos	Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre	CONCLUIDO	3.360
544	TE0001A	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	4 de Abril	Refacción Unidad Educativa "4 de Abril"	CONCLUIDO	3.634
545	TE0001B	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Ibuelo	Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo"	CONCLUIDO	7.150
546	TE0001C	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	San Isidro	Refacción Núcleo Educativo "San Isidro"	CONCLUIDO	3.667
547	TE0001D	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Centro Urbano Shinaota	Galpón Metálico Nucleo Educativo "German Bush A"	CONCLUIDO	19.657
548	TE0001E	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Shinaota	Centro Urbano Shinaota	Refacción Galpón Unidad Educativa "German Bush B"	CONCLUIDO	7.227
549	TE0018	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	San Luis	Reposición Terraplén Puente Méndez	CONCLUIDO	4.071
550	TE0317	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Shinaota	2° Valle Hermoso, 3 Valle Hermoso, Bolívar	Apoyo a la cadena productiva de piña	CONCLUIDO	25.000
551	TE0321	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Dorado Chico	Mejoramiento de Camino Dorado Chico - Florida	CONCLUIDO	18.000
552	TE0411	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Arenales	Apoyo a la producción de cultivos anuales (Puente Arenales 11 m)	CONCLUIDO	18.600

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
553	TE0412	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Bolivar	Apoyo a las cadenas productivas de banano, palmito y cítricos (Puente Bolívar 7 m)	CONCLUIDO	9.000
554	TE0413	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Dorado Chico	Apoyo a la cadena productiva de banano (Puente Dorado Chico)	CONCLUIDO	18.500
555	TE0414	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	Villa Victoria	Apoyo a la cadena productiva de piña, banano y palmito (Puente Villa Victoria 8,5 m)	CONCLUIDO	17.500
556	TE0421	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Shinaota	San Francisco, San Isidro, Santa Rosa Ñ, Villa Victoria	Apoyo a la cadena productiva de cítricos (Incremento de ventas y empleos)	CONCLUIDO	12.000
557	TE0444	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Shinaota	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Shinahota	CONCLUIDO	3.000
558	TR0130	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Tropico Cbba	Shinaota	Poblado de Shinaota (# 1)	Diseño final "Terminal de buses" - Shinaota	CONCLUIDO	16.800
559	TR0177	Economico	Infraestructura Productiva	Tropico Cbba	Shinaota	Shinahota	Diseño Carpintería Comunitaria	CONCLUIDO	7.900
560	TC0179	Comunitario	Capacitación comunitaria	Tropico Cbba	Varios TC	Varios TC	Formación de lideres CAF/IDEA	CONCLUIDO	9.928
561	TC0194	Comunitario	Capacitación comunitaria	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Apoyo a pequeñas iniciativas democráticas de la Sociedad Civil	CONCLUIDO	8.000
562	TC0499	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de UNAPAL	CONCLUIDO	80.000
563	TC0500	Comunitario	Salud	Tropico Cbba	Varios TC	Varios	Plan de emergencia - Equipamiento para el control de dengue del Trópico de Cochabamba	CONCLUIDO	13.000
564	TE0150	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Varios TC	Villa Tunari y Shinaota	Construcción de atracaderos para pontones	CONCLUIDO	38.271
565	TE0176	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Varios TC	5 comunidades	Campaña vacunación contra la fiebre aftosa 13vo y 14vo Ciclo	CONCLUIDO	122.000
566	TE0201	Economico	Agrícola	Tropico Cbba	Varios TC	Varios TC	Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Palmito el el Trópico de Cochabamba - Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cbba.	CONCLUIDO	422.651

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
567	TE0439	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	Varios	Cursos de capacitación en costura industrial para las federaciones TC	CONCLUIDO	19.600
568	TE0498	Economico	Capacitacion productiva	Tropico Cbba	Varios TC	TC	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención de brotes de fiebre aftosa en el Trópico de Cochabamba.	CONCLUIDO	75.000
569	YC0008B2	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	Zona tradicional	Implementación de UHF's	CONCLUIDO	78.000
570	YC0019	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Varios YUN	Varias	Evaluación Técnica SAP SERVIR	CONCLUIDO	12.000
571	YC0035	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Financiamiento Puente Mancomunidad Yungas	CONCLUIDO	22.500
572	YC0102	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Protección y conservación de microcuencas FCDI	CONCLUIDO	58.000
573	YC0105	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento CAPYS de sistemas SERVIR	CONCLUIDO	36.492
574	YC0107	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos de Coripata y Arapata	CONCLUIDO	14.000
575	YC0138	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano	EJECUCION	154.833
576	YC0164	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Formación de lideres CAF/IDEA	CONCLUIDO	39.564
577	YC0165	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación funcionarios públicos de los Yungas	CONCLUIDO	27.000
578	YC0167	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de visibilidad	CONCLUIDO	40.000
579	YC0173	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Varios YUN	Varias	Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado	CONCLUIDO	49.983
580	YC0190	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	varias	Apoyo actividades deportivas Yungas	CONCLUIDO	8.000
581	YC0193	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Apoyo a pequeñas Iniciativas Democráticas de la Sociedad Civil en Yungas	CONCLUIDO	9.000
582	YC0200	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Varios YUN	varias	Monitoreo alcantarillado Alto Beni	CONCLUIDO	1.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
583	YC0357	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de visibilidad de las actividades del FCDI y del Programa de Desarrollo Alternativo Integral	CONCLUIDO	50.000
584	YC0496	Comunitario	Salud	Yungas	Varios YUN	Varias	Plan de emergencia / Equipamiento para el control dengue.	CONCLUIDO	17.000
585	YC0501	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y gerencia de funcionarios públicos	CONCLUIDO	15.000
586	YC0504	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el idioma ingles	EJECUCION	10.000
587	YC0580	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema "Medio Ambiente" con enfoque en "Agua"	CONCLUIDO	8.500
588	YC0581	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipamiento con material didáctico y deportivos a unidades educativas de Yungas.	CONCLUIDO	23.500
589	YC0597	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento y equipamiento técnico de la MMYLP	CONCLUIDO	28.500
590	YC0608	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipamiento de bibliotecas de centros de educación técnica y superior.	CONCLUIDO	25.000
591	YC0609	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varias	Parques recreativos para niños en los Yungas	EJECUCION	63.000
592	YC0610	Comunitario	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Campaña de limpieza y concientización en el manejo de residuos sólidos en Yungas	CONCLUIDO	80.000
593	YC0613	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento del VCDI para la generación de propuestas de proyectos de desarrollo integral	CONCLUIDO	25.000
594	YC0622	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Transferencia de capacidades a CCVV	CONCLUIDO	29.500
595	YC0625	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento institucional y equipamiento de los Centros Técnicos Humanísticos Agropecuarios (CETHAs)	CONCLUIDO	58.000
596	YC0655	Comunitario	Varios	Yungas	Varios YUN	Varias	Fondo para la elaboración de diseños de proyectos	CONCLUIDO	50.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
597	YC0656	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Apoyo al campeonato Interjungueño de Fútbol 2010	CONCLUIDO	6.872
598	YC0659	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Fortalecimiento institucional del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral -VCDI	CONCLUIDO	50.400
599	YC0660	Comunitario	Varios	Yungas	Varios YUN	Varios	Diagnostico regional de las nuevas áreas de intervención	CONCLUIDO	33.000
600	YC0663	Comunitario	Educación	Yungas	Varios YUN	Varias	Elaboración de diseños de talleres técnicos para la formación de bachilleres técnico - humanísticos en unidades educativas de los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	27.000
601	YC0665	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Varios YUN	Varios	Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La Paz	EJECUCION	48.000
602	YC0686	Comunitario	Varios	Yungas	Varios YUN	Varios	Acciones de visibilidad y comunicación de las actividades del FCDI	EJECUCION	30.000
603	YC0691	Comunitario	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varios	Sistemas de administración de activos fijos municipales	CONCLUIDO	5.200
604	YC0705	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varios	Puesta en valor y plan de transferencia de activos fijos en custodia del FCDI	EJECUCION	14.000
605	YC0706	Comunitario	Agua potable	Yungas	Varios YUN	Varios	Fondo de diseños de proyectos de agua potable Zona Tradicional	CONCLUIDO	25.000
606	YE0133	Comunitario	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Equipo móvil para emergencias	CONCLUIDO	14.022
607	YE0183	Economico	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Elaboración de 109 planes de negocio en Alto Beni	CONCLUIDO	95.000
608	YE0184	Economico	Capacitación productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes emprendedores	CONCLUIDO	55.700
609	YE0185	Economico	Capacitación productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Intercambio académico Zamorano UAC/CP	CONCLUIDO	55.700
610	YE0195	Economico	Capacitación productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Intercambio de líderes productivos	CONCLUIDO	55.700
611	YE0197	Economico	Pecuario	Yungas	Varios YUN	Varias	Censo Avícola en los Yungas	CONCLUIDO	16.000
612	YE0228	Economico	Turismo	Yungas	Varios YUN	Varias	Senalización caminera/turística de Yungas	EJECUCION	65.300

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
613	YE0517	Economico	Medio ambiente	Yungas	Varios YUN	Varias	Estrategia Forestal para la Zona Tradicional	CONCLUIDO	45.000
614	YE0518	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación: Gestión empresarial con enfoque de genero	CONCLUIDO	12.000
615	YE0574	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Estudios de mercado y capacitación en costos, mercadeo y marketing	CONCLUIDO	20.000
616	YE0576	Economico	Agrícola	Yungas	Varios YUN	Varias	Consolidación de Proveedores en la Cadena de Amaranto Orgánico de Alta Calidad en los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	80.000
617	YE0577	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Capacitación y equipamiento en corte y confección	CONCLUIDO	24.000
618	YE0595	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Jóvenes emprendedores yungueños en la “Semana Mundial del Emprededurismo	CONCLUIDO	16.500
619	YE0596	Economico	Otros	Yungas	Varios YUN	Varias	Modernización de la red meteorológica de los Yungas	CONCLUIDO	70.000
620	YE0612	Economico	Fortalecimiento institucional	Yungas	Varios YUN	Varias	Fortalecimiento de las capacidades de control sanitario de SENASAG – Yungas	CONCLUIDO	20.000
621	YE0636	Economico	Capacitacion productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Curso en gestión microempresarial para el sector de costura	CONCLUIDO	11.500
622	YE0657	Economico	Infraestructura Productiva	Yungas	Varios YUN	Varias	Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz	CONCLUIDO	45.000
623	TC0002	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	21 comunidades	Provisión Mobiliario Unidades Educativas	CONCLUIDO	18.683
624	TC0046	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Uriuta	Diseño: Unidad Educativa Uriuta	CONCLUIDO	303
625	TC0047	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Eterazama	Diseño: Escuela Mixta Eterazama	CONCLUIDO	300
626	TC0187	Comunitario	Fortalecimiento comunitario	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Fortalecimiento al Desarrollo Turístico de Villa Tunari	CONCLUIDO	24.444
627	TC0223	Comunitario	Educación	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa 14 de septiembre	Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón Bolívar	CONCLUIDO	6.400
628	TE0151	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Carretera Cbba - Sta Cruz	Restitución paso vehicular Km. 121	CONCLUIDO	60.447

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
629	TE0291	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Sipe Sipe	Contrucción del Puente Vehicular sobre el rio el Conde Arroyo 2 en 5 Esquinas	CONCLUIDO	17.400
630	TE0322	Economico	Infraestructura vial	Tropico Cbba	Villa Tunari	Santibañez	Mantenimiento del camino 5 Esquinas - Santibañez	CONCLUIDO	11.100
631	TE0435	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Fortalecimiento de la Unidad de Turismo de la Alcaldía de Villa Tunari	CONCLUIDO	2.780
632	TE0436	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Construcción señalización urbana Villa Tunari	CONCLUIDO	3.600
633	TE0438	Economico	Turismo	Tropico Cbba	Villa Tunari	Villa Tunari	Mejoramiento de los atractivos, actividades y servicios turísticos existentes	CONCLUIDO	1.000
634	TE0442	Economico	Pecuario	Tropico Cbba	Villa Tunari	Varias	Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - Villa Tunari	CONCLUIDO	26.000
635	YC0009	Comunitario	Salud	Yungas	Yanacachi	Kollana Uta	Vivienda Centro de Salud Kollana Uta	CONCLUIDO	14.905
636	YC0014	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Varias	Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi	CONCLUIDO	8.835
637	YC0020	Economico	Servicios	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Telecentro para Municipio	CONCLUIDO	98.825
638	YC0025	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Motoncoro	Construcción Aulas Multigrado Motoncoro	CONCLUIDO	7.041
639	YC0026	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Construcción Viviendas p/ Profesores N Escolar	CONCLUIDO	16.960
640	YC0027	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Suiquimilamilani	Construcción de Aulas y Viviendas p/maestro	CONCLUIDO	20.999
641	YC0031	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Mina Chojlla	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	177.167
642	YC0032	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	86.659
643	YC0033	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Sistema de Alcantarillado Sanitario	CONCLUIDO	74.585
644	YC0049	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Iquicolo	Instalación Red Matriz Agua Potable	CONCLUIDO	9.491
645	YC0050	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Chacala	Mejoramiento Sistema Agua Potable	CONCLUIDO	11.031
646	YC0051	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Santa Rosa de Lima	Ampliación Agua Potable	CONCLUIDO	32.130
647	YC0060	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Santa Rosa	Construcción Escuela Multigrado Santa Rosa	CONCLUIDO	18.897

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
648	YC0469	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Félix Ernesto Moscoso - Yanacachi	CONCLUIDO	9.764
649	YC0470	Comunitario	Capacitación comunitaria	Yungas	Yanacachi	La Chojlla	Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E Jorge Zalles- Chojlla	CONCLUIDO	9.764
650	YC0503	Comunitario	Infraestructura comunitaria	Yungas	Yanacachi	Chajro	Diseño Muros Defensivos en el Río Chajro	CONCLUIDO	25.000
651	YC0535	Comunitario	Agua Potable	Yungas	Yanacachi	Comunidad Huayrapata	Refacción Sistema de agua potable Huayrapata	CONCLUIDO	6.800
652	YC0548	Comunitario	Salud	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Equipamiento de mobiliario clínico y equipo básico para el puesto de salud de Chakala	CONCLUIDO	5.000
653	YC0556	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Varios	Equipamiento mobiliario para 6 establecimientos educativos - Yanacachi	CONCLUIDO	6.000
654	YC0646	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Equipamiento de mobiliario para establecimientos educativos en el Municipio de Yanacachi	CONCLUIDO	6.000
655	YC0664E	Comunitario	Saneamiento	Yungas	Yanacachi	Comunidad Puente Villa	Construcción de un baño publico en la comunidad de Puente Villa	CONCLUIDO	27.000
656	YC0680	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico complementario para Unidades Educativas del municipio de Yanacachi	EJECUCION	20.000
657	YC0683	Comunitario	Educación	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Diseño Unidad Educativa Machacamarca	CONCLUIDO	4.500
658	YE0379	Economico	Agrícola	Yungas	Yanacachi	Varias	Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de Flores del Municipio de Yanacachi	CONCLUIDO	145.000
659	YE0380	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Charagua	Granja Avícola "Adrian"	CONCLUIDO	6.600
660	YE0381	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Florida" Plan Negocio	CONCLUIDO	26.121
661	YE0382	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola Daza- Parrilleros	CONCLUIDO	7.950
662	YE0383	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chacala	Granja Avícola "COSTAS"	CONCLUIDO	13.200

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
663	YE0384	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Granja Avícola Daniel	CONCLUIDO	12.900
664	YE0385	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Granja Avícola "Yupanqui" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
665	YE0386	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros Plan Negocio	CONCLUIDO	200
666	YE0387	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Chalco"	CONCLUIDO	14.300
667	YE0388	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Marilena"	CONCLUIDO	14.100
668	YE0389	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Azucena"	CONCLUIDO	3.550
669	YE0390	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Machacamarca	Granja Avícola "ISIDORO"	CONCLUIDO	15.900
670	YE0391	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola Tapia - Parrilleros Plan Negocio	CONCLUIDO	200
671	YE0392	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Ticuniri	Granja Avícola "Poma"	CONCLUIDO	13.300
672	YE0393	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Yanacachi	Granja Avícola "Cirilo" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
673	YE0394	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Pichu	Granja Avícola "Loza" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
674	YE0395	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Avícola "Patty" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
675	YE0396	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chojlla	Granja Avícola "APPP"	CONCLUIDO	17.000
676	YE0397	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Avícola "Ochoa"	CONCLUIDO	13.700
677	YE0398	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Villa Aspiazu	Granja Avícola "Yungas"	CONCLUIDO	6.700
678	YE0399	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Chaco" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
679	YE0400	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Florida	Granja Porcina "Florida"	CONCLUIDO	17.800
680	YE0401	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Aquice" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
681	YE0402	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sacahuaya	Granja Avícola "ROJAS"	CONCLUIDO	12.200
682	YE0403	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chaco	Granja Porcina "Calixto" Plan Negocio	CONCLUIDO	200
683	YE0404	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Avícola "Apaza"	CONCLUIDO	14.800
684	YE0405	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Porcina "Porfiria"	CONCLUIDO	18.000
685	YE0406	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Sirupaya	Granja Porcina "Machaca"	CONCLUIDO	13.200
686	YE0407	Económico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	Chajro	Granja Avícola "Cáceres"	CONCLUIDO	7.000

NUM	CODIGO	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	REGION	MUNICIPIO	COMUNIDAD	PROYECTO	ESTADO VERIFICADO	MONTO TOTAL FCDI en US\$
687	YE0408	Economico	Pecuario	Yungas	Yanacachi	La Chojlla	Granja Porcina "APPLC"	CONCLUIDO	38.800
688	TE0149	Comunitario	Varios	Tropico Cbba	Yapacani	Varias	Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz)	CONCLUIDO	30.000
