

## خطة إدارة الجدول الزمني - نظام ميكنة محكمة

## فهرس المحتويات

- 1 ..... خطة إدارة الجدول الزمني - نظام ميكنة محكمة
- 2 ..... فهرس المحتويات
- 3 ..... خطة إدارة الجدول الزمني - نظام ميكنة محكمة
- 3 ..... المعلومات المطلوبة في هذا القسم تحدد اسم للمشروع ومعلومات وثيقة الصلة بموظفي المشروع
- 4 ..... كافة أنشطة الجدول الزمني في مشروع نظام ميكنة المحاكم
- 4 ..... مرحلة تقييم المحكمة (لكل من الموارد البشرية و التقييم الفني)
- 4 ..... تحسين نظام ادارة القضايا
- 4 ..... اختيار مجموعة عمل في المحكمة
- 4 ..... ادارة ورشة عمل لتخطيط الأستراتيجيات مع مجموعة عمل
- 4 ..... اعادة تقييم المحكمة (البنية الأساسية)
- 4 ..... عمل تدريب على نظام التغييرات و التعديلات
- 4 ..... عمل تدريب على نظام ادارة القضايا
- 4 ..... اعادة هندسة انظمة العمل
- 4 ..... تركيب الكابلات و البنيى الأساسية
- 4 ..... عمل تدريب على اساسيات و مهارات استخدام الحاسوب للقضاة و المديرين
- 4 ..... عمل تدريب على الانظمة المتطورة
- 5 ..... تركيب الاجهزه و برامج الحاسوب في المحكمة
- 5 ..... تركيب نظام ادارة القضايا المعدل
- 5 ..... مراقبة و تقييم نظام العمل و الميكنة الجديد
- 7 ..... ٢. تتابع النشاط  
يتضمن تتابع النشاط تحديد وتوثيق العلاقات المنطقية بين أنشطة الجدول الزمني. ويمكن عمل تتابع منطقي لأنشطة الجدول الزمني باستخدام برامج الحاسوب لإدارة المشروعات أو بواسطة استخدام أساليب تقنية يدوية.
- 7 ..... ٢,١ شبكة الجدول الزمني للمشروع  
رسم شبكة الجدول الزمني للمشروع هي عروض تخطيطية لأنشطة جدول المشروع والعلاقات المنطقية بينهم، ويشار إليها أيضاً بالاعتماديات ويمكن إنتاج رسم شبكة جدول زمني للمشروع يدوياً أو بواسطة استخدام برامج الحاسوب لإدارة المشروعات. ويمكن أن يتضمن رسم شبكة الجدول الزمني للمشروع التفاصيل الكاملة للمشروع، أو وجود أنشطة ملخص أو أكثر

## خطة إدارة الجدول الزمني - نظام ميكنة محكمة

### ١. معلومات عامة

المعلومات المطلوبة في هذا القسم تحدد اسم للمشروع ومعلومات وثيقة الصلة بموظفي المشروع

اسم المشروع : نظام ميكنة محكمة

الهيئة المشرفة: مركز المعلومات القضائي

أعدت بواسطة: \_\_\_\_\_

التاريخ: 17 يونيو 2005

تاريخ التعديل: 17 يونيو 2005

أقرت بواسطة: \_\_\_\_\_

## ٢. قائمة النشاط

قائمة النشاط هي قائمة شاملة تتضمن كافة أنشطة الجدول الزمني التي تم تخطيطها ليتم تنفيذها في المشروع . ولا تتضمن قائمة النشاط أي أنشطة جدول زمني غير المطلوبة كجزء من نطاق المشروع.

كافة أنشطة الجدول الزمني في مشروع نظام ميكنة المحاكم
1. مرحلة تقييم المحكمة (لكل من الموارد البشريه و التقييم الفني)
2. تحسين نظام ادارة القضايا
3. اختيار مجموعة عمل في المحكمة
4. ادارة ورشة عمل لتخطيط الاستراتيجيات مع مجموعة عمل
5. اعادة تقييم المحكمة (البنية الأساسية)
6. عمل تدريب على نظام التغييرات و التعديلات
7. عمل تدريب على نظام ادارة القضايا
8. اعادة هندسة انظمة العمل
9. تركيب الكابلات و البنى الأساسية
10. عمل تدريب على اساسيات و مهارات استخدام الحاسوب للقضاة و المديرين
11. عمل تدريب على الانظمة المتطورة

12. تركيب الاجهزه و برامج الحاسوب فى المحكمة
13. تركيب نظام ادارة القضايا المعدل
14. مراقبة و تقييم نظام العمل و الميكنة الجديد

### ٣. برنامج زمني للأهداف

وهذه البرامج الزمنية تشبه البرامج الزمنية الكاملة، ولكنها تحدد فقط البداية المجدولة أو إتمام تسليمات رئيسية وواجهات خارجية أساسية. ومثال على ذلك هو الجدول الزمني للأهداف التالي

الوضع الحالي	تاريخ الانتهاء الفعلي	تاريخ الانتهاء المتوقع	تاريخ الانتهاء المخطط	أهداف رئيسية
				1. مرحلة تقييم المحكمة (لكل من الموارد البشرية و التقييم الفني)
				2. اختيار مجموعة عمل في المحكمة
				3. ادارة ورشة عمل لتخطيط الاستراتيجيات مع مجموعة عمل
				4. اعادة تقييم المحكمة (البنية الأساسية)
				5. عمل تدريب على نظام التغييرات و التعديلات
				6. عمل تدريب على نظام ادارة القضايا
				7. اعادة هندسة أنظمة العمل
				8. تركيب الكابلات و البنية الأساسية
				9. عمل تدريب على اساسيات و مهارات استخدام الحاسوب للقضاة و المديرين
				10. عمل تدريب على الانظمة المتطورة
				11. تركيب الاجهزه و برامج الحاسوب في المحكمة
				12. تركيب نظام ادارة القضايا المعدل
				13. مراقبة و تقييم نظام العمل و الميكنة الجديد


ملحوظة: الجدول السابق يعتبر مثال توضيحي فقط و ليس الجدول الفعلي الكامل لمشروع ميكنة المحكمة

## ٤. تتابع النشاط


يتضمن تتابع النشاط تحديد وتوثيق العلاقات المنطقية بين أنشطة الجدول الزمني. ويمكن عمل تتابع منطقي لأنشطة الجدول الزمني باستخدام برامج الحاسوب لإدارة المشروعات أو بواسطة استخدام أساليب تقنية يدوية.

## ١.٤ شبكة الجدول الزمني للمشروع

رسوم شبكة الجدول الزمني للمشروع هي عروض تخطيطية لأنشطة جدول المشروع والعلاقات المنطقية بينهم، ويشار إليها أيضاً بالاعتماديات ويمكن إنتاج رسم شبكة جدول زمني للمشروع يدوياً أو بواسطة استخدام برامج الحاسوب لإدارة المشروعات. ويمكن أن يتضمن رسم شبكة الجدول الزمني للمشروع التفاصيل الكاملة للمشروع، أو وجود أنشطة ملخص أو أكثر

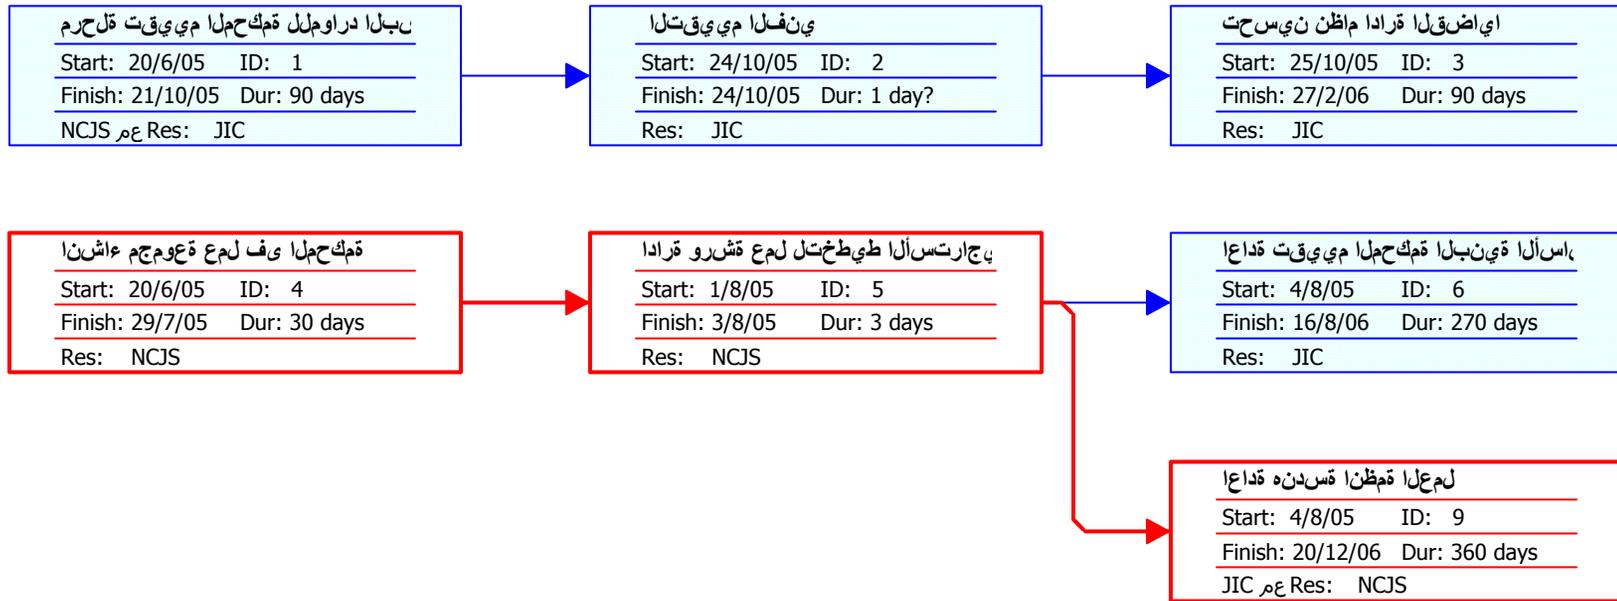

خطة إدارة الجدول الزمني \_ نظام ميكنة محكمة

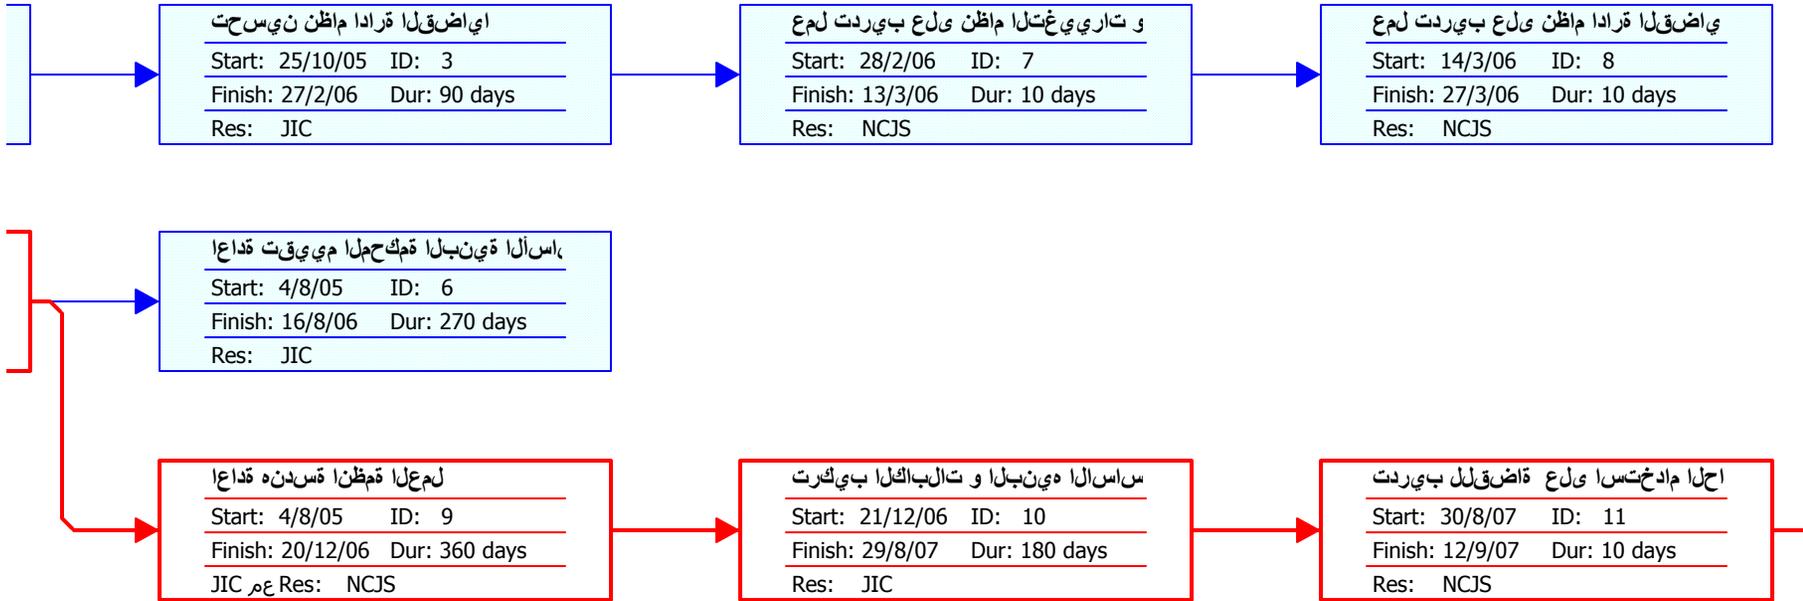


ي

ح

قروطتملا قةمظنالا ىلع بي ردت لمع  
Start: 13/9/07 ID: 12  
Finish: 26/9/07 Dur: 10 days  
Res: JIC

ب بوس احلا جمارب و هزهجالا بي كرت  
Start: 27/9/07 ID: 13  
Finish: 4/6/08 Dur: 180 days  
Res: JIC

لدعمل اياض قلا قرا دا ماظن بي كرت  
Start: 5/6/08 ID: 14  
Finish: 8/10/08 Dur: 90 days  
Res: JIC



## ٥. الجدول الزمني للمشروع

تقديرات المدة الزمنية للنشاط

تقديرات المدة الزمنية للنشاط هي تقييمات كمية لعدد فترات العمل المحتملة التي ستكون مطلوبة لإتمام نشاط جدول

خطة إدارة الجدول الزمني \_ نظام ميكنة محكمة

Microsoft Project - Court Automation.mpp

File Edit View Insert Format Tools Project Collaborate Window Help

Type a question for help

No Group Arial 8 B I U

Tasks Resources Track Report

Fri 29/7/05

Task Name	Work	Duration	Start	Finish	Details	19 Jun '05							
						F	S	S	M	T	W	T	F
1	مرحلة تقييم المحكمة للموارد البشرية JIC مع NCJS	720 hrs	90 days	Mon 20/6/05	Fri 21/10/05	Work				8h	8h	8h	8h
2	التقييم الفني JIC	8 hrs	1 day?	Mon 24/10/05	Mon 24/10/05	Work				8h	8h	8h	8h
3	تحسين نظام ادارة القضايا JIC	720 hrs	90 days	Tue 25/10/05	Mon 27/2/06	Work							
4	انشاء مجموعة صل في المحكمة NCJS	240 hrs	30 days	Mon 20/6/05	Fri 29/7/05	Work				8h	8h	8h	8h
5	ادارة ورشة عمل لتخطيط الأستراتيجيات NCJS	24 hrs	3 days	Mon 1/8/05	Wed 3/8/05	Work				8h	8h	8h	8h
6	اعادة تقييم المحكمة البنية الأساسية JIC	2,160 hrs	270 days	Thu 4/8/05	Wed 16/8/06	Work							
7	عمل تدريب على نظام التنويرات والتدريبات NCJS	80 hrs	10 days	Tue 28/2/06	Mon 13/3/06	Work							
8	عمل تدريب على نظام ادارة القضايا NCJS	80 hrs	10 days	Tue 14/3/06	Mon 27/3/06	Work							
9	اعادة هندسة أنظمة العمل NCJS مع JIC	2,880 hrs	360 days	Thu 4/8/05	Wed 20/12/06	Work							
10	تركيب الكابلات والبنية الأساسية JIC	1,440 hrs	180 days	Thu 21/12/06	Wed 29/8/07	Work							
11	تدريب للقضاة على استخدام الحاسوب NCJS	80 hrs	10 days	Thu 30/8/07	Wed 12/9/07	Work							
12	عمل تدريب على الانظمة المتطورة JIC	80 hrs	10 days	Thu 13/9/07	Wed 26/9/07	Work							
13	تركيب الاجهزة وبرامج الحاسوب في المحكمة JIC	1,440 hrs	180 days	Thu 27/9/07	Wed 4/6/08	Work							
14	تركيب نظام ادارة القضايا المعدل JIC	720 hrs	90 days	Thu 5/6/08	Wed 8/10/08	Work							
15	مراقبة و تقييم نظام العمل و الميكنة الجديد	720 hrs	90 days	Thu 9/10/08	Wed 11/2/09	Work							

Task Usage

Ready

EXT CAPS NUM SCRL OVR

start Project Time man... Court Automatio... ch06-FD3.7\_don... Adobe Reader - [...] Microsoft Project ... EN 7:46 PM

## طلب تغيير

مشروع ميكنة محكمة

تملاً بمعرفة طالب التغيير:

اسم و رمز المشروع
-------------------

رقم الأصدار
-------------

رقم طلب التغيير	قدمت بواسطة	
قدمت بتاريخ	أولوية طلب التغيير	
نوع طلب التغيير	أهمية طلب التغيير	1- حل مشكلة, 2- تحسينات

وصف مختصر:

---

---

---

---

---

وصف تفصيلي:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

مستندات مرجعية:

---

---

---

تمأأ بواسطة فريق عمل المشروع / مدير المشروع

أسرد البرامج المتأثرة بطلب التغيير

وصف التغيير المطلوب

ميعاد التسليم

موافقة العميل
